



LATVIJAS REPUBLIKAS  
FINANŠU MINISTRIJA

Kohēzijas politikas ES fondu 2014-2020  
leviešanas statuss  
**BŪTISKĀKIE RISKI & 2017.GADA  
UZDEVUMI**


17.01.2017. Finanšu ministrija



## Arvien intensīvāks projektu atlašu un ieviešanas posms

Statuss līdz **01.01.2017.**, milj. euro, % no ES fondu finansējuma,  
progress % pret **01.12.2016.**


**Kopā: 4 471,2 (101,2%)**

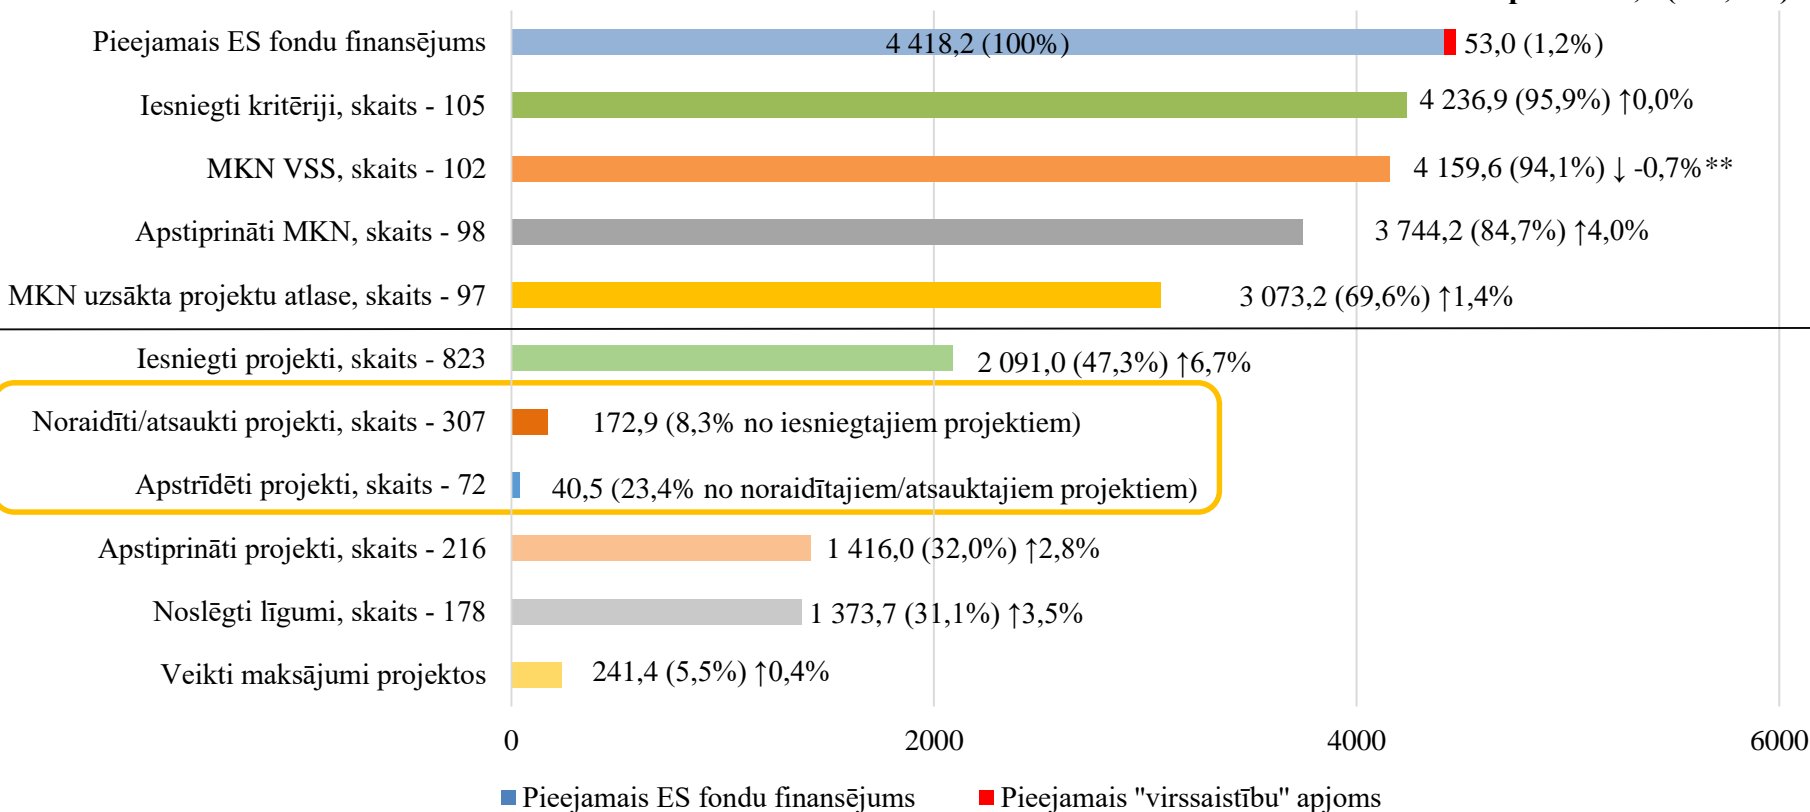

\* \*MKN VSS regress (-0,7%) SAM finanšu izmaiņu dēļ: nav pieņemts lēmums par 4.2.1.2. «Valsts ēku energoefektivitāte» otrās kārtas (27,6 milj.euro.) ieviešanas nosacījumiem un īstenošanas uzsākšanu, 7,8 milj. euro pārdalāmi no 5.3.1. «Ūdensapgāde» uz 5.4.3. «Biotopu aizsardzībai» (paredz DP grozījumi), kā arī izdalīta 8.3.6.1. «Starptautiskie pētījumi» otrā kārtā 3,2 milj.euro.




## Līdz 2016.gada beigām izdevies izpildīt **94%** \*no valdības reālistiskā mērķa 4 mljrd. *euro* investīciju nosacījumu izstrādē

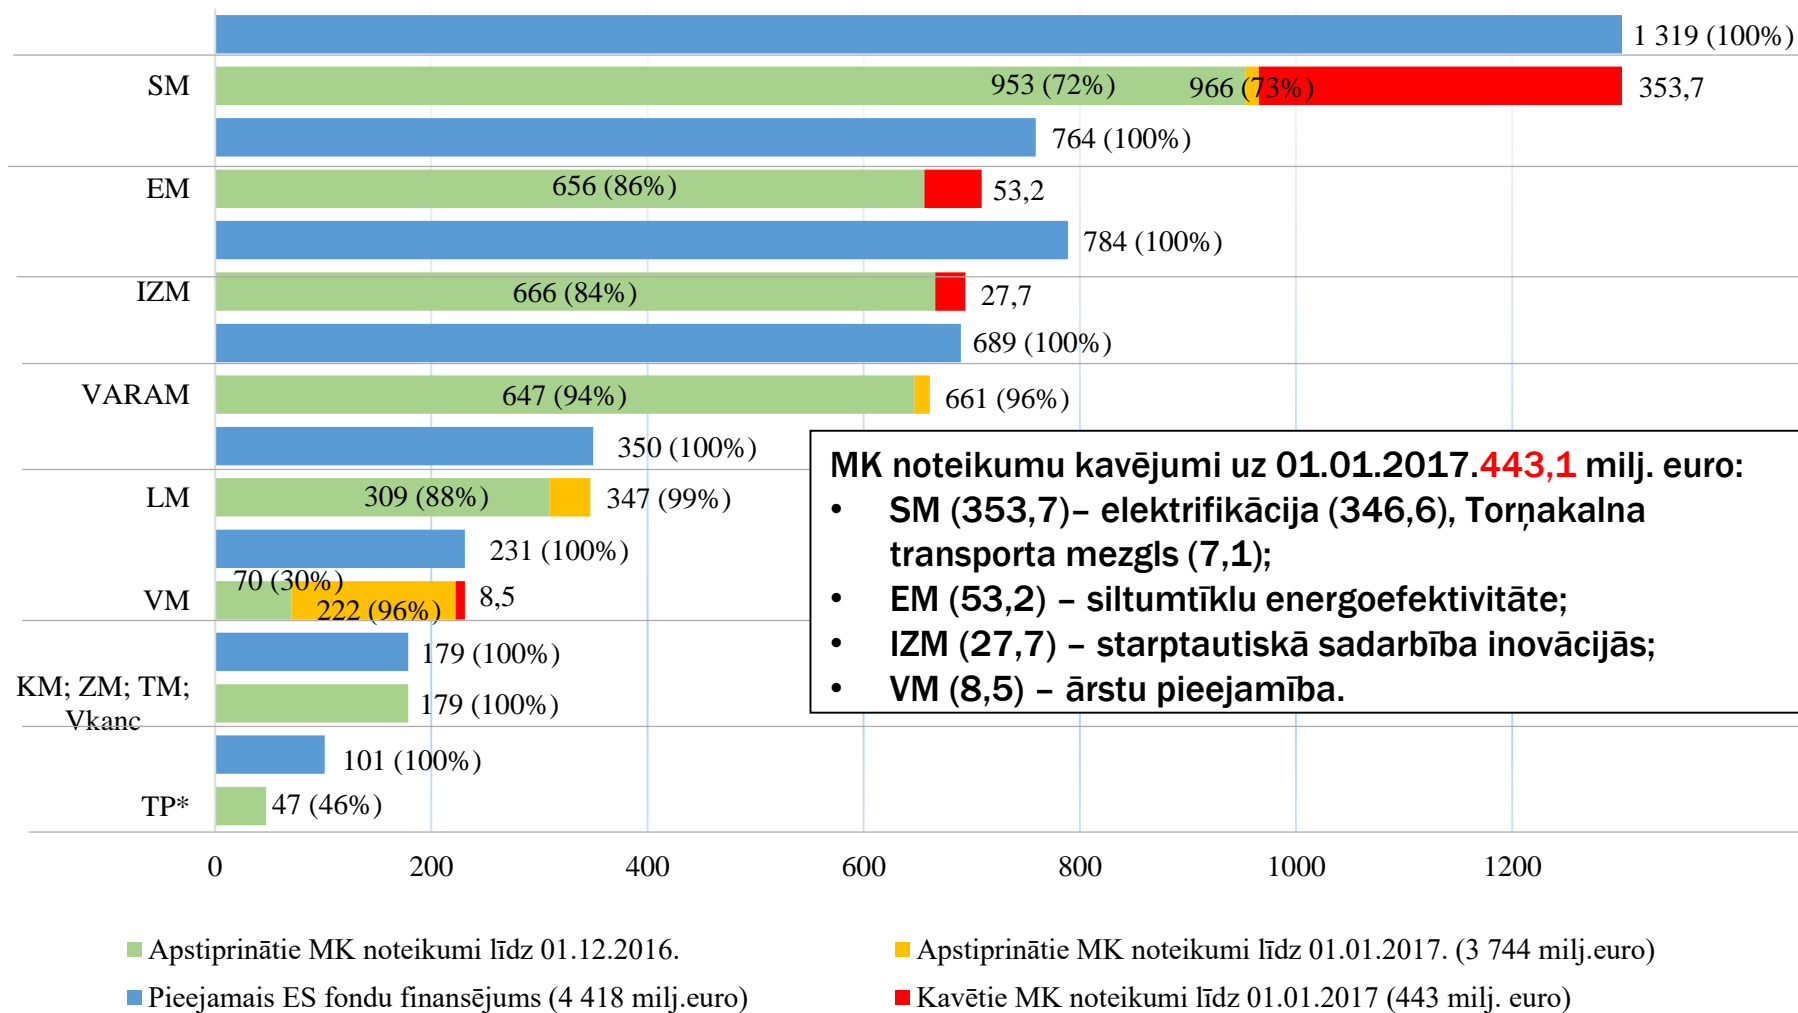



## 2017.gadā jāizlemj par 575 milj euro (89%) no atlikušiem MK noteikumiem, t.sk. 347 milj. euro par elektrifikācijas projektam, milj.euro

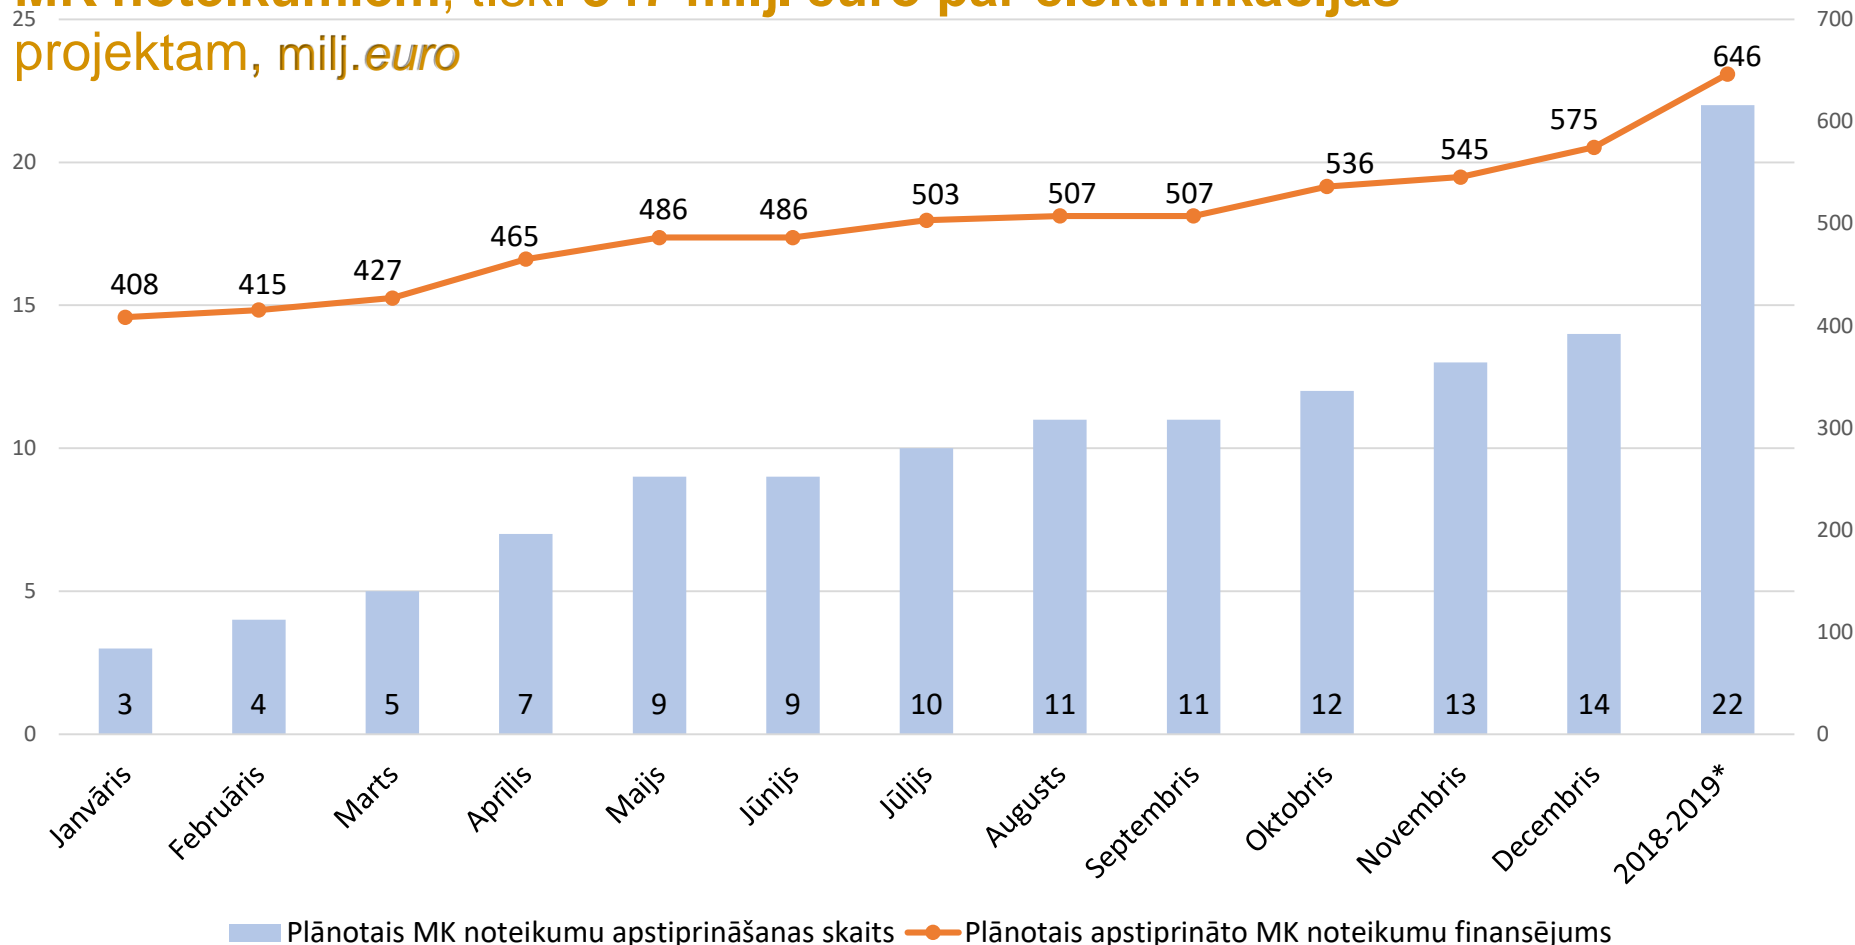

\*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus, kuru īstenošana paredzēta pēc EK izvērtējuma par snieguma rezerves piešķiršanu.



Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# Lai maksimāli «iedzītu» kavējumus investīciju nosacījumu izstrādē, **projektu iesniegumi tiek izvērtēt ātrāk nekā pieļaujams**

**Maksimālais projektu  
izvērtēšanas termiņš, dd**

66

**Vidējais projektu  
izvērtēšanas termiņš  
APIA, dd \***

46

**Vidējais projektu  
izvērtēšanas termiņš  
IPIA, dd**

26

0 10 20 30 40 50 60 70

\* Iznēmot 1.1.1.1. un 3.2.1.1.SAM, kur saskaņoti termiņu  
pagarinājumi (detalizētāk nākošajā slaidā)


Saskaņā ar ES fondu likumā  
noteikto, projektu vērtēšanas  
termiņš ir **trīs mēneši**

Atsevišķos, pamatotos  
gadījumos, SAM MK  
noteikumos vērtēšanas  
termiņu **var noteikt isāku  
vienu līdz diviem mēnešiem**




Centrālā finanšu un  
līgumu aģentūra

# CFLA pieņemto lēmumu par projektu iesniegumu noraidīšanu apstrīdēšana

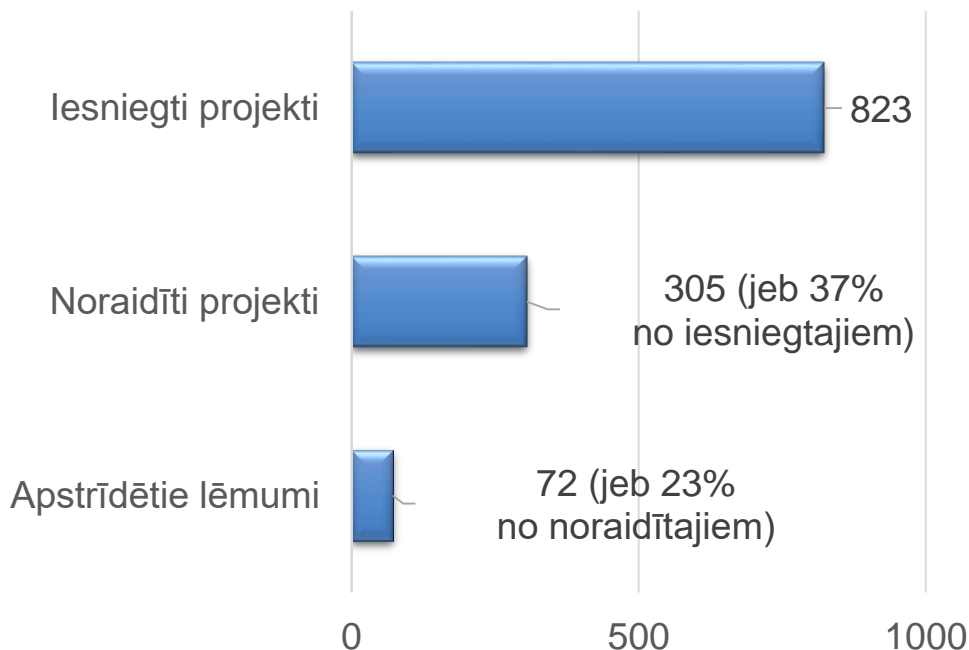

← **76%** no **noraidītajiem** projektiem ir SAM 1.1.1.1. «**Praktiskas ievirzes pētījumi**» ietvaros, kurā bija liels iesniegto projektu skaits (307).  
**Noraidīšanas iemesli** – gan neatbilstība kritērijiem, gan finansējuma nepietiekamība.

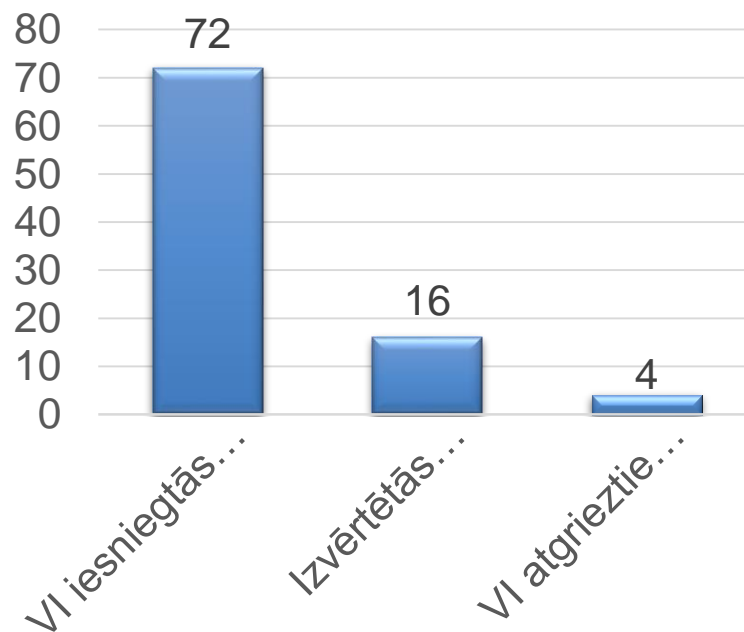

Šobrīd Vadošā iestāde (VI) izvērtē apstrīdētos lēmumus: →


- 3.1.1.5. «Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcija»
- 1.1.1.1. «Praktiskas ievirzes pētījumi»



# 2017.gadā ievērojami jākāpina projektu ieviešanas un maksājumu plūsmas temps! 2 X vairāk maksājumos nekā 2016, % no pieejamā ES fondu finansējuma

2016, % no pieejamā ES fondu finansējuma

Samazināts atlašu apjoms, ņemot vērā atsevišķu IZM SAM MKN pārplānošanu uz gada otru pusi

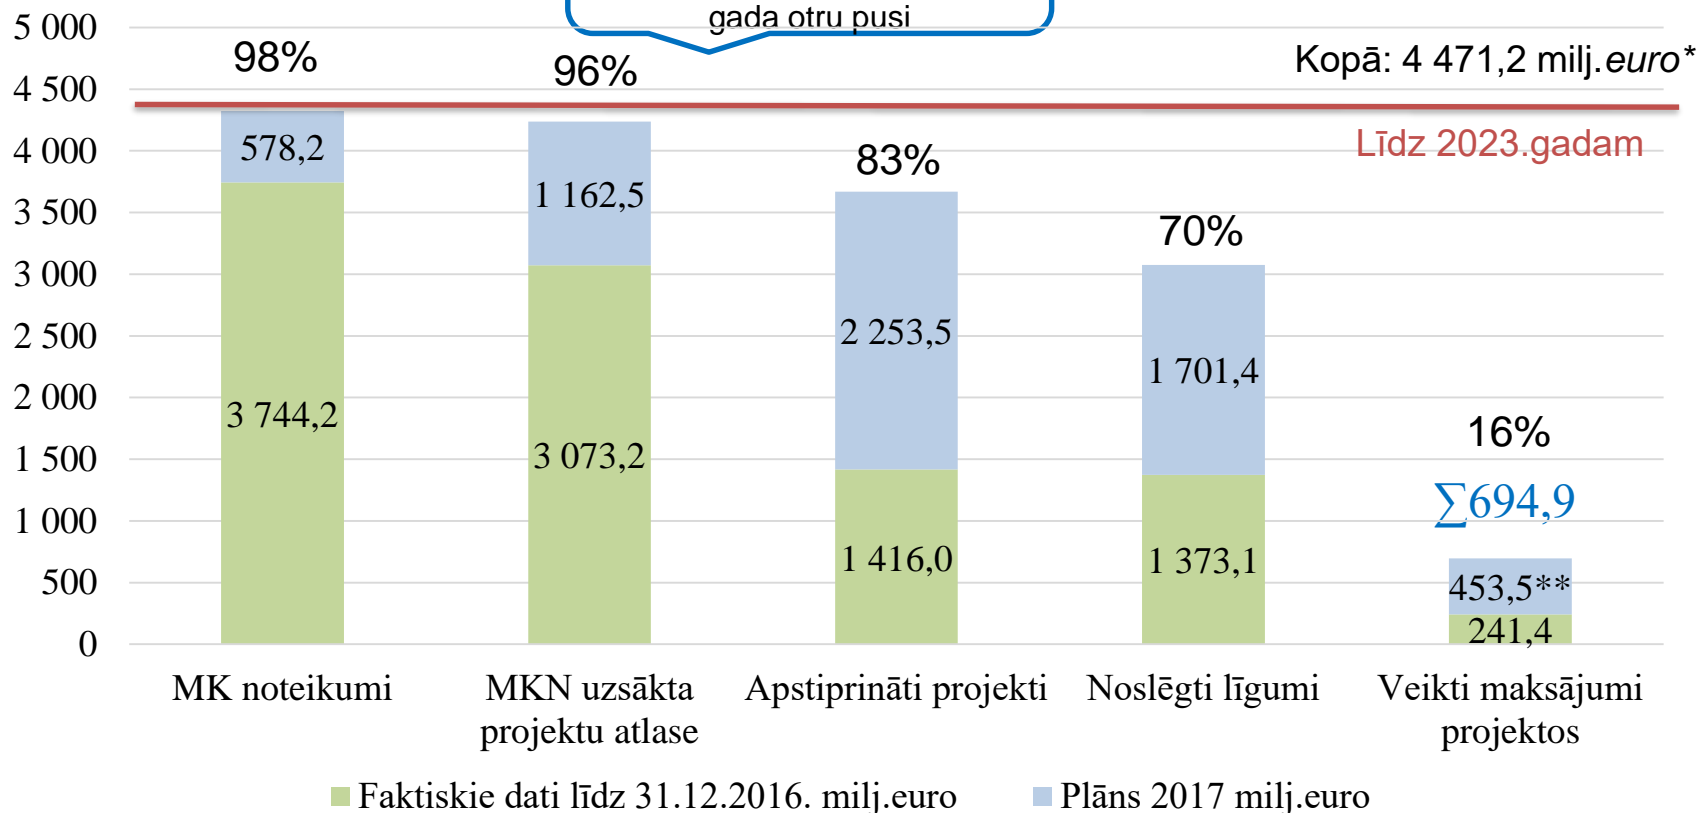


\* Pieejamais ES fondu finansējums: 4,4 mljrd. euro un pieejamais «virssaistību» apjoms: 53 milj. euro.

\*\*Plāni 2017.gadam vēl tiek precizēti, bet kopumā ir tendence samazināties.



## Ikgadējā indikatīvā valsts budžeta prognoze 2018-2021 vistīcamāk būs samazinājums, sabalansējot uz 2021-2024 (tīks precizēta 2017.g. sākumā)

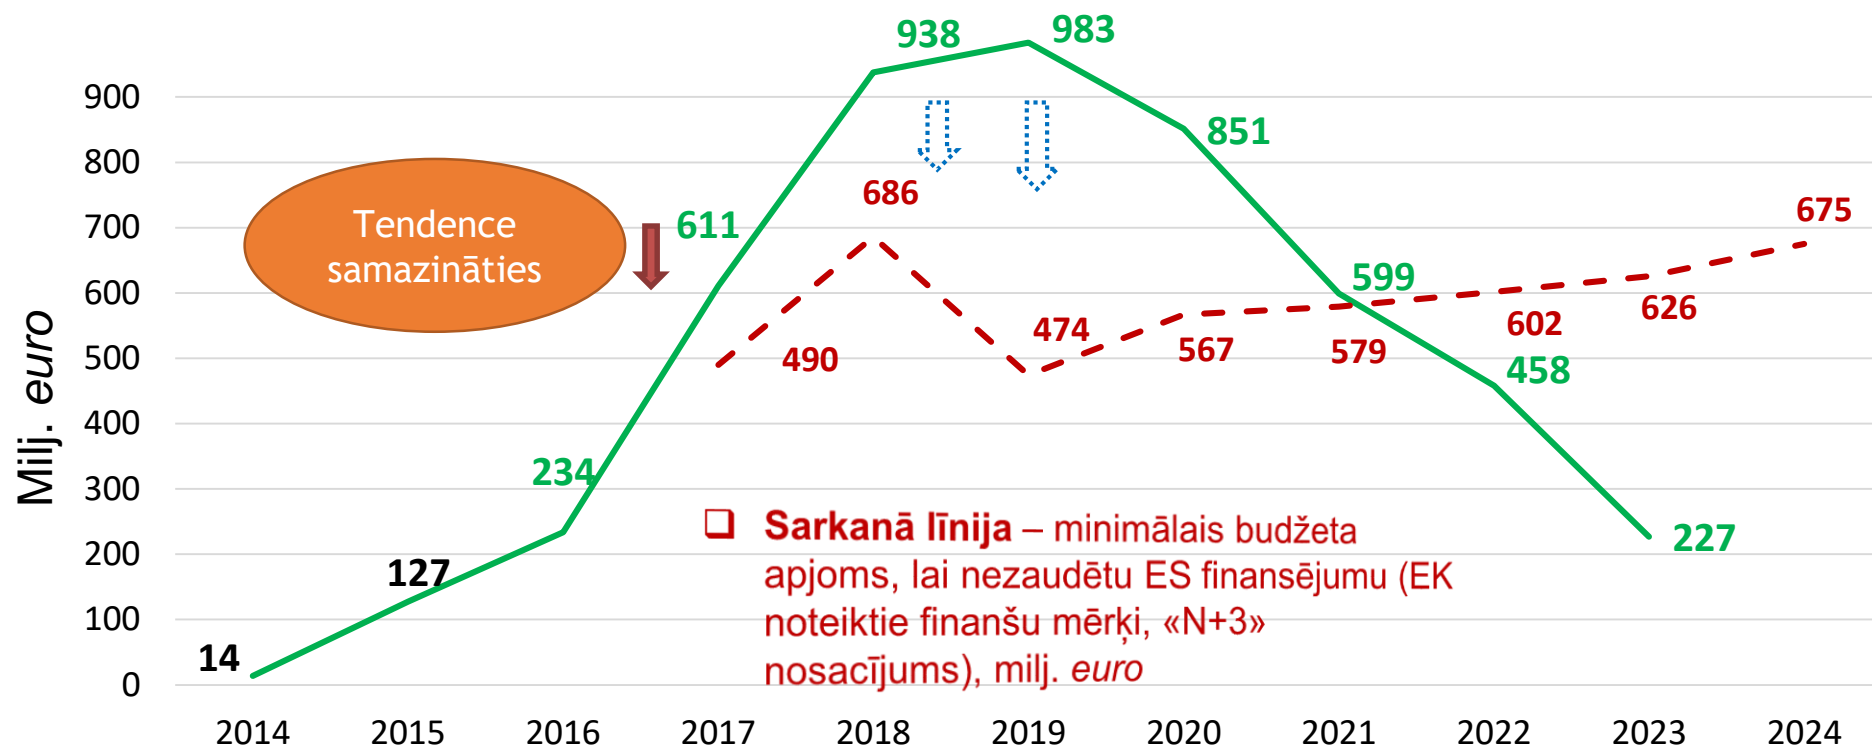

— 30.12.2016. optimistiska budžeta izdevumu prognoze 2014-2020 periodā kumulatīvi (Kopā 5 025 milj. euro)


- - Minimālais nepieciešamais budžeta apjoms N+3 mērķu sasniegšanai kumulatīvi, milj. euro





Kumulatīvā budžeta izdevumu plūsmas projektiem prognoze liecina  
tempu virs minimālā, lai nezaudētu ES finansējumu (N+3 mērķis).

**Riski** - 2017.g. prognozei tendence samazināties – jau indikatīvi 611 milj EUR –  
minimāla rezerve risku gadījumiem

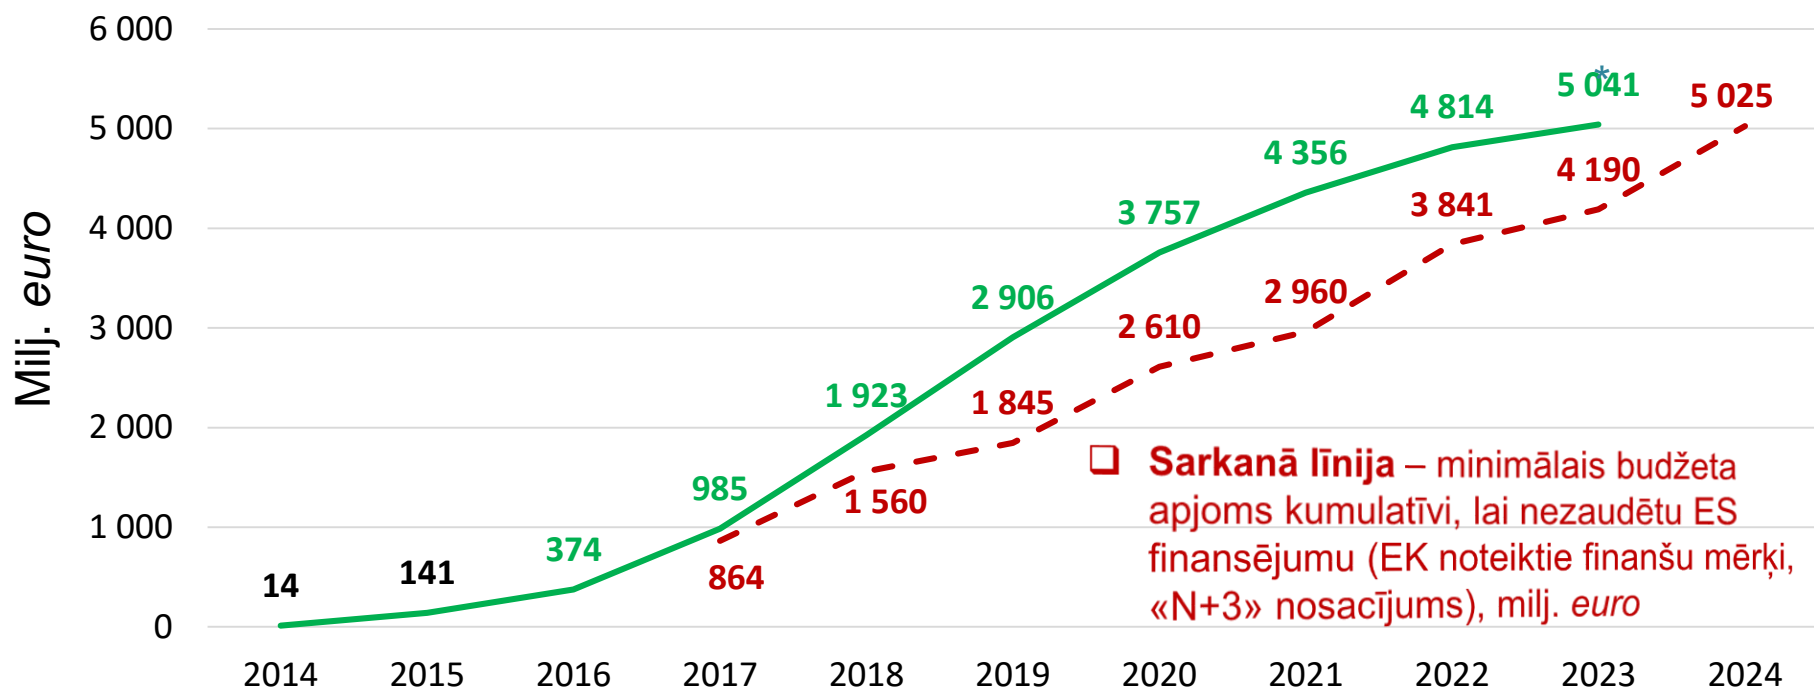


— 30.12.2016. optimistiska budžeta izdevumu prognoze 2014-2020 periodā kumulatīvi (Kopā 5 041 milj. euro)

- - Minimālais nepieciešamais budžeta apjoms N+3 mērķu sasniegšanai kumulatīvi, milj. euro

\* 2016.g. 9.augustā MK lēma papildus piešķirt 16 milj. EUR Stradiņu slimnīcas projektam



**Risks snieguma ietvara 2018.gada mērķu izpildei**  
**Izglītība un Sociālā iekļaušana (8 & 9PV) - 6% rezerves zaudēšana + maksājumu**  
**Latvijai apturēšana (ja EK neapmierina rīcība)**

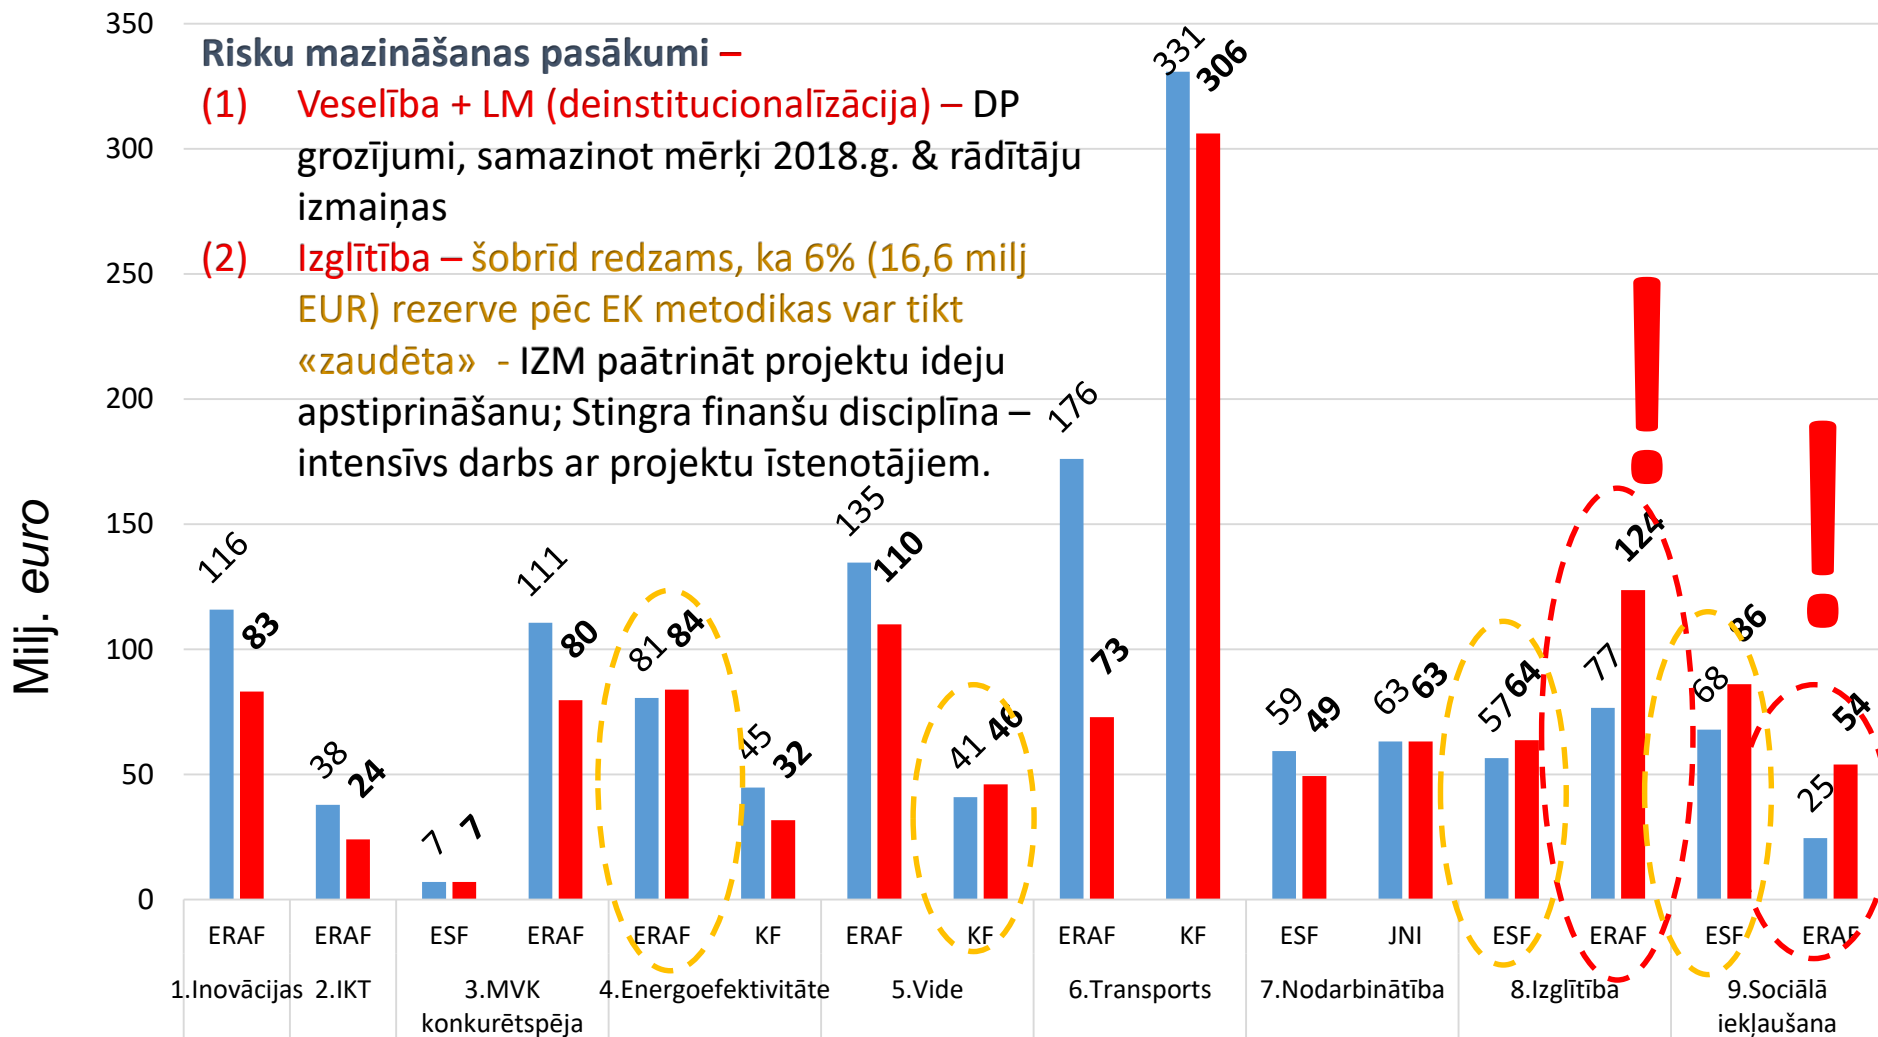



## 2017.gada vieni no nozīmīgākiem uzdevumiem

- **Paātrināt projektu ieviešanu un finanšu plūsmu**, vienlaikus nodrošinot efektīvu risku un drošu finanšu pārvaldību ar fokusu uz investīciju rezultātu sasniegšanu.
- **Līdz ar FM pusgada ziņojumu (2017.gada marts) apstiprināt detalizētu 2017.gada ieviešanas plānu - mēnešu griezumā par MK noteikumiem atlikušajām investīcijām, finanšu un rezultātu mērķiem (specifisko atbalsta mērķu dalījuma un projektu dalījuma ierobežoto atlašu ietvaros).**
- **Lēmumi par plānoto Lielo projektu (Skanstes tramvajs, Elektrifikācija, Stradiņi, Inčukalns) virzību un ieviešanas tempu kāpināšana, īpaša risku pārvaldība.**
- **Specifiskie investīciju jautājumi, kas iekavēti un jāpaātrina procesi, lai uzsākas projekti !**
- **Darbības programmas (DP) grozījumi** - sarunas ar EK, lai panāktu maksimāli labāko risinājumu Latvijas interesēs, t.sk. samazinot 2018.gada snieguma ietvara mērķi sociālās jomas virzienā.
- **2007-2013.gada perioda** nefunkcionālo lielo projektu risku pārvaldība sekmīgai ES finansējumam saglabāšanai – Stradiņu projekts, Krievu sala.



# LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

## Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

[www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv)

[www.fm.gov.lv](http://www.fm.gov.lv)

The screenshot shows the homepage of the website [www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv). The header includes the logos for the National Development Plan 2020 and the European Union, with the text "EIROPAS SAVIENĪBA" and "Eiropas Savienības strukturālo fondu un Kohēzijas fonds". The main navigation bar contains links for "Jaunumi", "Īsteno projektu!", "ES fondi 2014 - 2020", "Iepriekšējie periodi", "Kohēzijas politika", "Materiāli", "Kontakti", and "Citas programmas". The main content area features a large banner with the European Union flag and the text "Est sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!". Below the banner, there are three columns of content: "Jaunumi" (News) with a list of recent events, "Īsteno projektu!" (Implementing projects) with information about project funding, and "Informatīvie pasākumi" (Informational events) with a calendar for May 2016. The calendar shows dates from 1 to 31, with a highlighted date of 10th May. The bottom right corner features a "10 MAI" badge and a list of upcoming events, including a seminar on May 10th.
