



LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU 2014.- 2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS AKTUĀLAIS STATUSS


*Finanšu ministrija
sagatavots 05.06.2018.*



Stabils progress projektu iesniegšanā un uzsākšanā

62% ≡ 2,7 mljrd. euro ≡ projekti īstenošanā


Statuss līdz **01.05.2018.**, milj. euro, % no ES finansējuma, pieaugums % pret **01.04.2018.**

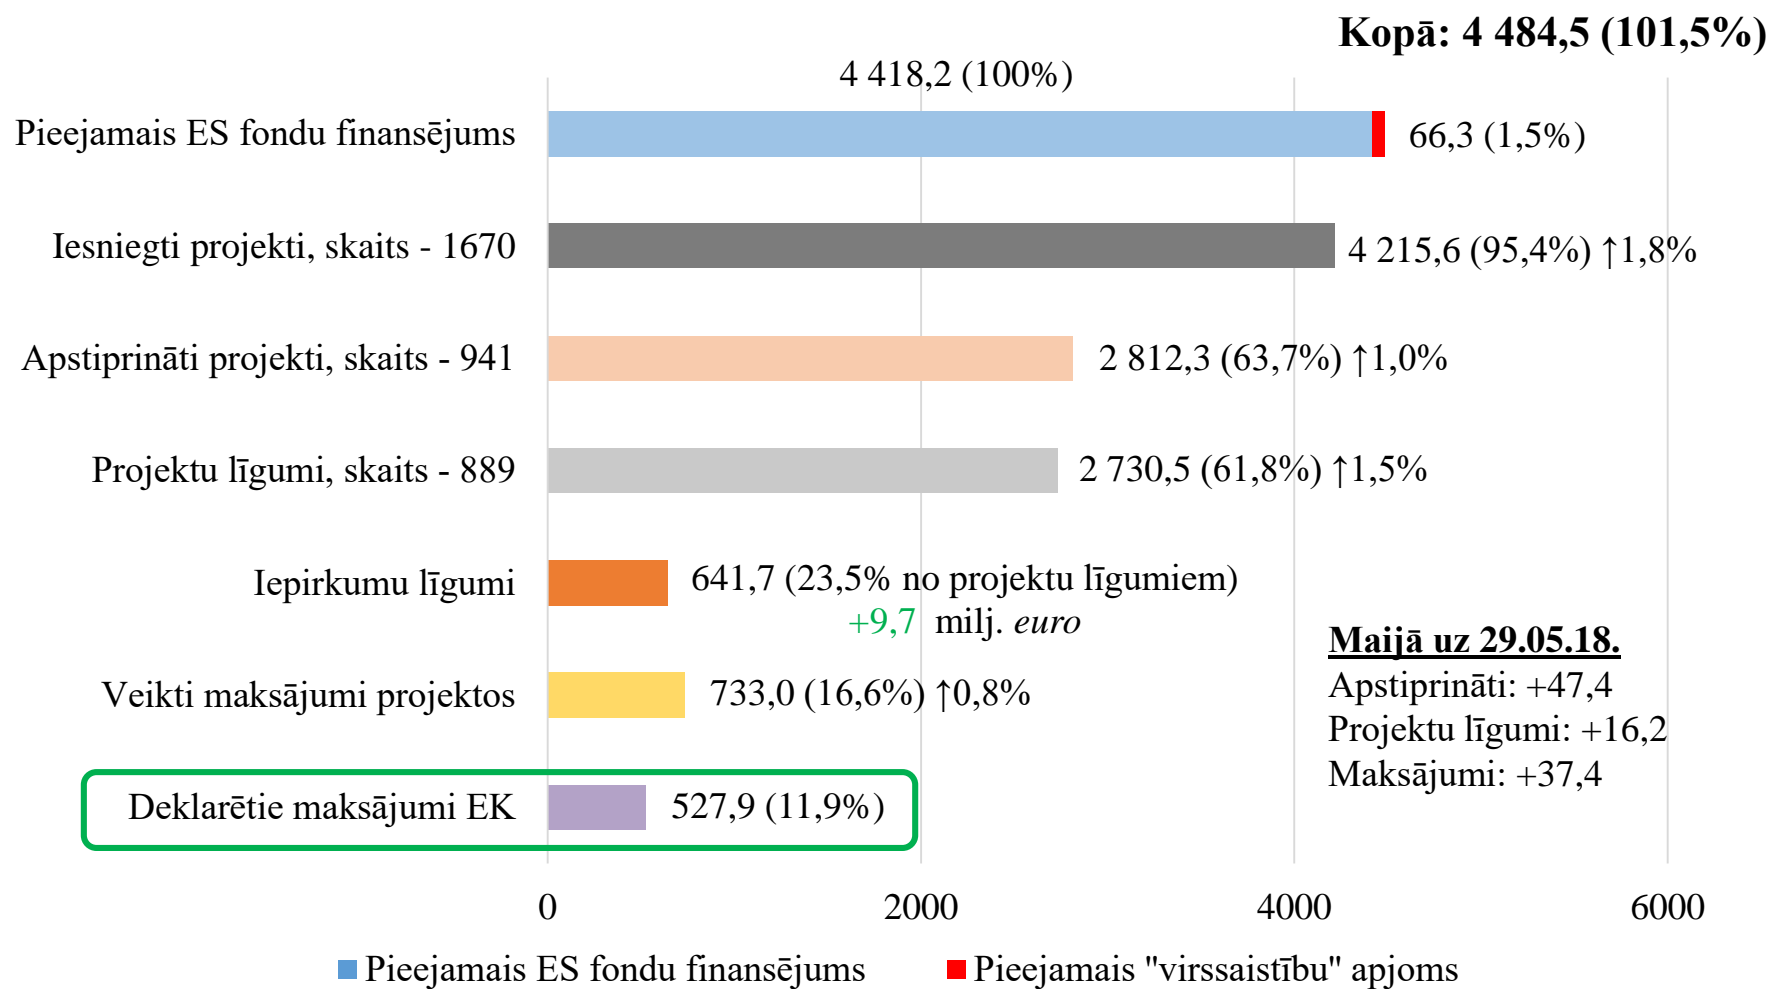



Kavēto projektu iesniegumu apjoms nedaudz samazinās

(dati pret 2018.gada projektu īstenošanu vai noteiktiem termiņiem)

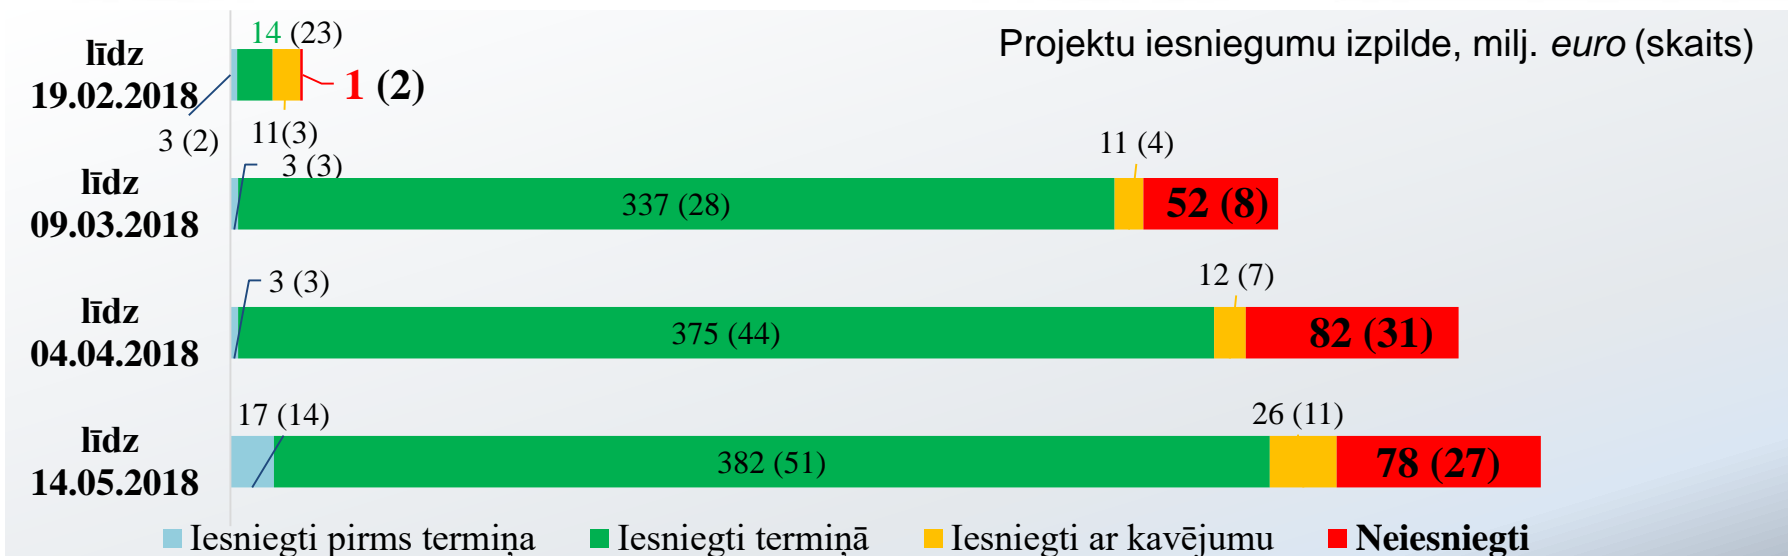



Kavējumi jau pie projektu iesniegšanas – nav iesniegti atbilstoši plānam - pielikumā uzskaitījums:

- (1) **55%** (43 milj. euro) nav iesniegts **Rīgas pilsētas pašvaldības Austrumu maģistrāles** pieslēguma ostai 1.kārtas projekts – *plāno iesniegt 2018.gada maija beigās*;
- (2) **15%** (5 projekti par 10,7 milj. euro) - negatīva tendence **IKT 2.saraksts** (*Valsts zemes dienests, IEM, LM un KM resori*);
- (3) **11%** (13 projekti par 8,4 milj. euro) **valsts ēku** energoefektivitāte (*IZM, VM, Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs*);
- (4) Kavējas **ITI** projekti kopā **12,6** milj. euro (kultūra, izglītība, pašvaldību ēkas);
- (5) **Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai** - atkārtoti izsludinātai atlases 3. kārtai neiesniedz plānotos projektus (3 milj. euro kopā Olaines un Ropažu pašv.) - palielinās atlikums līdz 5,3 milj. euro, VARAM sniegs priekšlikumu rīcībai.



Projektu īstenošanu 2018.gada plānu optimisms - maksājumu pieprasījumu plānu kopējās neizpildes ar katru mēnesi palielinās - aprīli sasniedz **122,2 milj. euro**

Janvārī - **aprīlī** pieaug kumulatīvi **neizpilde > 25%** = 407 projektiem = **129,5 milj. euro** – t.i. , ja būtu spēkā finanšu disciplīnas nosacījumi, tad projektiem tiktu samazināts ES fondu atbalsts par 129,5 milj.euro.

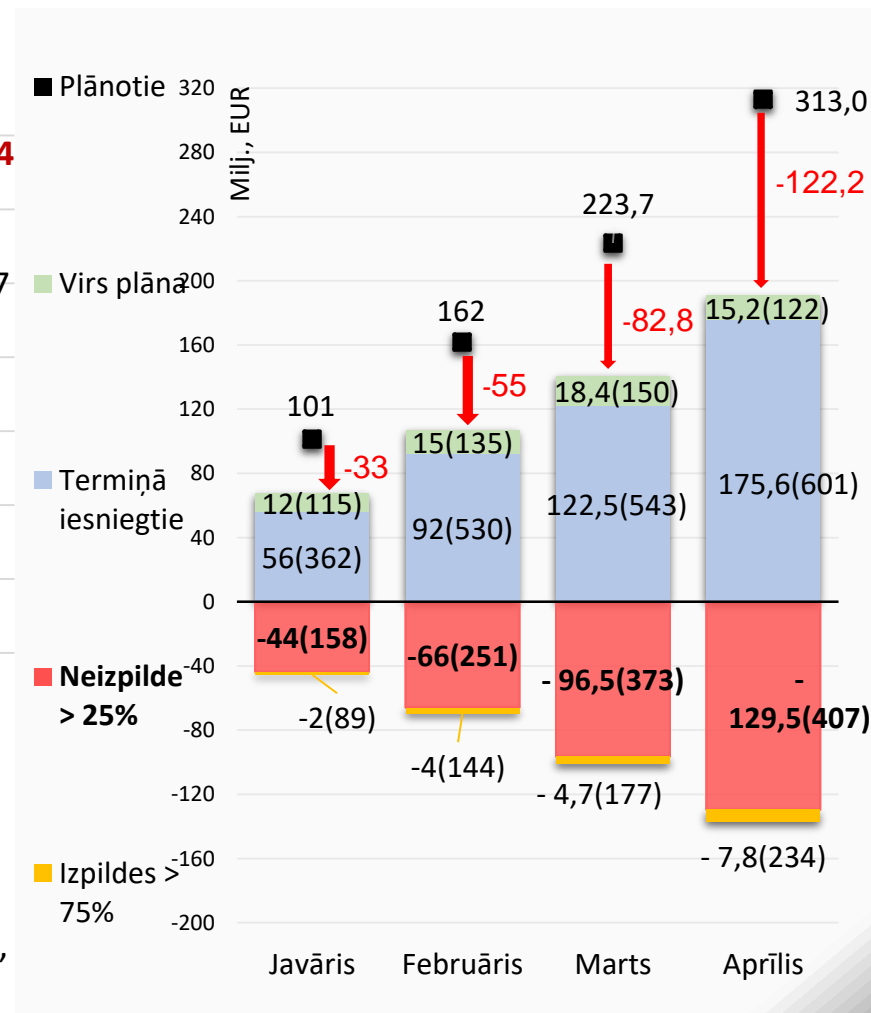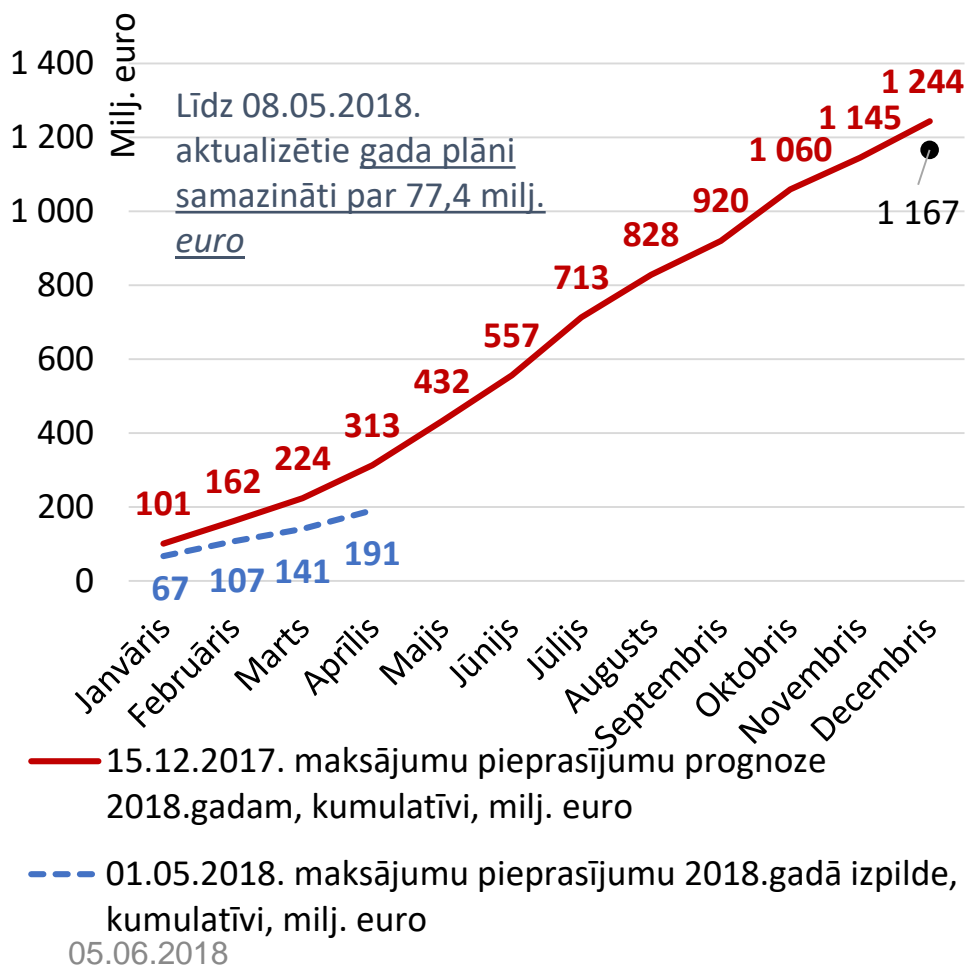



Maksājumu pieprasījumu kavējumi kā indikators norāda uz pieaugošiem riskiem vairākos prioritārajos virzienos, t.sk. snieguma ietvara 2018.g. mērķu nesasniegšanai

	ERAF	KF
5. Vide un teritoriālā attīstība (ERAF -19,7 / KF -10,2)	Degradēto teritoriju atjaunošana - 11,4 milj. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojumā - 3,4 milj.	Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās - 4,5 milj. Ūdenssaimniecība - 5,5 milj. Vides monitorings - 3,9 milj.
6. Transports (KF 26,1 / ERAF -0,5)		Dzelzceļa infrastruktūra - 21,9 milj. Lielo ostu attīstība - 3,5 milj.
1. P&A&I (ERAF -17,6)	Privātā sektora P&A - 8,4 milj.	Zinātnisko institūciju P&I kapacitāte - 7,0 milj.
8. Izglītība (ERAF -13,0/ ESF - 3,3)	Vispārējās izglītības infrastruktūra - 5,5 milj.	Augstskolu un koledžu STEM infrastruktūra - 3,4 milj. Profesionālās izglītības infrastruktūra - 4,1 milj.
3. MVK Konkurētspēja (ERAF -11,6/ ESF - 0,6)	Publiskā infrastruktūra uzņēmējdarbībai - 7,0 milj.	MVK izveide un attīstība - 4,5 milj.
4. Videi draudzīga ekonomika (ERAF -7,8/ KF -3,4)	Pašvaldību ēku energoefektivitāte - 4,5 milj.	Videi draudzīgs sabiedriskais transports - 3,8 milj.



Aktuālie jautājumi

1. Tiek gaidīts EK apstiprinājums par 2018. gada 27. martā EK iesniegto priekšlikumu **darbības programmas grozījumiem Nr.3**, samazinot 2018. gadā sasniedzamos starposma mērķus.

Ja EK akceptēs samazinātos 2018.gada mērķus, ņemot vērā aktuālo statusu un projektu ieviešanas tendences, **riski snieguma rezerves zaudēšanai:**

- **samazinās** sociālās iekļaušanas, t.sk. veselības jomā.
- **saglabājas/palielinās** jomās:
 - a) izglītība - rezerve ERAF 17 milj. *euro* (problēmas iepirkumos, galvenokārt),
 - b) vides aizsardzība - rezerve KF 12 milj. *euro* (kavējas ūdenssaimn. iepirkumi),
 - c) energoefektivitāte (valsts ēkas, daudzdzīvokļu māju siltināšana (DME)) - rezerve ERAF 17 milj. *euro* (izmaksu pieaugums, lēnāks DME progress).

Rīcība – CFLA sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām un projektu īstenotājiem maksimāli vērtē un veicina progresu, kad iespējams.

2. Aktuālākie problēmjautājumi, kuri pašlaik tiek risināti:

- **Valsts ēku energoefektivitāte** – EM jāvirza ar resoriem saskaņoti MK noteikumu grozījumi, kas nerada negatīvu ietekmi uz valdības vispārējo budžetu;
- **IKT 2.saraksts** – VARAM noteiks termiņu 2018.gada 1.decembris projektu aprakstu iesniegšanai;
- **VARAM** ir uzdots iesniegt MK līdz 2018.gada 3.jūlijam priekšlikumus rīcībai **pašvaldību projektos, kas vērsti uz ilgtermiņa aprūpes iestāžu energoefektivitātes atbalstu**. LM jāsniedz nozares politikas veidotāja viedoklis par attiecīgo objektu atbilstību EK definētajam ierobežojumam.



LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

Specifiski

par atlasēm un projektiem:

www.cfla.gov.lv



The screenshot shows the website for the National Development Plan 2020, featuring the Latvian flag and the European Union flag. The main navigation bar includes links for 'Jaunumi', 'Īsteno projektu!', 'ES fondi 2014 - 2020', 'Iepriekšējie periodi', 'Kohēzijas politika', 'Materiāli', 'Kontakti', and 'Citas programmas'. A search bar is located in the top right corner. The main content area is divided into several sections:

- Est sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!**: A message welcoming visitors to the website, providing contact information for the ES Funds website and the Ministry of Finance.
- Jaunumi**: A section for news, with a list of recent updates from May 2016, including seminars and meetings.
- Īsteno projektu!**: A section for project implementation, providing information on the current status of projects and the availability of funding.
- Informative pasākumi**: A calendar for May 2016, highlighting a seminar on the 10th of May.
