


INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU

1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27.§ 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz ikmēneša operatīvo informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā¹. Šajā ziņojumā sniegts aktuālākais **statuss 2017. gada oktobrī**.

2. **Ļoti labs kopējais progress projektu atlasēs un projektu īstenošanas uzsākšanā.** Tas liecina par sagaidāmu intensīvāku finanšu plūsmu un rezultātiem, ieguvumiem jau turpmākos mēnešos un gados. Līdz 2017. gada 1. oktobrim ir **apstiprināti projekti par vairāk kā 2,2 mljrd. euro**, kas ir gandrīz puse no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro (pieaugums 2017. gada septembrī – 2,2 % jeb 96 milj. euro). Papildus apstiprināti projekti par 77,7 milj. euro nepilna mēneša laikā (2017. gada oktobrī). Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnēs².

Grafiks Nr.1 “ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2017. gada 1. oktobrim, milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2017. gada 1. septembrim”

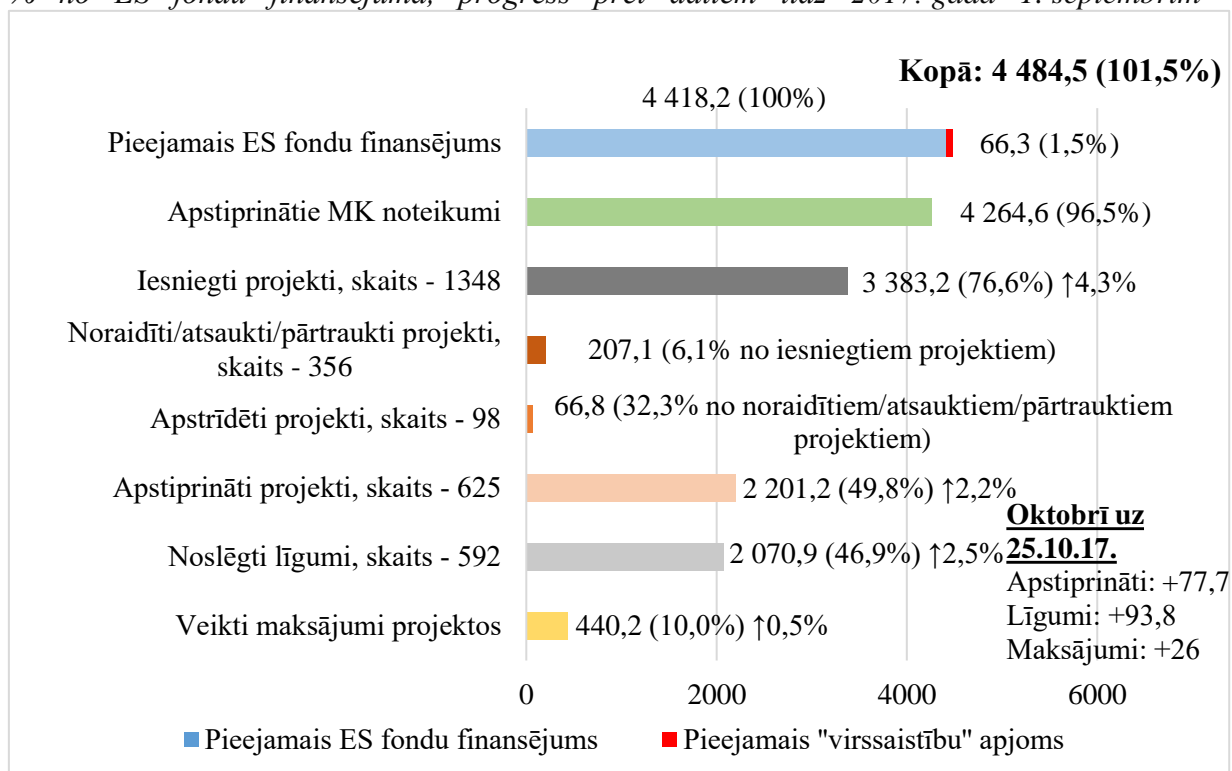


¹ FM uzdots reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Ziņojumā sniegta informācija par datu un informācijas apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju.

² Finanšu rādītāju plāni un to izpilde <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde> un aktuālā CFLA atlasu informācija pieejama: <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase>

3. 2017. gada IV ceturksnī ir atlicis apstiprināt par 147,9 milj. euro ES finansējuma investīciju nosacījumus (MK noteikumi), no kuriem oktobrī kavēti par 104,7 milj. euro. Skatīt zemāk grafikā un ziņojuma 1. pielikumā informāciju par atlikušo MK noteikumu virzības statusu.

Grafiks Nr.2 “2017. - 2019. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns (faktiskie dati līdz 2017. gada 24. oktobrim, milj. euro)”

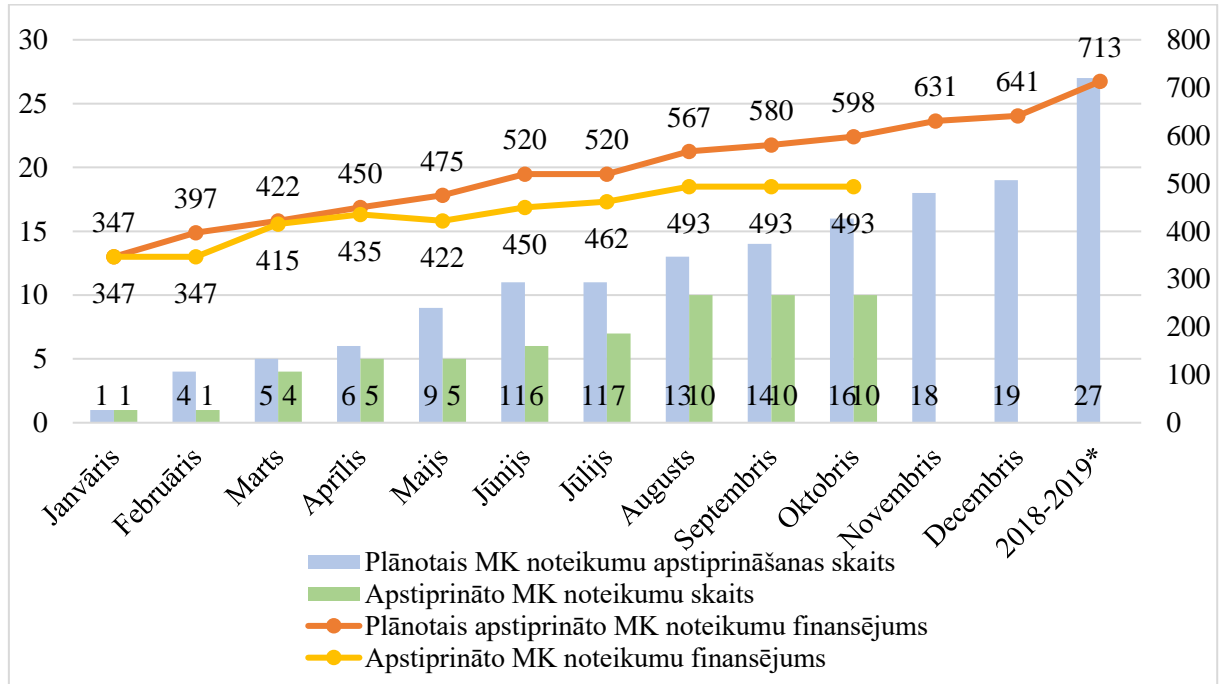

*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus pēc EK izvērtējuma par snieguma rezerves piešķiršanu.

4. Izglītības jomā atlikušo investīciju nosacījumu izstrādē MK noteikumu izstrāde joprojām kavējas 53 % no kopējā kavēto MK noteikumu investīciju apjoma. Papildus iepriekšējā mēnesī ziņotajam Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) nav izstrādājusi investīciju noteikumus investīcijām akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšanai un digitālo, metodisko līdzekļu izstrādei (32,8 milj. euro). Ņemot vērā situāciju, finanšu ministre 2017. gada 23. oktobrī ir informējusi izglītības un zinātnes ministru par kritisko termiņu līdz 2017. gada 31. decembrim, kad atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma Pārejas noteikumu 6. punktā noteiktajam jānodrošina attiecīgo specifisko atbalsta mērķu (turpmāk - SAM) īstenošanas noteikumu izstrāde un to iesniegšana apstiprināšanai MK³. IZM veic pasākumus, lai ar sociāliem un sadarbības partneriem operatīvi vienotos par investīciju nosacījumiem un iepriekš minētā riska iestāšanās netiktu pieļauta.


³ Vadības likuma Pārejas noteikumu 6. punkta nosacījums paredz to, ka jābūt izstrādātiem MK noteikumiem vismaz par daļu no pieejamā SAM finansējuma (piemēram, par pasākumu vai atlases kārtu). Attiecīgi no visa kopējā plānotā 4,4 mljrd. euro ES fondu “portfeļa” risks, ka šis nosacījums var netikt izpildīts ir tikai attiecībā uz šādiem IZM pārziņā esošiem SAM: 8.2.1.SAM “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”; 8.2.2.SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”; 8.2.3.SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”.

5. Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) atbildībā ir kavēti MK noteikumi par energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās (36,1 milj. *euro*). Veselības ministrijas (turpmāk - VM) atbildībā ir kavēti MK noteikumi par veselības aprūpes infrastruktūru 3. kārtai (13,5 milj. *euro*).

Finanšu ieviešanas 2017. gada kopējo plānu izpilde un risku novērtējums

6. Maksājumu temps joprojām atpaliek no gada sākumā plānotā. Līdz 2017. gada 1. septembrim no kopējā plāna 257,5 milj. *euro* ir izpildīti 77,2 % jeb 198,8 milj. *euro*. Divus mēnešus pēc kārtas ikmēneša plāns izpildīts divreiz mazākā apjomā nekā plānots un negatīvās nobīdes pieaug. Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama ziņojuma 2.pielikumā un tīmekļa vietnē⁴.

Grafiks Nr.3 "2014. - 2020. gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpilde 2017. gadā kumulatīvi, milj. *euro*."

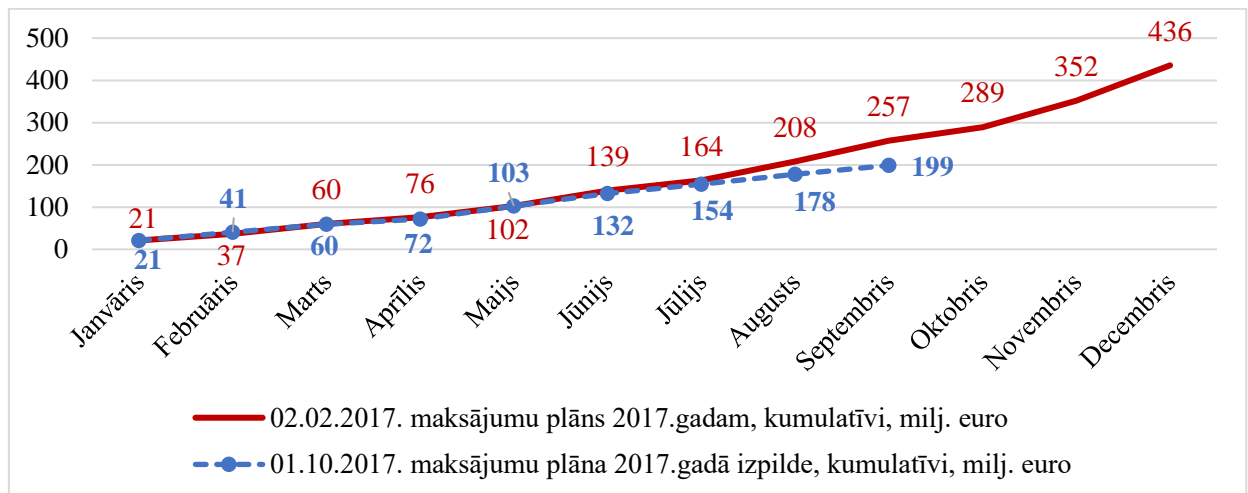

7. Atsevišķos pasākumos (piemēram, lielo pašvaldību energoefektivitātes uzlabošanas un praktiskas ievirzes pētījumu atbalsta mērķos) ieviešana notiek sekmīgāk un tas kompensē daļu no citu jomu vājākas naudas plūsmas. Vienlaikus pirmo reizi gada laikā nevienā no prioritārajiem virzieniem kopā nav pozitīva izpilde pret plānoto maksājumu apjomu. Lielākās negatīvas novirzes maksājumu plānu izpildē šādās prioritātēs: (1) 19,7 milj. *euro* transporta jomā (lielākoties ietaupījumu dēļ reģionālo ceļu rekonstrukcijā (kas pēc būtības pozitīvi, jo rodas iespēja paveikt vairāk, kā arī iepirkumu pārtraukšanas dēļ dzelzceļa modernizācijā); (2) energoefektivitātes jomā (9,5 milj. *euro*), lielākoties daudzdzīvokļu māju siltināšanas pasākumā; (3) 6,7 milj. *euro* vides un pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācijas jomā; (4) 6,4 milj. *euro* nodarbinātības jomā (lielākoties atbalstā jauniešu nodarbinātībai un bezdarbnieku kvalifikācijas

⁴ Kopējais 2017. gada plāns maksājumiem iekļauts FM 2016.gada 2.pusgada ziņojumā par ES fondu ieviešanas progresu (izskatīts 2017. gada 14. marta MK sēdē, protokola Nr.12 43.§, un ikmēneša izpildes statuss pieejams ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>. Papildus skatīt skaidrojumu un rīcību informatīvajos ziņojumos par ES fonda investīciju ieviešanas statusu līdz 2017. gada 31. maijam, 30. jūnijam un 31. augustam. Skatīt ES fondu mājas lapas tīmekļa vietnē sadaļā Materiāli un ziņojumi/Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>


celšanai (atbalsts mērķa grupai tiek sniegts, bet ES fondu maksājumu deklarēšana uz laiku ir apturēta līdz finansējuma saņēmēja kontroļu mehānisma uzlabošanai⁵).

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk - IPIA)⁶ projektu īstenotāju 2017. gada plānu izpildes novērtējums

8. Kopumā IPIA maksājumu pieprasījumu plānu izpildē negatīva tendence saglabājas - plāns nav izpildīts 187 projektos par 72,1 milj. euro, no kuriem 61 projekti jeb 92 % (66,2 milj. euro) ir ar negatīvu novirzi virs 0,2 milj. euro. Konstatējams, ka š.g. septembrī bijusi negatīva ietekme nelabvēlīgo laika apstākļu rezultātā projektiem, kur ir būvniecība. Vienlaikus pozitīvi, ka 168 projektos tika iesniegti maksājumu pieprasījumi par 47,0 milj., euro vairāk nekā bija plānots, no kā lielākai īpatsvars ir pašvaldību projektiem. Tā rezultātā kopējā plāna līdz 2017. gada 1. oktobrim neizpilde ir 25,2 milj. euro. Maksājumu pieprasījumu kumulatīvās izmaiņas skatīt zemāk grafikā. Ziņojuma 2. pielikumā uzskaitīti projekti, kur maksājumu pieprasījumu iesniegšanā ir būtiskākie kavējumi un izmainītie plāni 2017. gadā.

9. Līdz 2017. gada oktobrim projektu īstenotāji Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) ir iesnieguši izmaiņas plānotajos maksājumos, samazinot kopumā gada plānu par 56,5 milj. euro. 2017. gada septembrī lielākās izmaiņas saistītas ar finansējumu saņēmēju maksājumu plānu aktualizāciju pret reāli veiktajiem darbiem un attieksšanās no ieplānotajiem avansiem.

Grafiks Nr.4 “2014. - 2020. gada plānošanas periods: Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro.”

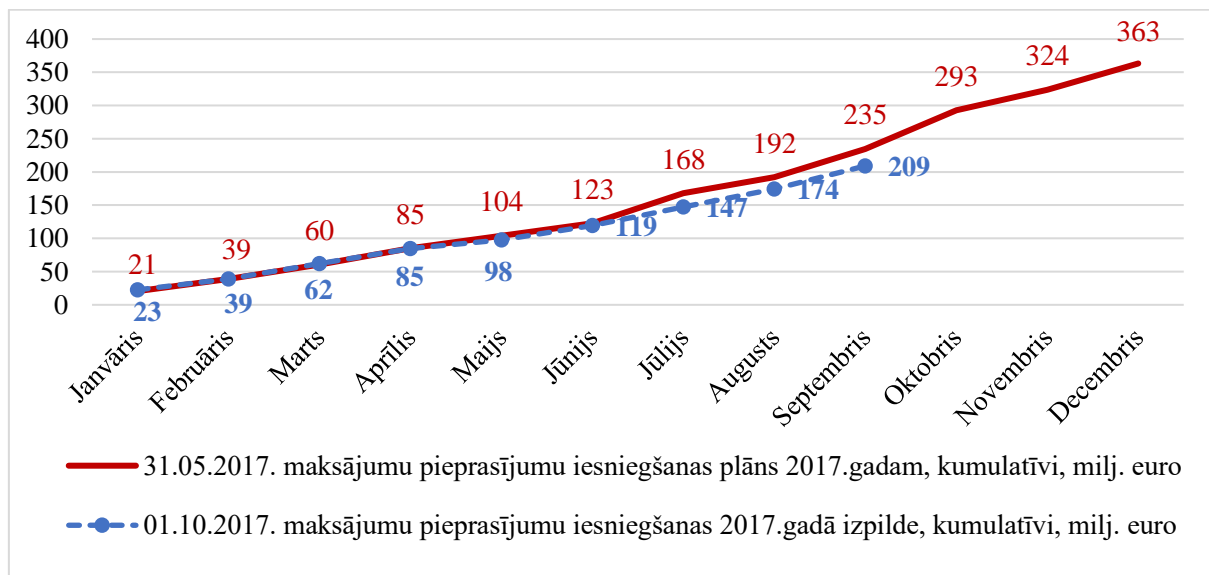

10. Šāda negatīva projektu īstenotāju naudas plūsmas plānu izpildes situācija un tendences pamato nepieciešamību noteikt stingrākus disciplīnas nosacījumus

⁵ MK 2017. gada 12. septembra MK protokolu Nr.45 42 § 8.6.2.apakšpunkta uzdevums LM.


⁶ IPIA noteikti potenciālie projektu īstenotāji un finanšu sadalījums, kas kopā veido indikatīvi 90 % no kopējā ES finansējuma Latvijai (4,4 mljrd. euro). Detalizēta informācija par plānotajiem projektiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē apakšsadaļā “Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlasu projektos”: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>

projektu ieviešanā, lai stimulētu īstenotājus izstrādāt pārdomātākus naudas plūsmas plānus (ievērtējot riskus) un nodrošinātu labāku projektu īstenošanas plānu izpildes kvalitāti. Tādēļ FM virzīs finanšu disciplīnas priekšlikumus apstiprināšanai MK, līdz 2018. gada 1. martam iesniedzot regulāro pusgada ziņojumu un protokollēmuma projektu.

IPIA projektu iesniegumu plānu izpildes statuss 2017. gadā

11. Ziņojuma 3. pielikumā un zemāk grafikā ir informācija par IPIA projektu iesniegumu progresu ar operatīvo informāciju līdz 2017. gada 18. oktobrim. Kopā atbilstoši projektu īstenotāju plānam (lielākā daļa ir pašvaldības) nav iesniegti 79 projekti par 146,2 milj. euro ES fondu finansējuma. Visnozīmīgākā ietekme ir plānotajām investīcijām degradēto teritoriju revitalizācijai, kur, noslēdzoties atlases 2. un 3. kārtai, pašvaldības neiesniedza projektus par 24,1 milj. euro, kā arī vispārējās izglītības infrastruktūras jomas projektu kavējumiem. Negatīvas tendences ir arī pašvaldību ēku energoefektivitātes projektiem, kur iesniegumu termiņi tiek pagarināti vairākkārtīgi, skaidri iezīmējot, ka plānotie darbi tiks veikti tikai 2018. gadā. Tāpat, piemēram, pasākumā “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” neiesniegtajiem projektiem termiņa pagarinājumi ir no sešiem mēnešiem līdz pat vienam gadam (īstenotājs skaidro ar papildu ekspertu atzinumu nepieciešamību).

Grafiks Nr.5 “2014. - 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”

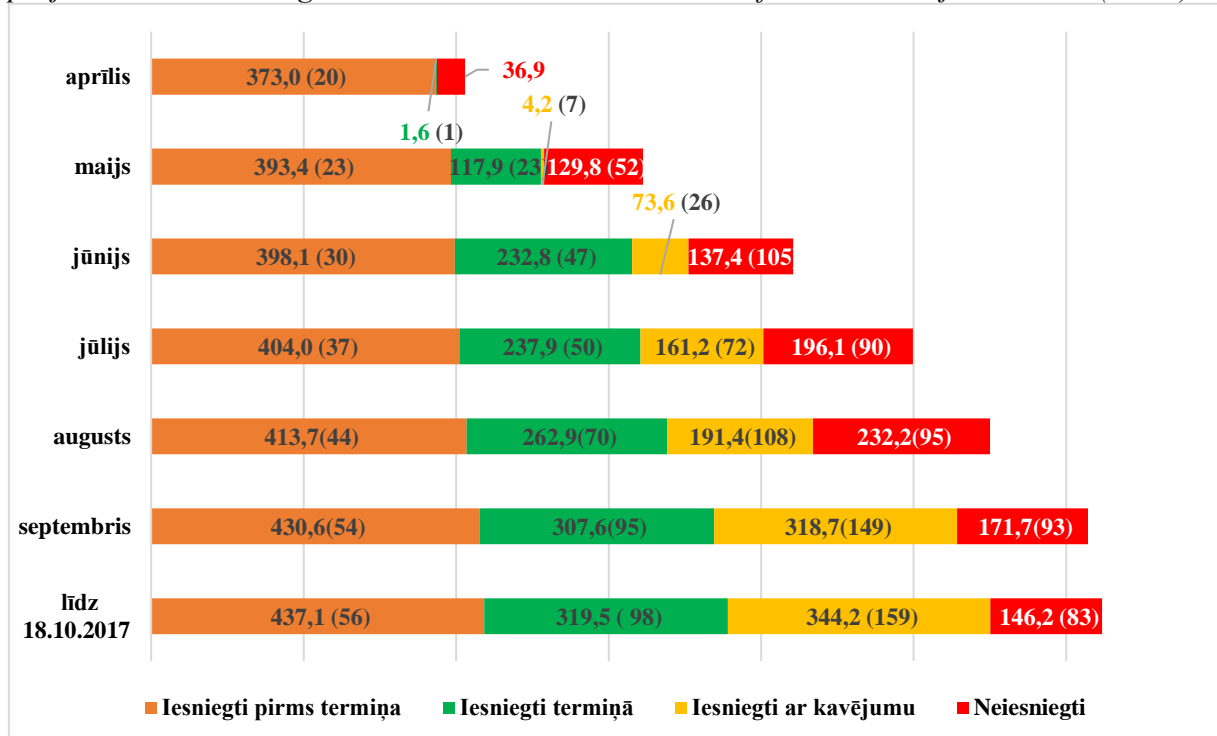

12. Kopumā konstatējams, ka kavētie un neiesniegtie projekti kumulatīvi pieaug straujāk, nekā savlaicīgi iesniegtie. Finansējuma saņēmēji bieži projekta iesniegšanu atliek uz pēdējo brīdi. FM, CFLA un atbildīgās ministrijas dažādos

forumos finansējuma saņēmējiem skaidro, ka, plānojot projektu iesniegšanu, nepieciešams paredzēt pietiekošu projektu vadības kompetenci un kapacitāti, lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu projektu iesniegšanu, īpaši gadījumos, kad tiek gatavoti vai īstenoti vairāki projekti vienlaicīgi. Tāpat īstenotāji tiek aicināti izmantot iespēju no projekta finansējuma attiecināt izmaksas, lai nodrošinātu nepieciešamo projekta vadības un atbalsta kvalitāti, t.sk. nepieciešamības gadījumā piesaistot ekspertus ārpalpojumā.

Citi aktuālie jautājumi

13. Aktuāls ir Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojums (2017)⁷ – IZM ir ieildzis saskaņošanas process (noteiktais termiņš iesniegšanai MK - 2017.gada II ceturksnis⁸). FM ir lūgusi IZM iesniegt precizēto ziņojumu ne vēlāk kā līdz 2017. gada 1. novembrim.

14. 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”⁹ investīciju projektu īstenošanā nav būtiska progresa¹⁰, ņemot vērā nesenu veiktās izmaiņas (uzlabojumus) ieviešanas nosacījumos. EM ir apkopojusi informāciju par plānotajiem projektu iesniegšanas termiņiem un ikgadējām naudas plūsmām. Veicot plānu analīzi, EM virzīs nepieciešamos papildus grozījumus MK noteikumos attiecībā uz abām atlases kārtām. Pozitīvi, ka ir pabeigta investīciju papildinošās saimnieciskās darbības aprēķina metodikas izstrāde, tādējādi izpildot MK uzdoto uzdevumu¹¹.

15. 2007. - 2013. gada plānošanas perioda nepabeigtā lielā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārceļšanai no pilsētas centra” virzība¹² kopumā notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes (turpmāk – RBP) rīcības plānam. RBP uzsākusi darbu pie stividoriem nepieciešamās papildu infrastruktūras izbūves saskaņā ar noslēgto iepirkuma līgumu. Saņemts Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) Konkurētspējas ģenerāldirektorāta lēmums par to, ka nav nepieciešami grozījumi spēkā esošajā valsts atbalsta lēmumā.

16. 2017. gada 12. septembra MK sēdes¹³ protokollēmuma uzdevumu izpildē nav konstatētas problēmas¹⁴.

⁷ Izsludināts VSS 2017. gada 8. jūnijā (VSS-621; 22., 17.§), prezentēts Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes 2017. gada 15. jūnija sēdē.

⁸ MK uzdevums, izskatot IZM ziņojumu “Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma”. Tajā ietvertais analītisko ziņojuma sagatavošanas laika grafiks paredz RIS3 apsekojuma iesniegšanu Latvijas pētniecības un inovāciju stratēģiskajā padomē līdz 2017. gada 1. jūnijam; pārējie progresa ziņojumi iesniedzami 2019., 2021. un 2023. gadā (uz 01.06.) (izskatīts MK 2015. gada 15. septembrī; sēdes protokols Nr. 47 35.§).

⁹ Pirmās kārtas (Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 70 milj. *euro*) un otrās kārtas (ERAF finansējums 27,6 milj. *euro*).

¹⁰ Līdz 2017. gada 11. oktobrim CFLA ir iesniegti 30 projektu iesniegumi (par kopējo ERAF 15 milj. *euro* un iekļauto ēku kopējā platība ir 154 232 m²).

¹¹ MK 2017. gada 12. septembra MK protokolu Nr.45 42 § 8.4.apakšpunkts.

¹² Atbilstoši MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr.12. 43§ noteiktajiem uzdevumiem ES fondu ietvaros.

¹³ Atbilstoši 12.09.2017. MK sēdes protokola Nr.45 42.§

¹⁴ Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti šajā ziņojumā.

17. Sadarbības partneru par ES fondu jautājumiem darba grupas (turpmāk - KDG) 24. oktobra KDG sēdes lēmumu aktualitātes¹⁵:

1) Atbalstīts finanšu disciplīnas priekšlikums - noteikt, ka projektu izdevumu attiecināmības periods (termiņš, līdz kuram veiktos finansējuma saņēmēja atbilstīgos izdevumus līdzfinansē no ES fondu un nacionālo publisko finansējuma) saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu nav pagarināms vairāk nekā par 6 mēnešiem kopumā projekta īstenošanas laikā, vienlaikus saglabājot iespēju projektu pabeigt par finansējuma saņēmēja paša līdzekļiem, nepārsniedzot MK noteikumus par attiecīgā SAM vai pasākuma ieviešanas nosacījumiem noteikto projekta īstenošanas termiņu. CFLA nodrošināt visu finansējuma saņēmēju informēšanu par šo nosacījumu. Noteikt, ka CFLA ir tiesīga piemērot izņēmuma kārtību tikai gadījumā, ja par to ir pieņemts attiecīgs MK lēmums. Paredzēt pārejas periodu šī nosacījuma spēkā stāšanās un FM virzīt detalizēti izstrādātu priekšlikumu iesniegšanai MK līdz 2018. gada 1. martam kopā ar MK ES fondu pusgada ziņojuma un protokollēmuma projektu.

2) Tāpat, vērtējot ES fondu projektu ieviešanas plānu izpildes gaitu līdz 2017. gada beigām, FM uzdots 2018. gada sākumā iesniegt KDG kopsavilkuma informāciju par ES fondu ieviešanas progresu un priekšlikumu KDG lēmumam par papildus finanšu disciplīnas priekšlikuma piemērošanas nepieciešamību, t.i. noteikt pieļaujamo projekta ikgadējā naudas plūsmas plāna (maksājuma pieprasījuma, finansēšanas plāna) izpildes novirzi ne vairāk kā 25 % no gada plāna. Priekšlikums paredz rīcību, konstatējot negatīvas novirzes gadā virs 25 % - tad projektam tiek samazināts ES fonda un nacionālais publiskais līdzfinansējums proporcionāli konstatētai novirzei virs 25 %. CFLA būtu tiesīga piemērot izņēmuma kārtību tikai gadījumā, ja par to ir pieņemts attiecīgs MK lēmums. Ņemot vērā KDG lēmumu, FM virzīs detalizēti izstrādātu priekšlikumu iesniegšanai MK līdz 2018. gada 1. martam kopā ar MK ES fondu pusgada ziņojuma un protokollēmuma projektu.

3) Izskatīti priekšlikumi par DP grozījumiem Nr. 3 un saskaņota turpmākā rīcība, paredzot iespēju iestādēm līdz 2017. gada 10. novembrim iesniegt precizējumus pieteiktajiem grozījumu priekšlikumiem.

4) Attiecībā uz lielo projektu "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija"¹⁶ - tā kā 2017. gada 5. oktobrī saņemts Eiropas Savienības statistikas biroja "Eurostats" atzinums par iespējamo VAS "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitāla palielināšanas ietekmi uz vispārējās valdības budžeta deficītu, SM gatavo informāciju un priekšlikumus turpmākai rīcībai izskatīšanai MK atbilstoši 2017. gada 17. janvāra MK sēdes protokollēmuma Nr.3 39.§ 6. punktam (indikatīvi 2017. gada novembrī pēc izskatīšanas KDG).

¹⁵ Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti šajā ziņojumā.

¹⁶ Atbilstoši MK 2017. gada 17. janvāra sēdes protokola Nr.3 39.§ "Informatīvais ziņojums "Par lielā projekta "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem"" 10. punktā noteiktajam

5) Par EM priekšlikumu pārdalēm no finanšu instrumentiem un papildus atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (turpmāk – MVU) - EK 2017. gada 6. septembrī ir sniegusi viedokli par EM sagatavoto priekšlikumu, ņemot vērā aktualizēto finanšu instrumentu pieejamības tirgus nepilnību novērtējumu. EM atbilstoši pilnveidos un precizēs argumentāciju un virzīs attiecīgu priekšlikumu saskaņošanai ar EK, ES fondu Uzraudzības komitejā (turpmāk – UK) un MK. Aktualizēts tirgus nepilnību izvērtējums finanšu pieejamības jomā tiks izskatīts klātienē UK sēdē 2017. gada 28. novembrī.

6) Atbalstīts Satiksmes ministrijas (turpmāk - SM) priekšlikums atļaut izmantot publiskā finansējuma snieguma rezervi 15 899 728 *euro* 6.1.5.SAM “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” ietvaros un 16 897 660 *euro* 6.3.1.SAM “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” ietvaros pirms EK lēmuma par snieguma ietvara mērķu izpildi. SM sagatavos un iesniegs MK grozījumus attiecīgajos MK noteikumos par SAM ieviešanu. Tāpat atbalstīts princips, ka 6.1.1.SAM (ostas) snieguma ietvara mērķu izpildes statuss uz 2018. gada 30. jūniju tiks ņemts par pamatu vērtējumam par iespējamību ātrāk (pirms EK lēmuma) piešķirt snieguma rezervi. SM veikt analīzi, individuālo mērķu izpildi vērtējot atbilstoši SAM projektu iesniegumu atlases nolikumā norādītajām sasniedzamajām finanšu rādītāja vērtībām katram finansējuma saņēmējam/projektam. SM argumentētu priekšlikumu MK lēmumam iesniegs FM iekļaušanai ES fondu pusgada ziņojuma un protokollēmuma projektā (iesniedzams MK līdz 2018. gada 1. septembrim).

7) Atbalstīts VM priekšlikums atļaut izmantot publiskā finansējuma snieguma rezervi 10 267 709 *euro* apmērā pirms EK lēmuma par snieguma ietvara mērķu izpildi ar nosacījumu par slimnīcu apvienošanās principu VM definēto sadarbības tīklu ietvaros.

8) Aktuāls jautājums par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākuma ieviešanas progresa analīzes rezultātiem – līdz šim vājš sniegums, tādēļ turpmākie lēmumi tiks pieņemti, analizējot daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākuma ieviešanas progresu, plānu izpildes disciplīnu un tendences līdz 2018. gada 30. jūnijam – paredzēts EM iesniegt FM daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākuma ieviešanas analīzi un prognozes, kā arī priekšlikumu finansējuma pārdalei ieviešanas plānu neizpildes gadījumā iekļaušanai MK pusgada ziņojumā, kas iesniedzams MK līdz 2018. gada 1. septembrim.

9) Konceptuāli atbalstīts EM priekšlikums pārdalīt Kohēzijas fonda finansējumu indikatīvi 7,5 milj. *euro* no SAM 4.1.1.¹⁷ (Apstrādes rūpniecības uzņēmumu energoefektivitāte) uz SAM 4.3.1.¹⁸ (Centralizētās siltumapgādes energoefektivitāte), lai finansētu pozitīvi novērtētos pirmās atlases kārtas

¹⁷ 4.1.1. SAM “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē”

¹⁸ 4.3.1. “SAM Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”

projektus, kas nevar tikt apstiprināti nepietiekoša finansējuma dēļ. EM uzdots informatīvajā ziņojumā, kas līdz 2017. gada 1. novembrim iesniedzams MK¹⁹, iekļaut argumentētu priekšlikumu un plānoto rīcību (galvenie uzdevumi un termiņi).

10) Tāpat izskatīti arī vairāki ministriju ziņojumi par progresu un priekšlikumiem rīcībai (t.sk. par deinstitucionalizācijas²⁰ (DI), IKT pasākuma²¹, reģionālo biznesa inkubatoru atbalsta²², darba vidē balstītu mācību vai mācību praksē uzņēmumā projekta²³). Ministrijām uzdots iekļaut informāciju savos ziņojumos, kas MK jāiesniedz līdz 2017. gada 1. novembrim²⁴.

Turpmākā prioritārā rīcība:

Neatļaidīgs fokuss FM, CFLA, atbildīgajām iestādēm un projektu īstenotājiem ir uz projektu ieviešanas veicināšanu, tajā skaitā ikmēneša plānu izpildes disciplīnas stiprināšanu, operatīvi rodot iespēju risināt konstatētos nozīmīgākos projektu līmeņa riskus.

2017. gada pēdējā ceturksnī intensīvs darbs pie 2018. gada investīciju plānu un prognožu izstrādes.

Gatavošanās 2017. gada 28. novembra ES fondu Uzraudzības komitejas sēdei un 29.-30. novembra tikšanās ar EK par stratēģiskiem ES fondu jautājumiem²⁵.

Ikmēneša ziņojumos FM turpinās informēt valdību ne tikai par ieviešanas progresu, bet arī par nepieciešamo iesaisti ātrākai lēmumu pieņemšanai, kā arī par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.

Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Zālīte-Supe 67083808

Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv

¹⁹ Atbilstoši 12.09.2017. MK sēdes protokola Nr.45 42.§ 8.11.p.

²⁰ 9.2.2.1.pasākums “Deinstitucionalizācija” (ESF 40,1 milj euro) un 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (ERAF 37,8 milj euro).

²¹ 2.2.1.1.pasākums “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība”.

²² 3.1.1.6. pasākums “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” (ERAF 26,2 milj. euro)

²³ SAM 8.5.1. “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē uzņēmumā” (ESF 18,6 milj euro) ietvaros LDDK projekts par. 17,5 milj. euro ESF (darba vidē balstītu mācību projekts)

²⁴ Atbilstoši 12.09.2017. MK sēdes protokola Nr.45 42.§ 8.11.p., ziņojumos iekļaujot situācijas novērtējumu par ES fondu investīciju ieviešanas negatīvām novirzēm un priekšlikumus finansējuma pārdalēm vai citu rīcību, tai skaitā attiecībā uz individuālu projektu, ja nepieciešams, lai novērstu riskus DP noteikto mērķu izpildē.

²⁵ Iespēja iepazīties ar darba kārtību un materiāliem, kas tiek papildināti noteiktos termiņos:

<http://www.esfondi.lv/uzraudzibas-komiteja-1>
