

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU

1. Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27.§ 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sniedz ikmēneša operatīvo informāciju par aktualitātēm ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā¹. Šajā ziņojumā sniegts aktuālākais **statuss 2017. gada novembrī**.

2. Intensīvu projektu atlasu rezultātā ik mēnesi **pieaug jaunu uzsākto investīciju projektu skaits ievērojamā finanšu apjomā**. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, vislielāko progresu dinamiku uzrāda projekti pētniecībā, tehnoloģiju attīstībā, inovācijās un vides aizsardzībā. Līdz 2017. gada 27. novembrim **projektu līgumi ir par ES atbalsta investīcijām vairāk kā 2,3 mljrd. euro**, kas ir vairāk kā puse no kopējās ES fondu “aploksnes” 4,4 mljrd. euro. Pozitīvi, ka projektos, par kuriem ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA), iepirkumu līgumi realizācijā ir vismaz par ceturto daļu no projektu finanšu apjoma. Tas liecina par labu projektu gatavības stadiju. Skatīt zemāk grafikā. Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnēs². ES fondu investīciju progresu kopējā un nozaru specifiskā informācija pieejama ES fondu atbildīgo iestāžu 2017. gada novembra informatīvajos ziņojumos MK par ES fondu investīciju ieviešanas statusu un priekšlikumiem rīcībā³ vienkopus pieejama ES fondu uzraudzības komitejas (turpmāk – UK) e-portfelī⁴. Tāpat ES fondu UK e-portfelī ir iespējams iepazīties ar informāciju, ko plānots izskatīt 2017. gada 28. – 30. novembra ES fondu UK⁵ un Ikgadējās tikšanās ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) pasākumos⁶.

¹ FM uzdots reizi mēnesī (līdz nākamā mēneša beigām) iesniegt MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi, tai skaitā atbildīgo iestāžu dalījumā par noteiktiem finanšu mērķiem un citiem priekšnosacījumiem un uzdevumiem. Ziņojumā sniegta informācija par datu un informācijas apkopojumiem uz dažādiem atskaites datumiem ar mērķi sniegt aktuālo informāciju.

² Finanšu rādītāju plāni un to izpilde <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde> un aktuālā CFLA atlasu informācija pieejama: <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-iesniegumu-atlase>

³ Atbilstoši 24.10.2017. KDG protokola 2. jautājuma 3. punktā minētajam un 12.09.2017. MK sēdes protokola Nr. 45 42.§ 8.11.p., ziņojumi iesniedzami MK līdz 2017. gada 1. novembrim, ziņojumos iekļaujot situācijas novērtējumu par ES fondu investīciju ieviešanas negatīvām novirzēm un priekšlikumus finansējuma pārdalēm vai citu rīcību, tai skaitā attiecībā uz individuālu projektu, ja nepieciešams, lai novērstu riskus Darbības programmas noteikto mērķu izpildē.

⁴ sadaļā – uzraudzības ziņojumi → Atbildīgo iestāžu ziņojumi (atbilstoši MK 12.09.2017. sēdes protokola Nr. 45 8.10. apakšpunktam):


<https://komitejas.esfondi.lv/Atbildigo%20iestu%20ziojumi%20atbilstoi%20MK%2012092017sdes%20p/Forms/AllItems.aspx>

⁵ sadaļā – UK 2014-2020 → 28.11.2017_UK_14-20_sede:

https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/10.aspx


⁶ sadaļā – Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2017 → 02_Working_materials: https://komitejas.esfondi.lv/_layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx

Grafiks Nr.1 "ES fondu investīciju ieviešanas statuss līdz 2017. gada 1. novembrim, milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem līdz 2017. gada 1. oktobrim

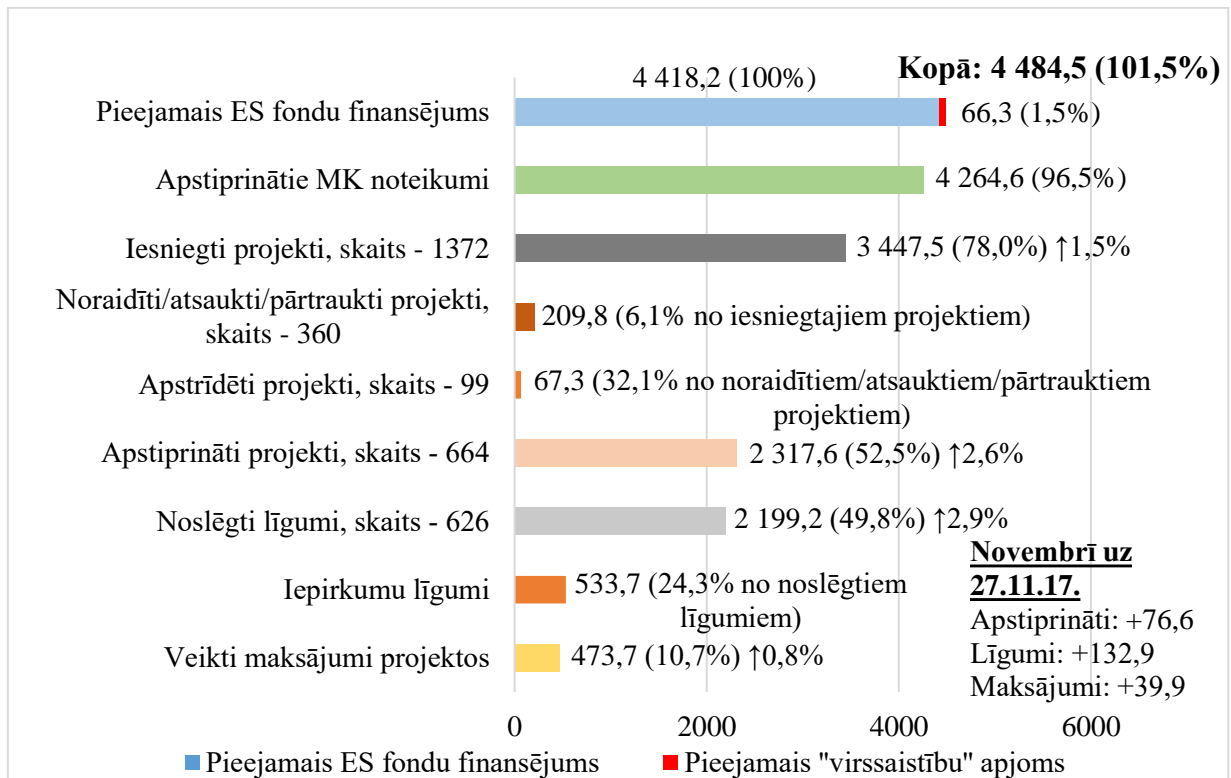

3. 2017. gada decembrī ir atlicis apstiprināt par 147,9 milj. euro ES finansējuma investīciju nosacījumus (MK noteikumi), no kuriem novembrī kavēti par 137,5 milj. euro. Skatīt zemāk grafikā un ziņojuma 1. pielikumā informāciju par atlikušo MK noteikumu virzības statusu.

Grafiks Nr.2 "2017. - 2019. gadā apstiprināmo MK noteikumu plāns (faktiskie dati līdz 2017. gada 27. novembrim, milj. euro)"

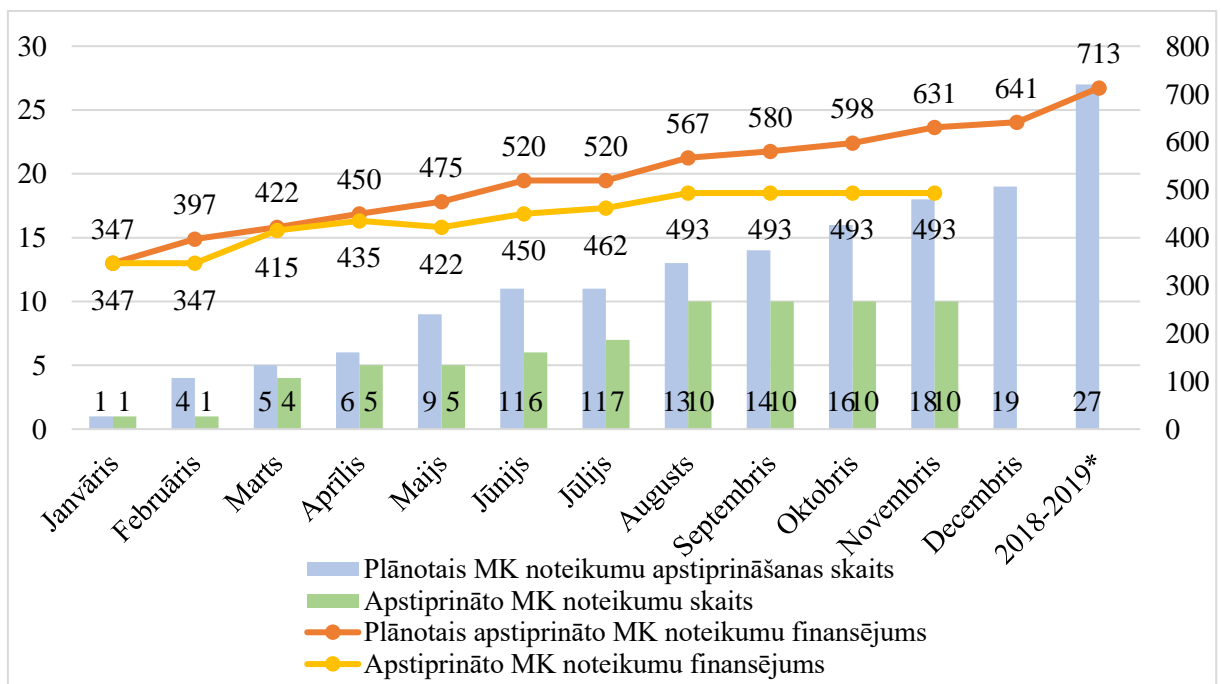

*Ietver tehnisko palīdzību un pasākumus pēc EK izvērtējuma par snieguma rezerves piešķiršanu.

4. Izglītības jomā atlikušo investīciju nosacījumu izstrādē ir neliels progress. Valsts sekretāru sanāsmē (turpmāk – VSS) 2017. gada 26. oktobrī izsludināti nosacījumi investīcijām akadēmiskā personāla stratēģiskās specializācijas stiprināšanai (29,2 milj. *euro*). Nosacījumus digitālo, metodisko līdzekļu izstrādei Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) paredz izsludināt 2017. gada decembrī (3,6 milj. *euro*), ņemot vērā ciešo sasaisti ar jaunā mācību satura īstenošanu.

5. Lai nodrošinātu izglītības jomas specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) īstenošanas noteikumu izstrādi un to iesniegšanu apstiprināšanai MK⁷ atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda vadības likuma Pārejas noteikumu 6. punktā noteiktajam. IZM turpina aktīvu saskaņošanu ar sociālajiem un sadarbības partneriem par investīciju nosacījumiem augstākajai izglītībai.

6. Kavējumi investīciju apstiprināšanai turpinās arī Ekonomikas ministrijas (turpmāk – EM) atbildībā esošajiem MK noteikumiem par energoefektivitātes paaugstināšanu ēkās (36,1 milj. *euro*), kā arī Veselības ministrijas (turpmāk – VM) atbildībā esošajiem MK noteikumiem par veselības aprūpes infrastruktūru trešai kārtai (13,5 milj. *euro*)⁸.

Finanšu ieviešanas 2017. gada kopējo plānu izpilde un risku novērtējums

7. SAM investīciju kopējais maksājumu temps joprojām atpaliek no gada sākumā plānotā. Līdz 2017. gada 1. novembrim no pārskata perioda kumulatīvā plāna 289,3 milj. *euro* ir izpildīti 80,3 % jeb 232,3 milj. *euro*. Skatīt zemāk grafikā un plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē⁹.


8. Atsevišķos pasākumos (piemēram, Rīgas pilsētas revitalizācijas, Salu tilta rekonstrukcijas, lielo pašvaldību energoefektivitātes uzlabošanas un praktiskas ievirzes pētījumu atbalsta mērķos) ieviešana notiek sekmīgāk un tas kompensē daļu no citu jomu vājākas naudas plūsmas. Tomēr joprojām paredzams, ka atlikušo gada divu mēnešu laikā neizdosies pilnā apmērā izpildīt gada plānu.

⁷ Vadības likuma Pārejas noteikumu 6. punkta nosacījums paredz to, ka jābūt izstrādātiem MK noteikumiem vismaz par daļu no pieejamā SAM finansējuma (piemēram, par pasākumu vai atlases kārtu). Attiecīgi no visa kopējā plānotā 4,4 mljrd. *euro* ES fondu “portfeļa” risks, ka šis nosacījums var netikt izpildīts ir tikai attiecībā uz šādiem IZM pārziņā esošiem SAM: 8.2.1. SAM “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”; 8.2.2. SAM “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”; 8.2.3. SAM “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās”.

⁸ Starpinstitūciju saskaņošanas procesā ir 9.3.2. SAM “Veselības aprūpes infrastruktūra” trešās kārtas (mazās slimnīcas) MK noteikumu projekts, paredzot mehānismu, kas stimulē mērķtiecīgu virzību uz slimnīcu apvienošanu VM definēto sadarbības tīklu ietvaros.

⁹ Kopējais 2017. gada plāns maksājumiem iekļauts FM 2016. gada II pusgada ziņojumā par ES fondu ieviešanas progresu (izskatīts 2017. gada 14. marta MK sēdē, protokola Nr.12 43.§, un ikmēneša izpildes statuss pieejams ES fondu tīmekļa vietnē: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>. Papildus skatīt skaidrojumu un rīcību informatīvajos ziņojumos par ES fonda investīciju ieviešanas statusu līdz 2017. gada 31. maijam, 30. jūnijam, 31. augustam un 30. septembrim. Skatīt ES fondu mājas lapas tīmekļa vietnē sadaļā Materiāli un ziņojumi/Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>

Grafiks Nr.3 "2014. - 2020. gada plānošanas periods: ES fondu līdzfinansējuma maksājumu plāna izpilde 2017. gadā kumulatīvi, milj. euro."*

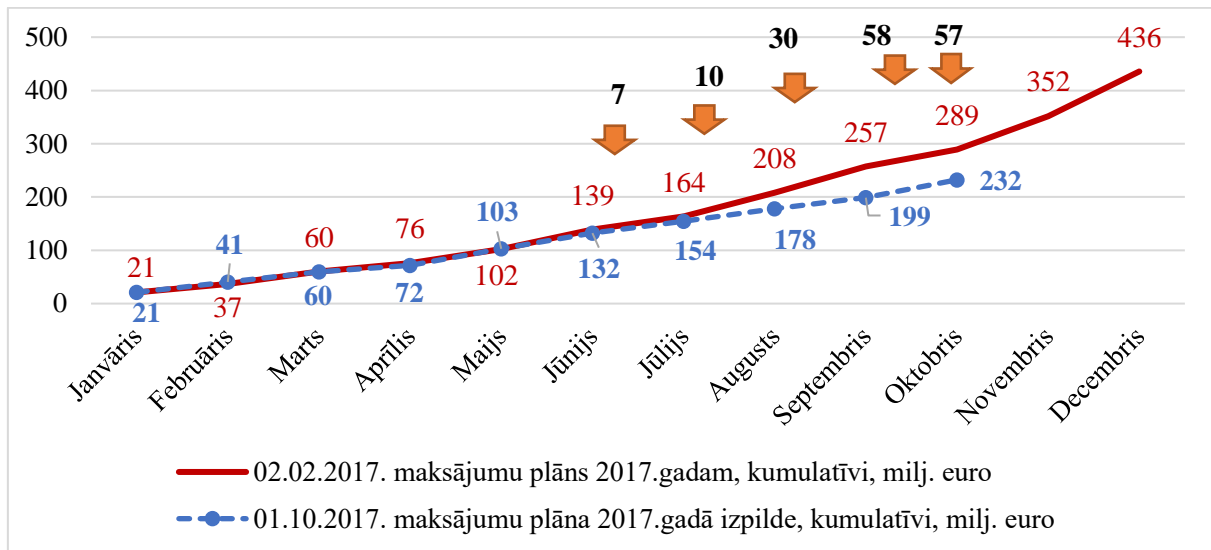

*cipari pie bultiņām nozīmē pārskata periodā plānotā neizpildi (plāns mīnus izpilde).

9. Lielākās negatīvas novirzes maksājumu plānu izpildē kopumā saglabājas investīciju jomās, kas minētas iepriekšējos pārskata periodos: (1) 17,1 milj. euro transporta jomā (lielākoties pozitīvu ietaupījumu dēļ reģionālo ceļu rekonstrukcijā; (2) 8,9 milj. euro (neizpilde mēneša laikā pieaugusi par 3,3 milj. euro) sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas jomā; (3) 7,4 milj. euro (neizpilde mēneša laikā pieaugusi par 3,2 milj. euro) pētniecības un inovāciju jomā (4) 7,3 milj. euro nodarbinātības jomā; (3) energoefektivitātes jomā 6,0 milj. euro (neizpilde mēneša laikā samazinājusies par 3,56 milj. euro).


Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (turpmāk – IPIA)¹⁰ projektu īstenotāju 2017. gada plānu izpildes novērtējums

10. Kopumā IPIA maksājumu pieprasījumu plānu izpildē negatīva tendence saglabājas – plāns nav izpildīts 215 projektos par 104,4 milj. euro, no kuriem 79 projekti jeb 94 % (97,8 milj. euro) ir ar negatīvu novirzi virs 0,2 milj. euro. Konstatējams, ka 2017. gada oktobrī negatīva ietekme joprojām ir kavēto iepirkumu un projektu lēnas virzības dēļ. Vienlaikus pozitīvi, ka 200 projektos tika iesniegti maksājumu pieprasījumi par 67,9 milj. euro vairāk nekā bija plānots, no kā lielākais īpatsvars ir pašvaldību projektiem. Tā rezultātā kopējā plāna līdz 2017. gada 1. novembrim neizpilde ir 36,5 milj. euro. Maksājumu pieprasījumu kumulatīvās izmaiņas skatīt zemāk grafikā. Ziņojuma 2. pielikumā uzskaitīti projekti, kur maksājumu pieprasījumu iesniegšanā ir būtiskākie kavējumi un izmainītie plāni 2017. gadā.

¹⁰ IPIA noteikti potenciālie projektu īstenotāji un finanšu sadalījums, kas kopā veido indikatīvi 90 % no kopējā ES finansējuma Latvijai (4,4 mljrd. euro). Detalizēta informācija par plānotajiem projektiem pieejama ES fondu tīmekļa vietnē apakšsadaļā "Maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildes ierobežotu projektu iesniegumu atlasu projektos": <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde>

11. Līdz 2017. gada novembrim projektu īstenotāji CFLA ir iesnieguši izmaiņas plānotajos maksājumos, samazinot kopumā gada plānu par 78,9 milj. *euro*. 2017. gada oktobrī maksājumu plāni samazināti par 29,5 milj. *euro*. Lielākās izmaiņas maksājumu plānos bija reģionālo ceļu investīciju projektos (11,8 milj. *euro*) un valsts galveno autoceļu investīciju projektos (5,7 milj. *euro*), aktualizējot situāciju pret reāli veiktajiem darbiem un ietaupījumiem.

Grafiks Nr.4 "2014. - 2020. gada plānošanas periods: Maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro."

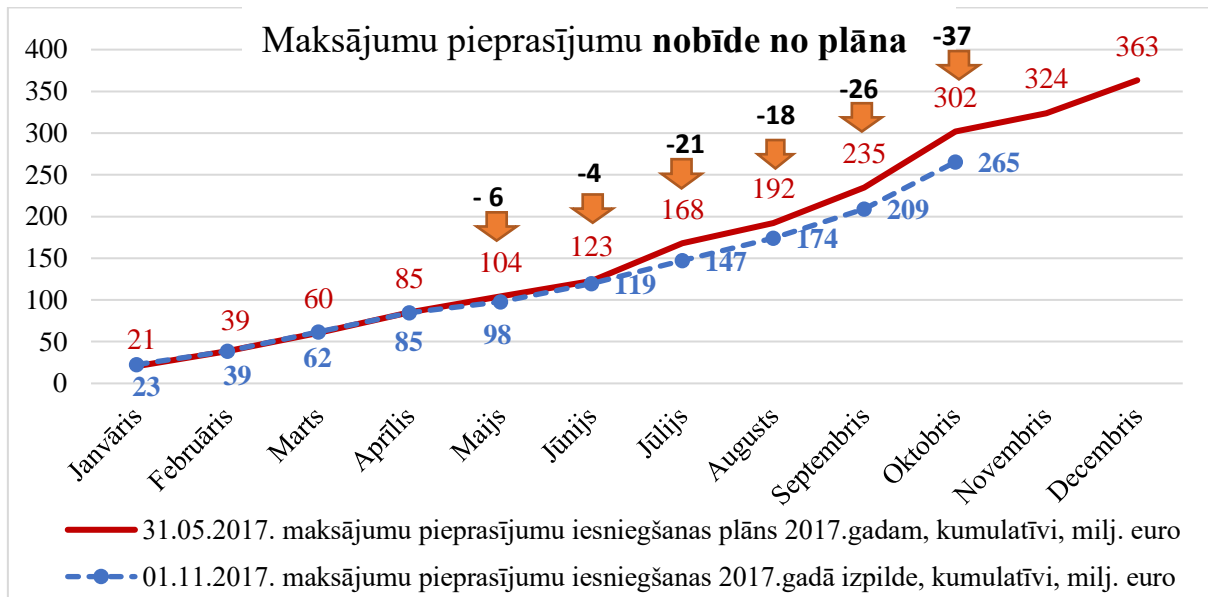

12. Oktobrī bija lielākais maksājumu pieprasījumu plāna pieaugums (67 milj. *euro*), kas rezultējās arī ar lielāko mēneša neizpildi (42,1 milj. *euro*). Vienlaikus tika iesniegti neplānoti maksājumi (34,4 milj. *euro*), kas kumulatīvo neizpildi būtiski samazināja.


13. FM konstatē pozitīvu tendenci, ka palielinās naudas plūsma un ir daudzi sekmīgi projekti, kas izpilda vai pārsniedz plānoto. Vienlaikus kopējā projektu finanšu plānu izpildes kvalitāte vērtējama kā ļoti vāja, jo līdz 2017. gada novembrim ir 149 projekti ar individuālo plānu neizpildi – vairāk kā 25%, kas kopā ir kavēti/neiesniegti maksājumu pieprasījumi 89,8 milj. *euro*. Ņemot vērā iepriekš minēto statistiku un analīzi par ierobežotas atlases projektu maksājumu pieprasījumu plānu izpildes kvalitāti un analizējot turpmākās tendences, FM izstrādās stingrākus projektu ieviešanas plānu izpildes nosacījumus, nosakot pieļaujamās atkāpes un citus disciplīnas pasākumus un plānu izpildes uzraudzības atbalsta instrumentus. Plānots detalizēti izstrādātu priekšlikumu virzīt iesniegšanai MK līdz 2018.gada 1.martam¹¹.

¹¹ kopā ar regulāro ES fondu pusgada MK ziņojuma un protokollēmuma projektu.

IPIA projektu iesniegumu plānu izpildes statuss 2017. gadā

14. Ziņojuma 3. pielikumā un zemāk grafikā ir informācija par IPIA projektu iesniegumu progresu ar operatīvo informāciju līdz 2017. gada 17. novembrim. Kopā atbilstoši projektu īstenotāju plānam (lielākā daļa ir pašvaldības) nav iesniegti 86 projekti par 144,5 milj. euro ES fondu finansējuma. Tāpat situācijas analīze liek secināt, ka projektu iesniegšana pēdējā termiņā turpinās. Piemēram, noslēgumam tuvojas pašvaldības ēku energoefektivitātes projektu atlasē otrā kārtā (29.11.2017.), bet projektu iesniegumu kavējumi nemazinās.

Grafiks Nr.5 “2014. - 2020. gada plānošanas periods: Projektu iesniegumu plāna izpilde IPIA projektiem 2017. gadā kumulatīvi, ES fondi milj. euro (skaits).”

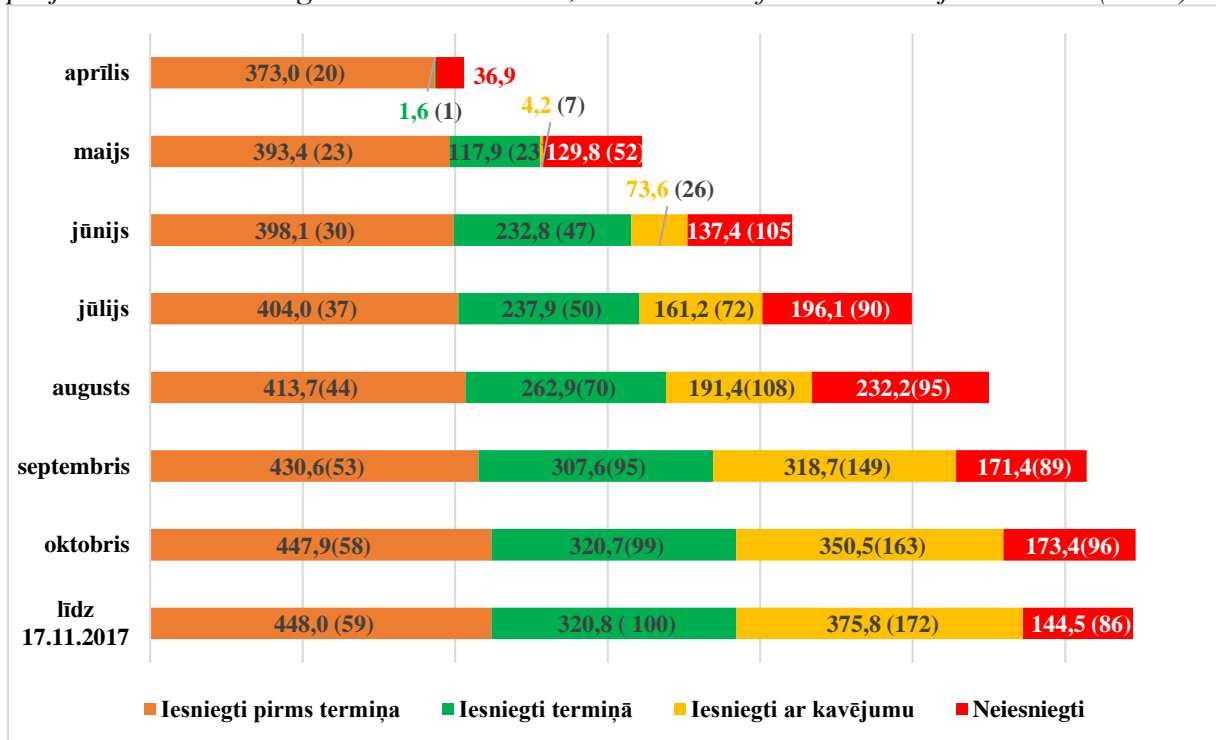

15. CFLA turpina apkopot informāciju, t.sk. aptaujā projektu iesniedzējus, lai aktualizētu plānoto projektu iesniegšanas termiņus un plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikus 2018. gadam un turpmākajiem gadiem. Pēc datu apkopošanas tiks sagatavots projektu iesniegšanas grafiks, kurš finansējuma saņēmējam būs saistošs. Projektu iesniedzēji/finansējuma saņēmēji kavējās ar informācijas aktualizēšanu, kas apgrūrina turpmāk veicamās darbības. Tāpat CFLA un atbildīgās iestādes turpina aktīvi sniegt nepieciešamo konsultatīvo atbalstu projektu īstenotājiem (individualizēti un kopējos semināros, konferencēs) gan par projektu uzsākšanas, t.sk. ticamas plānošanas jautājumiem, gan par ieviešanas aspektiem, t.sk. iepirkumiem (sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un citām kompetentajām institūcijām un ekspertiem). 2017. gada novembrī īpaši atzīmējama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīva sadarbībā ar FM un CFLA, tiekoties individuāli ar katras integrēto teritoriju investīciju pilsētas pārstāvjiem un pārrunājot iespējamus risinājumus projektu ieviešanas tempu un kvalitātes uzlabošanā.

Citi aktuālie jautājumi

16. IZM Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa ziņojuma (2017)¹² saskaņošanas process turpinās. Progresu jautājums iekļauts arī ikgadējās tikšanās ar EK 2017. gada 30. novembra darba kārtībā¹³.

17. 2007. – 2013. gada plānošanas perioda nepabeigtā lielā projekta “Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārceļšanai no pilsētas centra” virzība¹⁴ kopumā notiek atbilstoši Rīgas Brīvostas pārvaldes (turpmāk – RBP) rīcības plānam. RBP turpina darbu pie stividoriem nepieciešamās papildu infrastruktūras izbūves saskaņā ar iepirkuma līgumu.

18. 2017. gada 24. novembra Sadarbības partneru darba grupas par ES fondu jautājumiem (turpmāk – KDG) sanāksmē uzdoto uzdevumu izpildes statuss¹⁵:

1) Darbības programmas grozījumu priekšlikuma Nr. 3 informatīva izskatīšana paredzēta 2017. gada 28. novembrī ES fondu UK, pēc tam uzsākot oficiālo saskaņošanas un apstiprināšanas procesu noteiktā kārtībā.

2) Attiecībā uz lielo projektu “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija”¹⁶ Satiksmes ministrija virzīs atsevišķu MK ziņojumu ar priekšlikumu rīcībai.

3) 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”¹⁷ investīciju projektu īstenošanā joprojām nav būtiska progresa¹⁸. EM informatīvajā ziņojumā, kas novembrī tika iesniegts MK, tika ietverta analīze par 4.2.1.2. pasākuma pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas plānoto finansējuma apguves prognozi. EM plāno līdz 1. decembrim iesniegt izskatīšanai MK 4.2.1.2. pasākuma pirmās kārtas īstenošanas noteikumu¹⁹ grozījumu projektu, kurā ietverti nosacījumi 4.2.1.2. pasākuma ieviešanas paātrināšanai.

¹² Izsludināts VSS 2017. gada 8. jūnijā (VSS-621; 22., 17.§), prezentēts Latvijas Pētniecības un inovāciju stratēģiskās padomes 2017. gada 15. jūnija sēdē. MK uzdevums, izskatot IZM ziņojumu “Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma”. Tajā ietvertais analītisko ziņojuma sagatavošanas laika grafiks paredzēja RIS3 apsekojuma iesniegšanu Latvijas pētniecības un inovāciju stratēģiskajā padomē līdz 2017. gada 1. jūnijam; pārējie progresa ziņojumi iesniedzami 2019., 2021. un 2023. gadā (uz 01.06.) (izskatīts MK 2015. gada 15. septembrī; sēdes protokols Nr. 47 35.§). IZM 2017. gada 6. novembrī saskaņošanai iesniegusi precizēto ziņojumu (FM atzinums ar iebildumiem sniegts 2017. gada 13. novembrī).

¹³ sadaļā – Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2017 → 02_Working_materials → 02_30.11.2017 → 3.1_MoES_Smart_specialisation:

<https://komitejas.esfondi.lv/layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx>

¹⁴ Atbilstoši MK 2017. gada 14. marta sēdes protokola Nr.12. 43§ noteiktajiem uzdevumiem ES fondu ietvaros.

¹⁵ Uzdevumi, kuru izpildei nav pienācis termiņš vai nav konstatētas problēmas, netiek atkārtoti iekļauti šajā ziņojumā.

¹⁶ Atbilstoši MK 2017. gada 17. janvāra sēdes protokola Nr.3 39.§ “Informatīvais ziņojums “Par lielā projekta “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” sagatavošanas progresu, izmaksu un ieguvumu analīzes rezultātiem un projekta īstenošanas risinājumiem”” 10. punktā noteiktajam

¹⁷ Pirmās kārtas (Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 70 milj. *euro*) un otrās kārtas (ERAF finansējums 27,6 milj. *euro*).

¹⁸ Līdz 2017. gada 13. novembrim CFLA ir iesniegti 32 projektu iesniegumi (par kopējo ERAF 17,3 milj. *euro* un iekļauto ēku kopējā platība ir 171 273 m²).

¹⁹ 2016.gada 9.augusta noteikumi Nr.534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. SAM "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Turpinās saskaņošanas process MK noteikumu projektam par otrās atlasē kārtas īstenošanu. Aktualizētā informācija par pirmās atlasē kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem un projektu ikgadējās naudas plūsmām tiks iekļauta pie pirmās kārtas MK noteikumu grozījumiem. Informācija par otrās atlasē kārtas projektu plānotajiem iesniegumu iesniegšanas termiņiem un projektu ikgadējās naudas plūsmām tiks iekļauta otrās kārtas MK noteikumu projekta anotācijā.

4) Izskatīts jautājums par reģionālo biznesa inkubatoru atbalsta mehānisma uzlabošanu, atbalsta sniegšanu vairāk decentralizējot. Tāpat pārrunāti citi aktuāli ES investīciju jautājumi, t.sk. aktualizējot projektu ieviešanas plānu izpildes kvalitātes un finanšu disciplīnas nepieciešamību.

19. Atbilstoši 2017. gada 12. septembra MK sēdē izskatītā ES fondu investīciju progresa ziņojuma protokollēmumā uzdotajam, sniedzam informāciju par atsevišķu aktuālo uzdevumu izpildi:

1) MK protokola 8.2. apakšpunkts ir izpildīts, un 2017.gada 7.novembra MK sēdē tika apstiprināts MK noteikumu par 9.2.4. SAM (Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi) īstenošanu²⁰ grozījumu projekts, lai vienkāršotu un atvieglotu finansējuma saņēmējiem projektu sagatavošanu un īstenošanu, samazinot administratīvo slogu.

2) Lai novērstu neatbilstoši veiktos izdevumus un uzlabotu Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – NVA) atbalsta pasākumu efektivitāti, 2017.gada 21. novembrī MK izskatīts Labklājības ministrijas (turpmāk – LM) ziņojums²¹, protokollēmumā nosakot LM līdz 2018. gada 1. martam informēt FM un CFLA par NVA iekšējās kontroles sistēmas veikto izmaiņu ietekmi uz 2017. un 2018. gadā veikto pārbaužu rezultātiem 7.1.1. SAM²², 7.2.1.1. pasākuma²³ un 9.1.1.1. pasākuma²⁴ īstenošanas vietās. Kopš 2017.gada novembra vidus CFLA ir nodrošināta pieeja bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakancu informācijas sistēmai (BURVIS).

Turpmākā prioritārā rīcība:

Neatmaidīgs fokuss FM, CFLA, atbildīgajām iestādēm un projektu īstenošanai ir uz projektu ieviešanas veicināšanu, tajā skaitā ikmēneša plānu izpildes disciplīnas stiprināšanu, operatīvi rodot iespēju risināt konstatētos nozīmīgākos projektu līmeņa riskus.

²⁰ MK 2016. gada 17. maija noteikumi Nr.310 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1.pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi”.

²¹ 21.11.2017. MK ziņojums (projekta Nr. TA-2431) “Par situācijas novērtējumu, veiktajiem un plānotajiem pasākumiem konstatēto trūkumu novēršanai NVA īstenoto ESF projektu uzraudzības procesā”

²² 7.1.1. SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

²³ 7.2.1.1. pasākums “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai

²⁴ 9.1.1.1. pasākums “Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”

2017. gada pēdējā ceturksnī intensīvs darbs pie 2018. gada investīciju plānu un prognožu izstrādes.

2017. gada 28. novembrī norisinājās ES fondu UK sēde 2014. – 2020. gada plānošanas perioda UK sēde, kurā tika izskatīts ES fondu ieviešanas progress un citi aktuālie jautājumi²⁵, bet no 29. līdz 30. novembrim FM telpās notika ikgadējā tikšanās ar EK pārstāvjiem, kuras laikā tika pārrunāti ES fondu stratēģiskie jautājumi²⁶.

Ikmēneša ziņojumos FM turpinās informēt valdību ne tikai par ieviešanas progresu, bet arī par nepieciešamo iesaisti ātrākai lēmumu pieņemšanai, kā arī par iepriekš pieņemto lēmumu izpildi.

Finanšu ministre

D. Reizniece-Ozola

Zālīte-Supe 67083808
Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv

²⁵ Iespēja iepazīties ar UK izskatītajiem materiāliem: <http://www.esfondi.lv/uzraudzibas-komiteja-1>

²⁶ Iespēja iepazīties ar ikgadējās tikšanās materiāliem sadaļā – Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) → materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2017:
<https://komitejas.esfondi.lv/layouts/15/start.aspx#/AEM/Forms/AllItems.aspx>
