



LATVIJAS REPUBLIKAS  
FINANŠU MINISTRIJA

## Kohēzijas politikas ES fondu investīcijas progresa informācija

10.03.2015. Ministru kabineta sēde






## Saturs

1. 2007-2013 periods: progress, riski un pasākumi
2. 2014–2020 perioda aktualitātes
  - Finanšu informācija
  - Priekšnosacījumi, riski un pasākumi
3. EEZ/Norvēģijas programmu statuss, riski, pasākumi
4. Protokollēmuma projekts




## 2007-2013 perioda ES fondu investīciju progress uz 31.01.2015. mEUR; % pret 31.10.2014.

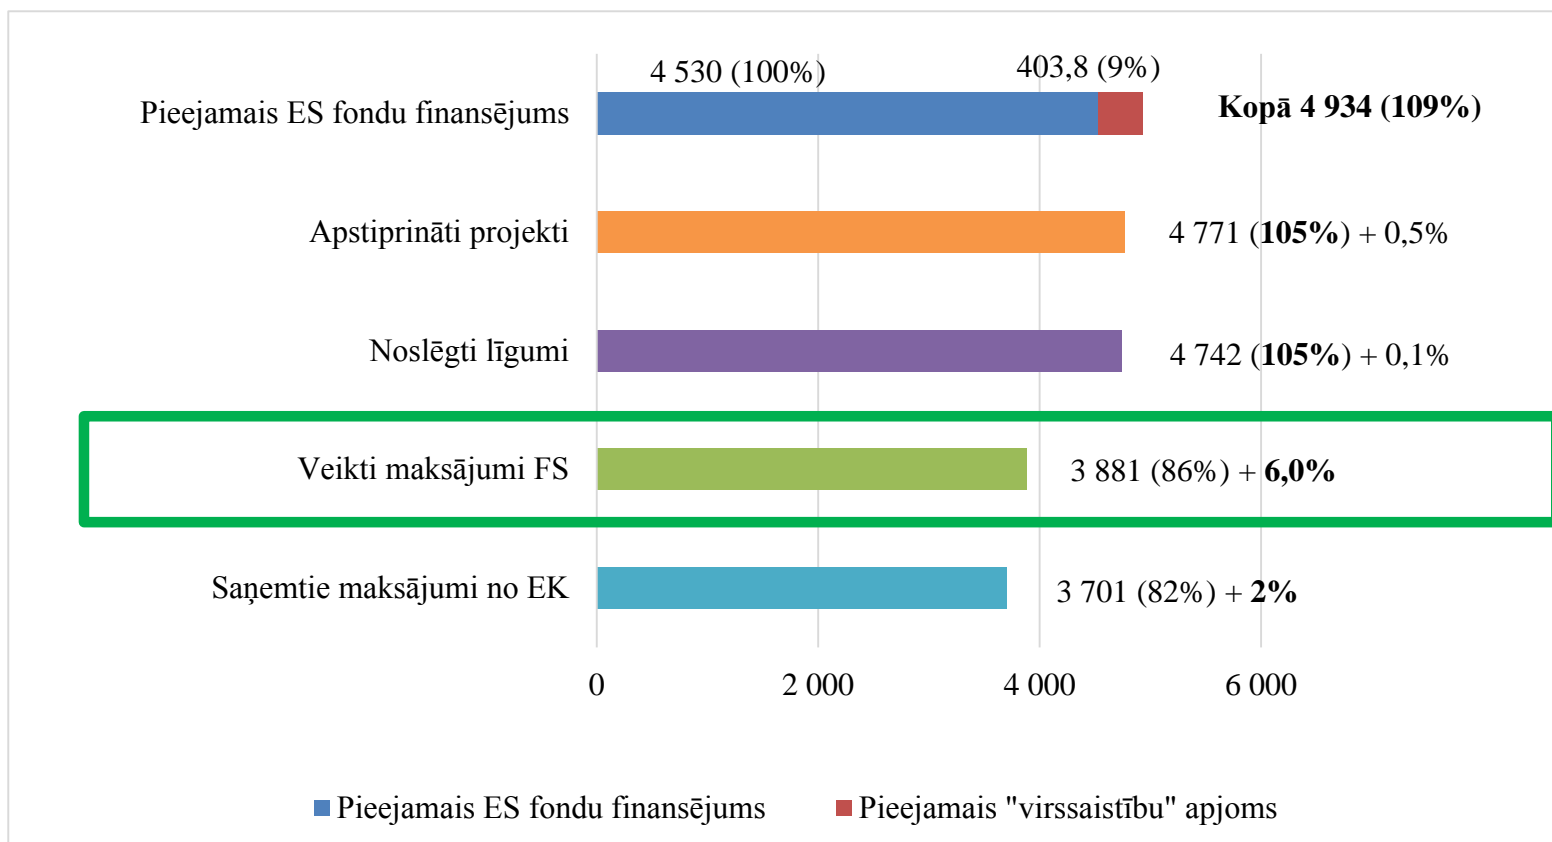

Līgumu saistības virs 100% = «virssaistības» no valsts budžeta  
Kohēzijas fondā līgumi – 98,8 %



## 2007-2013 perioda maksājumi līdz 31.01.2015. mEUR, % no ES fondiem, % pret 31.10.2014.

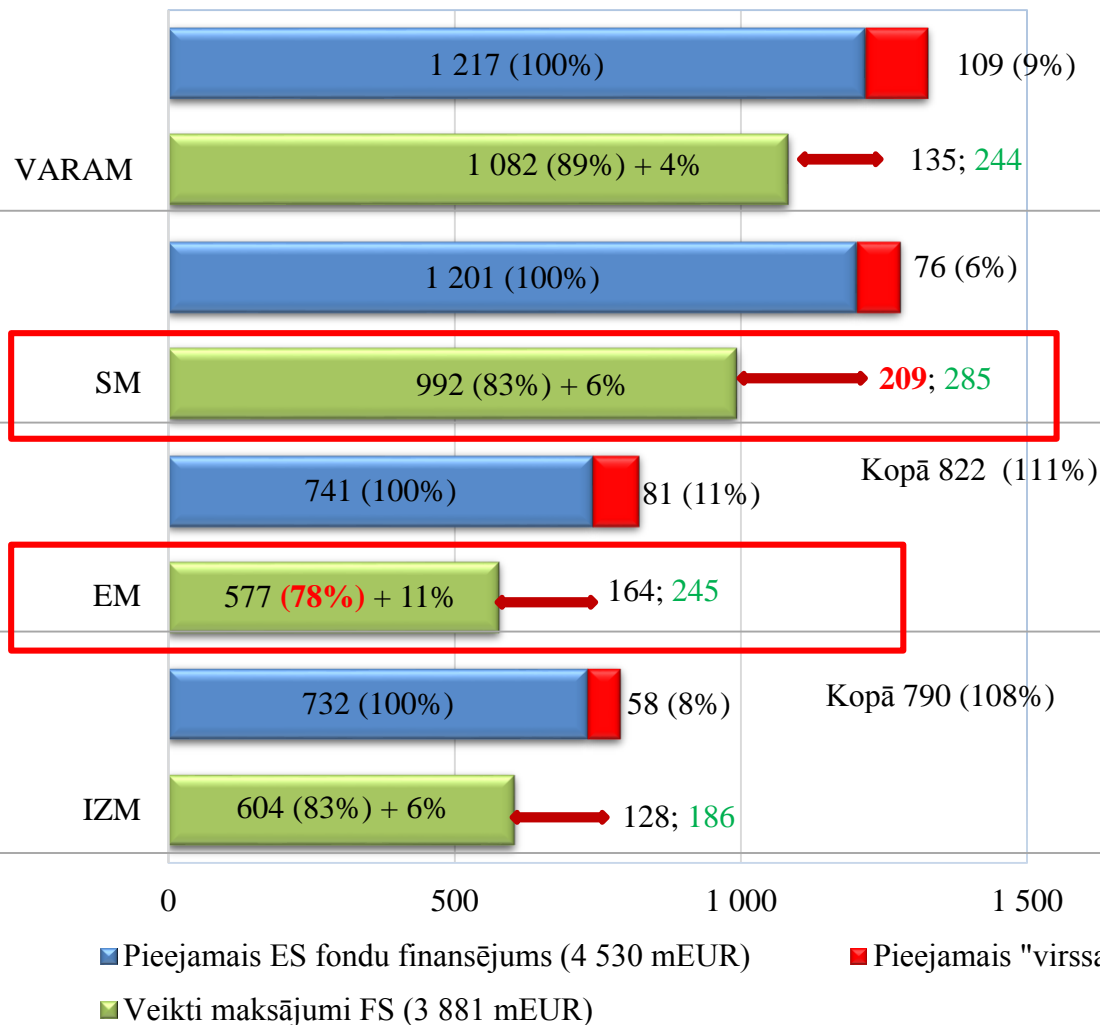


**1 gada laikā vēl jāizmaksā kopā -  
1 053 mEUR, tsk virssaistības:**

- 1) 958,9 mEUR - VARAM+SM+EM+IZM
- EM relatīvi vismazāk izmaksāts
- SM absolūtos skaitļos visvairāk vēl darba
- 2) 94,1 mEUR - LM+VM+KM+Vkanc+TP



## 2007-2013 perioda ERAF programma «Uzņēmējdarbība un inovācijas» deklarējamie EK izdevumi un prognozes, mEUR

Novērsts risks ERAF finansējuma zaudēšanai

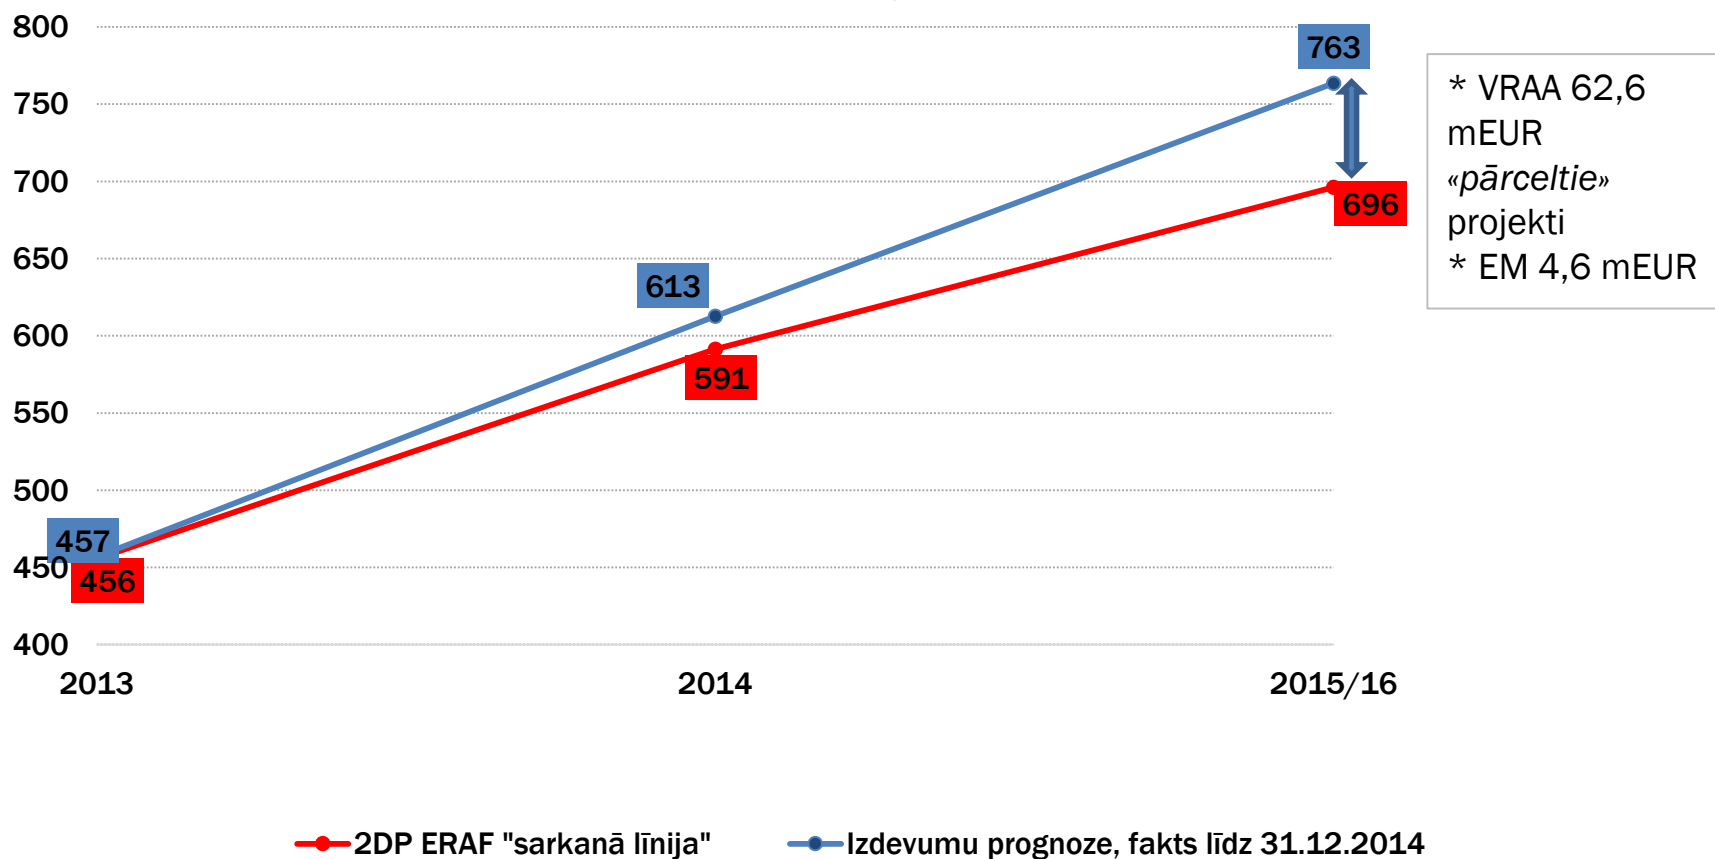

Perioda beigās uz «virssaistību» rēķina veidojas apm. **67,2 mEUR rezerve** – pārsniegts max ERAF piešķirums no EK, kas ir 100% valsts budžeta izdevumi



## 2007-2013 programma «Infrastruktūra un pakalpojumi» aktuālās aplēses ES fondu izdevumiem EK, mEUR

Fonds	Pieejamais finansējums		«Aploknes» izlietojuma prognozes			
	ES fondi (aploksne)	«Virssaistības»	uz 30.01.	Prognožu izmaiņas	Aktuālā	Indikatīvs ieguvums – pozitīva rezerve, deklarējot EK pēc augstākām prioritāšu likmēm ***
1	2	3	4	5	6	7
DP kopā	3 251	170	51	-50	1	150
<i>ERAF:</i>	<i>1 711</i>	<i>125</i>	<i>+ 30</i>	<i>-1*</i>	<i>+ 29**</i> <i>virs «aploknes» = 100%</i> <i>valsts budžets</i>	<i>50</i>
<i>Kohēzijas Fonds</i>	<i>1 539</i>	<i>46</i>	<i>-29</i>	<i>+15</i>	<i>- 14 = KF zaudējums*</i>	<i>100</i>

\* Vienlaikus ir kompensējoši riskus mazinoši pasākumi ar augstu iespēju nezaudēt KF finansējumu  
– skat.sekojošos slaidos



## Riski un risinājumi 2007-2013 perioda Kohēzijas fonda pilnīgas izmantošanas nodrošināšanai

1. **Riski:** lielākā mērā nekā šobrīd riskos ievērtēts - līgumu laušana, neatbilstoši veikti izdevumi, ietaupījumi, ārkārtas finanšu korekcijas no EK puses u.c.
2. **Risku negatīvās ietekmes mazinošie pasākumi:**
  - 1) **elastība** pieejamā finansējuma izmantošanai KF projektiem – piedāvāts MK protokollēmuma punkts
  - 2) **Programmas grozījumi, precizējot finansējumu starp prioritātēm un ieguvumi no ES atbalsta aprēķina** (*prioritātes atbalsta likmes piemērošana uz publiskā finansējuma attiecināmiem izdevumiem*)
  - 3) **ERAF projektu pārcelšana uz KF** (plānots 2015.g. 2.ceturksnī virzīt):
    - a) *publiskais transports (ERAF 20 mEUR) – visreālāk*
    - b) *«Inčukalna sērskābie gudrona dīķi» sanācijas darbi (EK lēmumā ERAF 20,2 mEUR + 11,2 mEUR izmaksu palielinājums neparedzamu apstākļu ietekmē) – risks*
  - 4) **Ātrāk uzsākto 2014-2020 projektu iekļaušana 2007-2013 aploksnē (ceļi) – ja kritiski būtu nepieciešams**



## Riski lielajos projektos

1. **AUGSTS RISKS - VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" projekts** (ERAF 24,1 mEUR) – Veselības ministrija vērtē situāciju gatavo priekšlikumus
2. **VIDĒJS/AUGSTS RISKS - Rīgas Brīvostas pārvaldes (RBP) projekts** “Infrastruktūras attīstība **Krievu salā** ostas aktivitāšu pārceļšanai no pilsētas centra” (KF 77,2 mEUR) – RBP paredz mērķu sasniegšanu līdz 2018.g. beigām – notiek/plānotas sarunas ar EK par projekta grozījumiem, t.sk. valsts atbalsta jautājumos
2. **VIDĒJS/AUGSTS RISKS - Inčukalna sērskābā gudrona dīķu rehabilitācijas projekts** (ERAF 11,2 mEUR izmaksu palielinājums neparedzamu apstākļu un pielāgota tehniskā risinājuma rezultātā) – sadarbībā ar JASPERS notiek sarunas ar EK par projekta grozījumiem






## Saturs

1. 2007-2013 periods: progress, riski un pasākumi
2. 2014–2020 perioda aktualitātes
  - Finanšu informācija
  - Priekšnosacījumi, riski un pasākumi
3. EEZ/Norvēģijas programmu statuss, riski, pasākumi
4. Protokollēmuma projekts



## Kohēzijas politikas ES fondu budžeta izdevumu plāni 2007-2013 & 2014-2020 periodu paralēlā ieviešanas posmā, mEUR

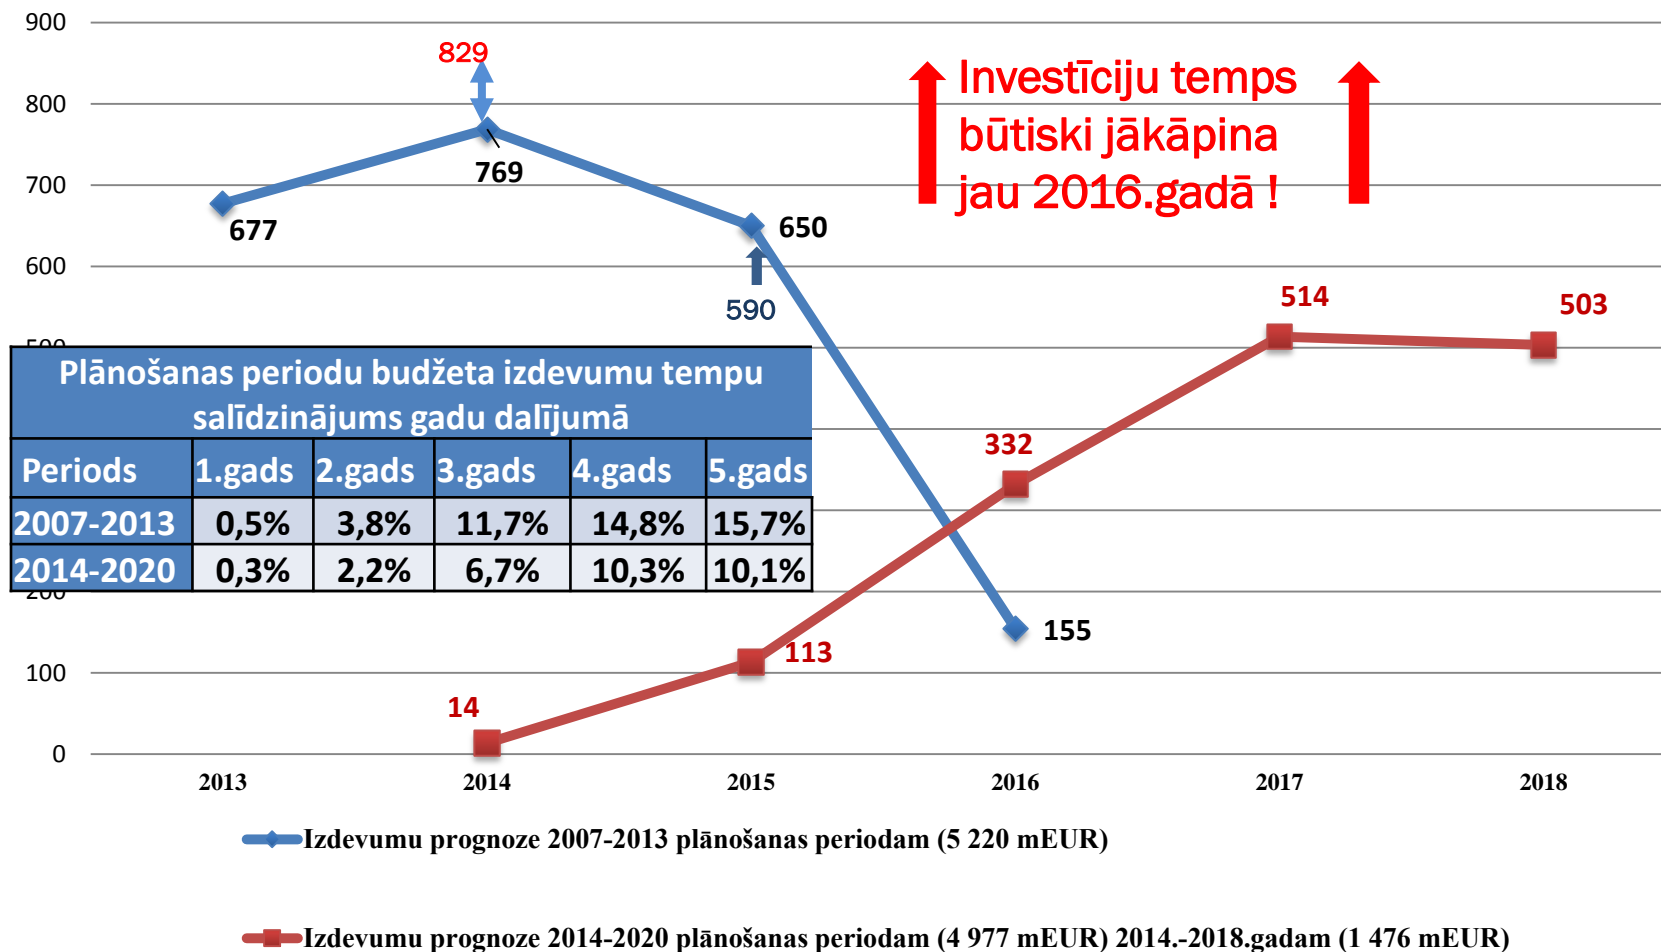

2007-2013 periods: palielinājies izdevumu plāns 2015. g., ņemot vērā 2014.g. izpildi




## Pārskata periodā paveiktais un turpmākā rīcība

- 11.11.2014. – Eiropas Komisijas lēmums par darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» apstiprināšanu.
  - 17.12.2014. – Eiropas Komisijas lēmums par grozījumiem Partnerības līgumā (attiecībā uz EJZF un ELFLA finansējumu).
  - 25.02.2015. – Uzraudzības komitejas dalībniekiem apspriešanai izsūtīts darbības programmas papildinājuma projekts.
- 
- Turpinās darbs pie specifisko atbalsta mērķu regulējuma izstrādes.
  - Ir uzsākta pirmo projektu īstenošana specifisko atbalsta mērķu (SAM) ietvaros ceļu infrastruktūras sakārtošanai, plūdu risku novēršanai, nodarbinātībā veicināšanai un veselības tīklu vadlīniju izstrādei (SAM kopējais finansējuma apjoms 672 638 830 EUR (ES fondu finansējums)).
  - Turpinās darbs pie Izvērtēšanas plāna 2014 – 2020 saskaņošanas.
  - Turpinās darbs pie Ikgadējā izvērtēšanas plāna 2015 saskaņošanas.
  - Turpinās darbs pie darbības programmas papildinājuma izstrādes – plānots prezentēt Uzraudzības komitejas sēdē 30.04.2015.




## Tālākais laika grafiks (atbilstoši DP papildinājuma laika grafikam)

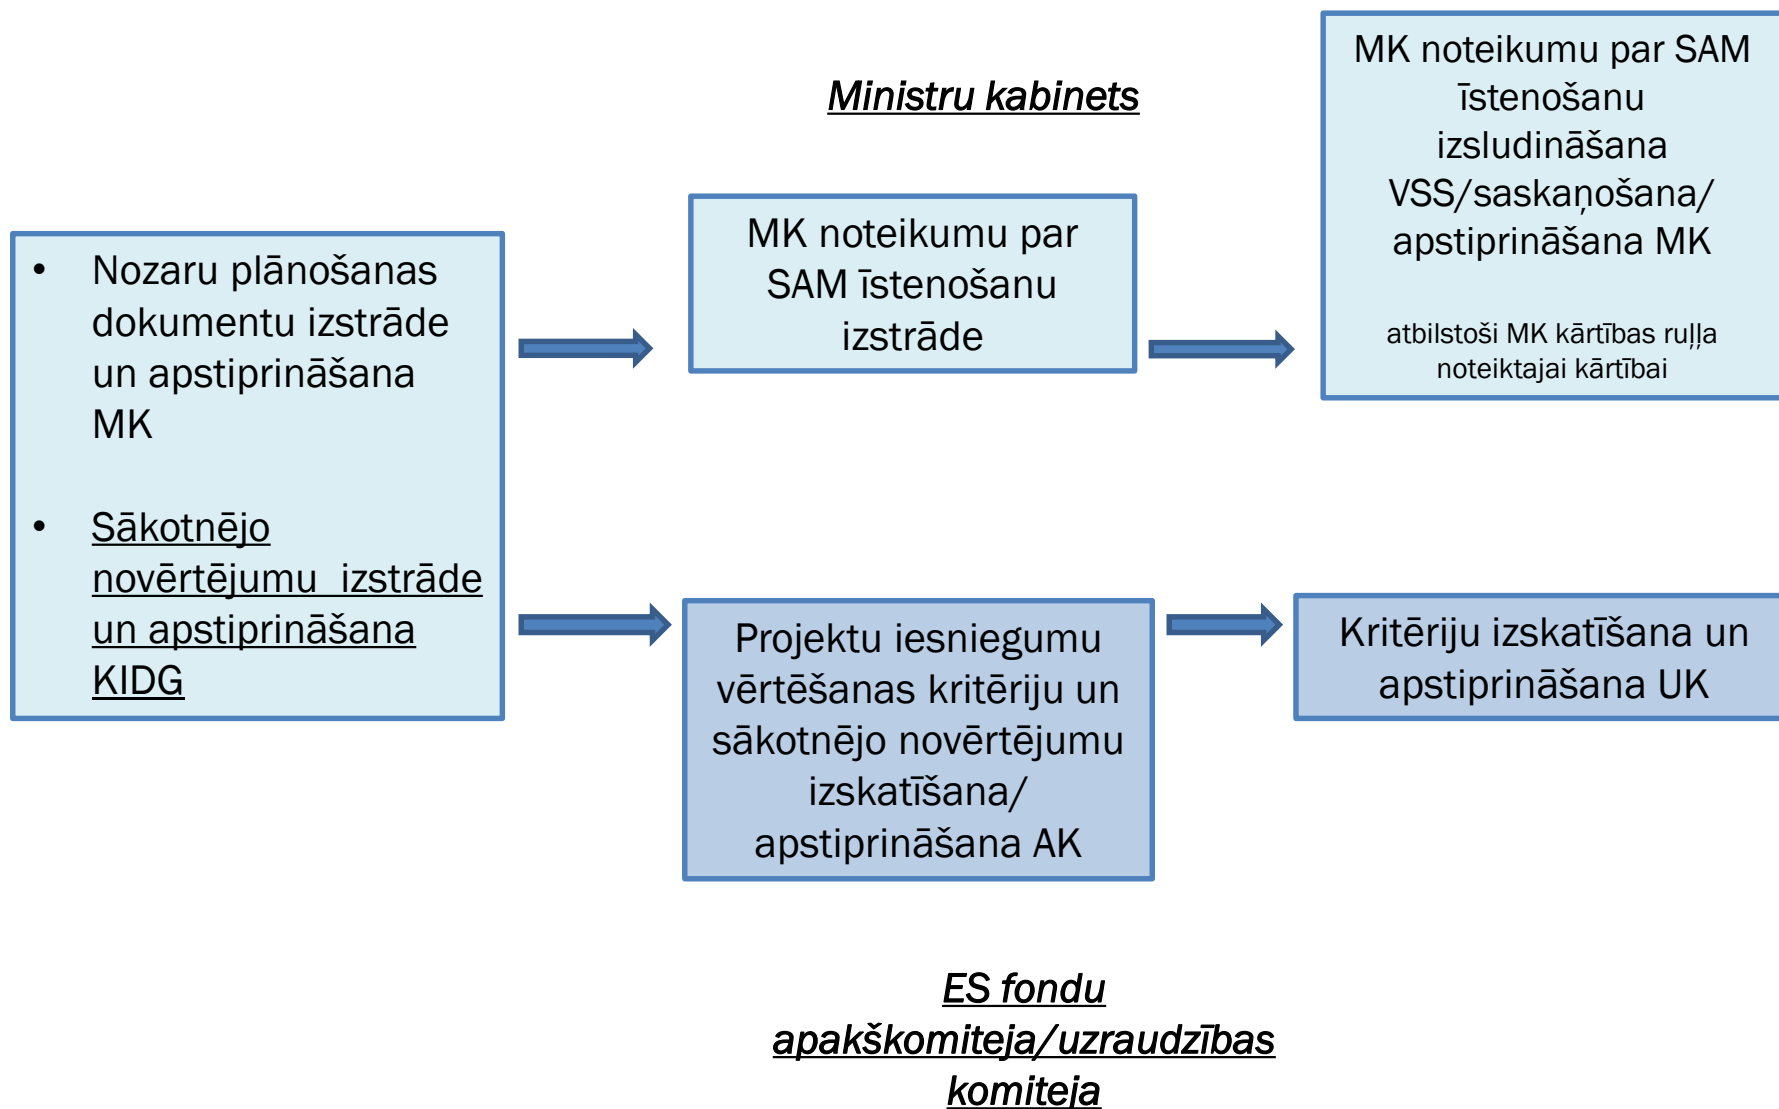



## SAM, kas uzsākti 2014. gadā, ko plānots uzsākt 2015.gadā un kopējais SAM finansējums mEUR

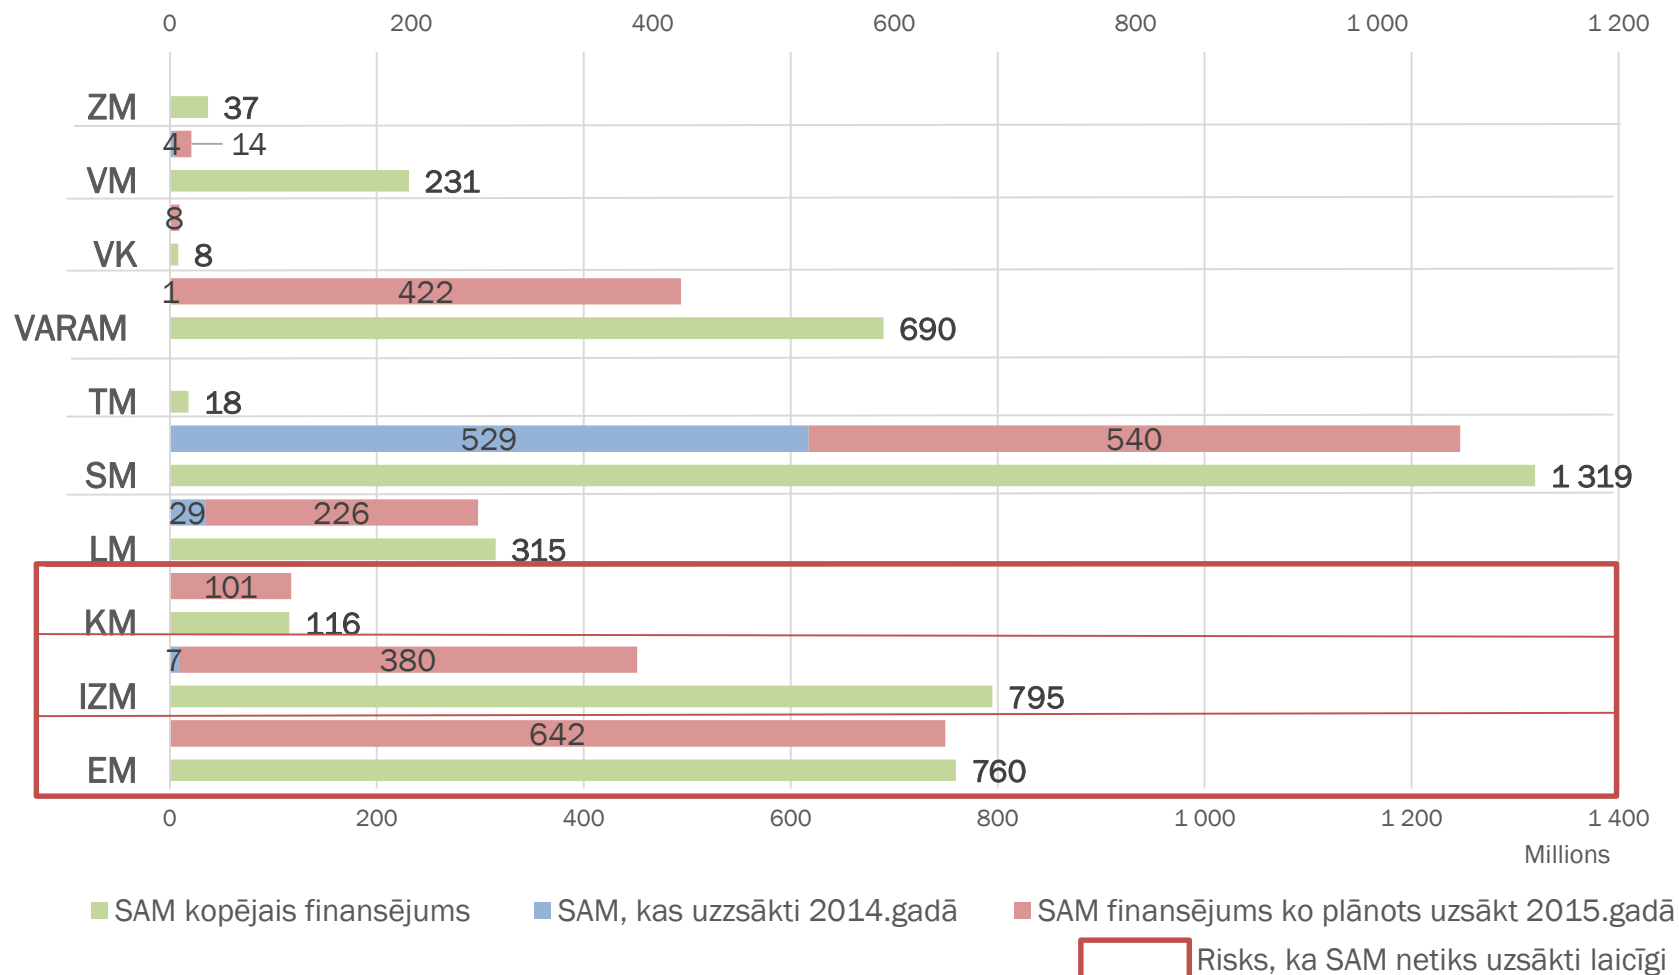




## Ex-ante nosacījumu izpilde

*Ex-ante* nosacījumi – Eiropas Komisijas izvirzīti priekšnosacījumi ES fondu 2014.-2020.plānošanas perioda investīciju uzsākšanai (nozares sākotnējā izpēte, nepieciešamo investīciju pamatojums, u.c.)

- Atsevišķu *ex-ante* nosacījumu izpildes termiņš atbilstoši PL noteiktajam ir 2015.gada vidus un beigas:
  - P&A&I (16.03.2015. plānota tikšanās ar Eiropas Komisiju);
  - Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte (notiek tehnisko specifikāciju saskaņošana plānu izstrādei);
  - Izglītība, prasmes un mūžizglītība (tiek izstrādāti dokumenti mūžizglītības un karjeras pasākumu ieviešanai);
  - Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana (tiek izstrādāti nozares plānošanas dokumenti resocializācijas jomā).
- Laicīga *ex-ante* nosacījumu izpilde – lai nodrošinātu atbildīgu un stratēģisku plānošanu, laicīgu investīciju uzsākšanu un snieguma ietvara finanšu mērķu sasniegšanu līdz 2018.gadam.




## Ex-ante neizpildes ietekme mEUR

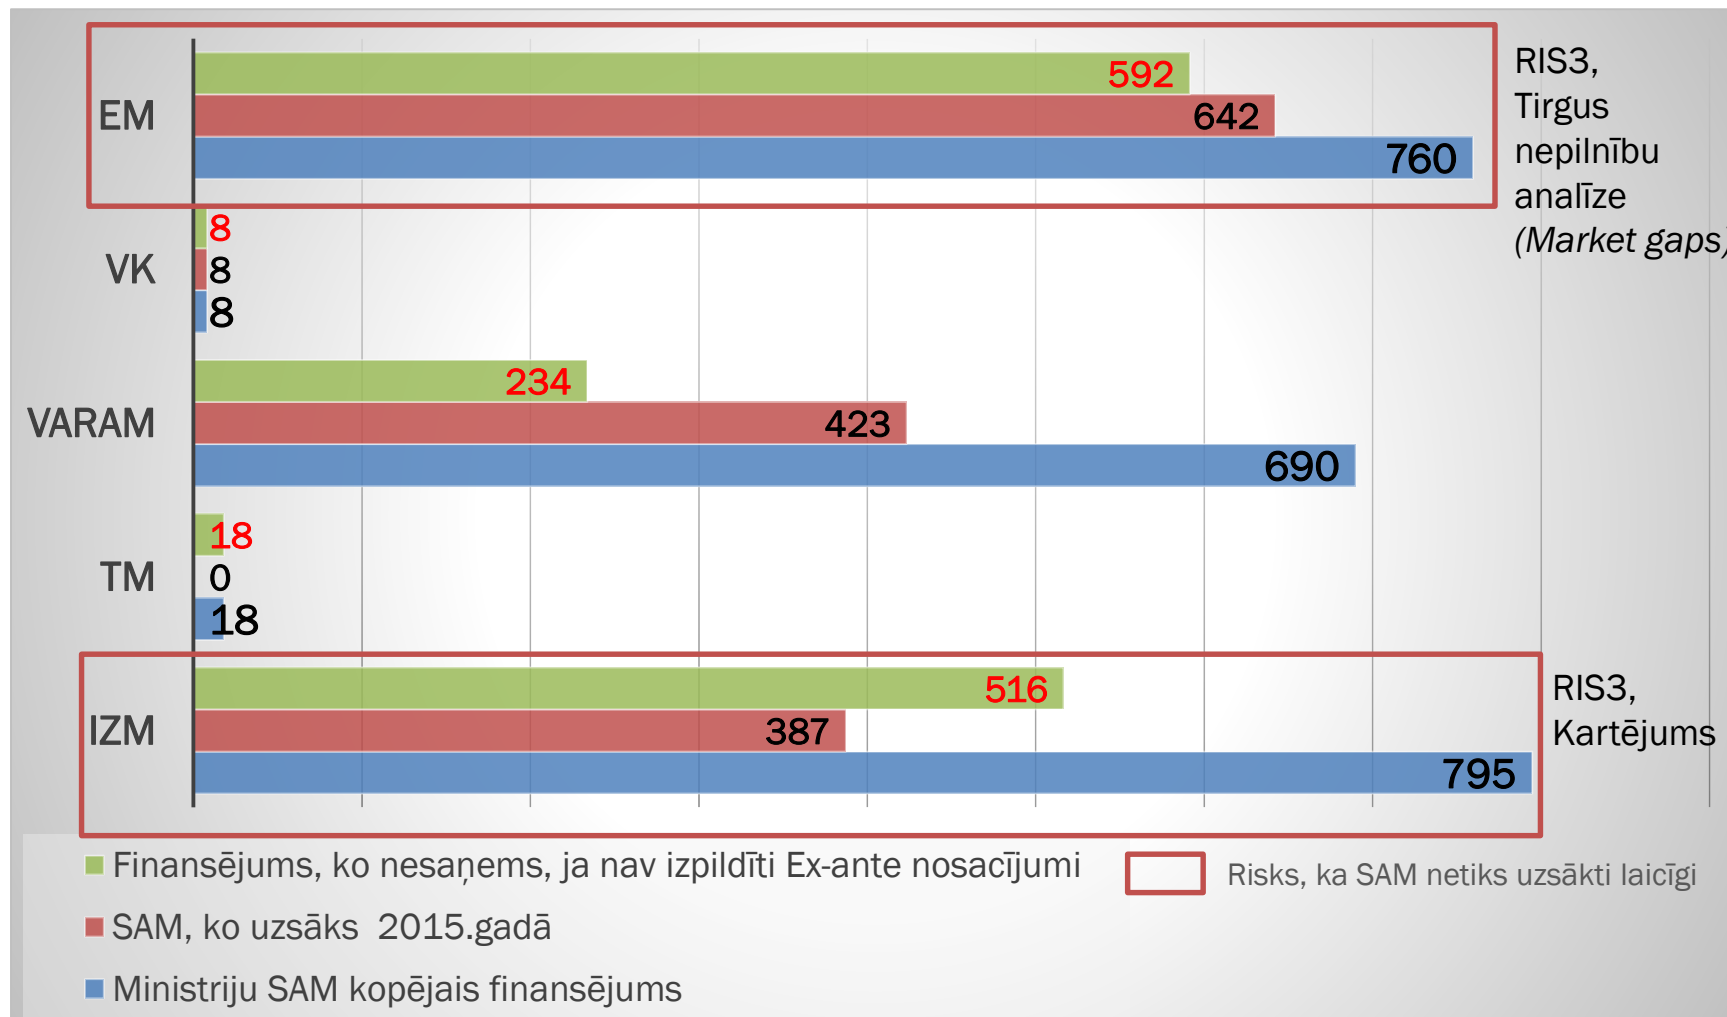



## Snieguma ietvara mērķi 2018.gadam mEUR

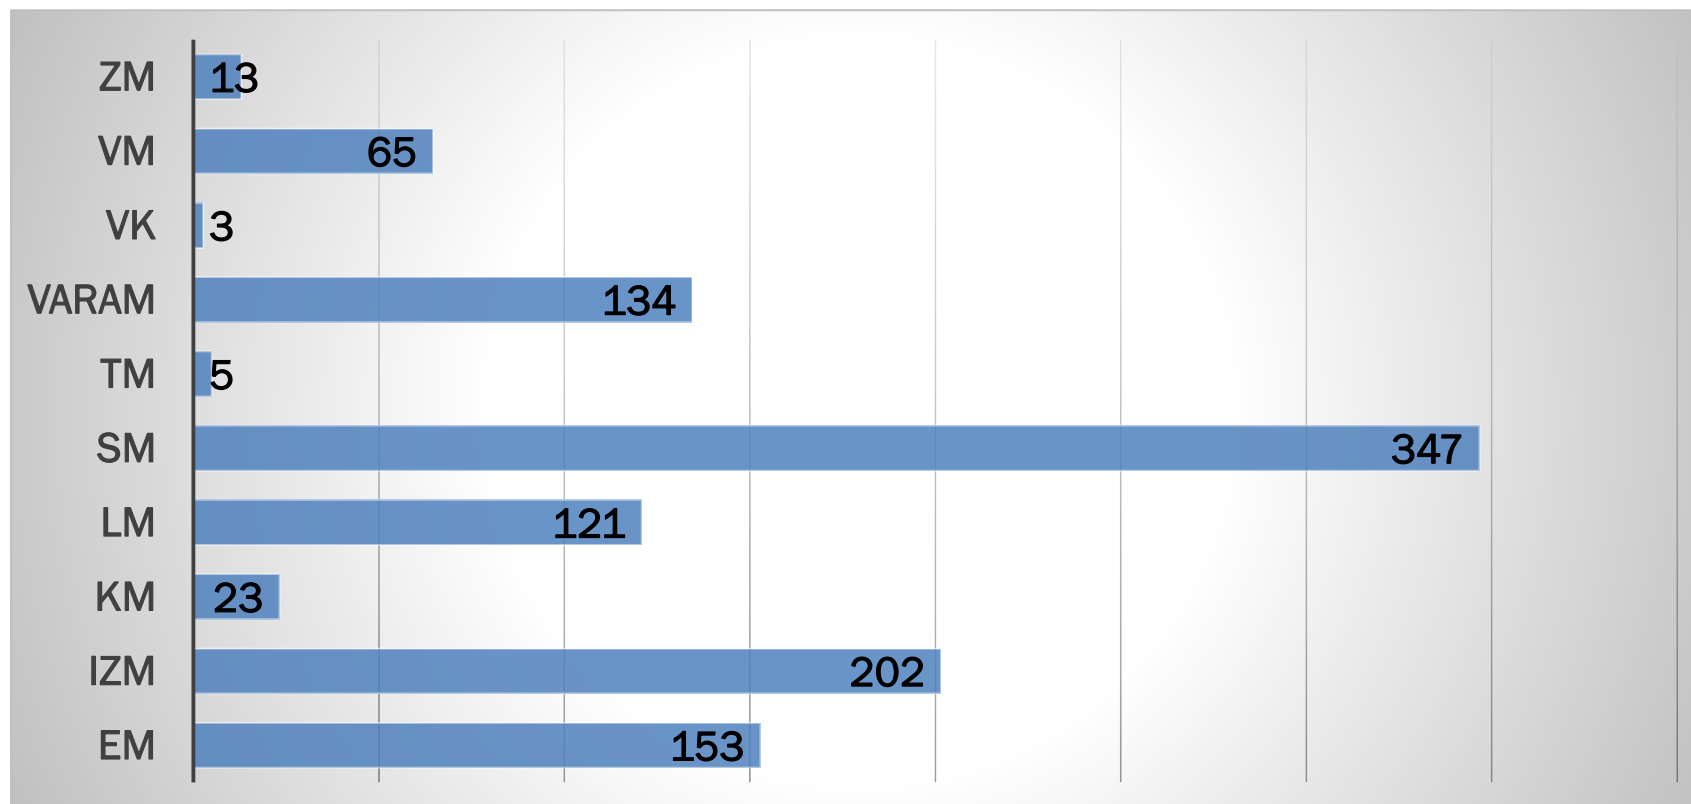

- 2017.gada kopējie N+3 mērķi (489 mEUR)
- Ja netiks sasniegti 85 % no 2018.gada snieguma ietvara mērķiem, EK var neizmaksāt 6% no SAM finansējuma rezerves (261 mEUR)





## SAM ieviešanas laika grafiks

- FM izstrādājis DP papildinājumu, t.sk. plānoto aktivitāšu uzsākšanas laika grafiku:  
<https://prezi.com/nmqndixgryof/darbibas-programmas-papildinajums/>
- Ministrijas 2015. gadam ir uzstādījušas ambiciozus mērķus (septembrī – decembrī plānots sagatavot 11 MKN un kritērijus no visiem 36 SAM, ko plānots uzsākt 2015.gadā.)
- Lai tos sasniegtu nepieciešams koordinēts un mērķtiecīgs ministriju darbs sākotnēji pie nozaru plānošanas dokumentu izstrādes un SAM sagatavošanas (*īpaši VARAM, EM, IZM, KM*).
- Svarīgi ir nodrošināt ES fondu atbildīgo iestāžu un nozaru politikas plānošanas kapacitātes stiprināšanu.





## Saturs

1. 2007-2013 periods: progress, riski un pasākumi
2. 2014–2020 perioda aktualitātes
  - Finanšu informācija
  - Priekšnosacījumi, riski un pasākumi
3. EEZ/Norvēģijas programmu statuss, riski, pasākumi
4. Protokollēmuma projekts



## EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu investīciju progress uz 31.12.2014., mEUR - **ievērojamas novirzes**

**Kopējā neizpilde – 59,8% (13,8 mEUR)**


**Lielākās neizpildes:**

**EM** – 4 mEUR («Zaļās» inovācijas)

**TM** – 3,3 mEUR (Latvijas korekcijas dienestu reforma)

**VARAM** – 2,7 mEUR (Klimata politika un kapacitātes stiprināšana);

**IZM** – 2,2 mEUR (Pētniecība un stipendijas)

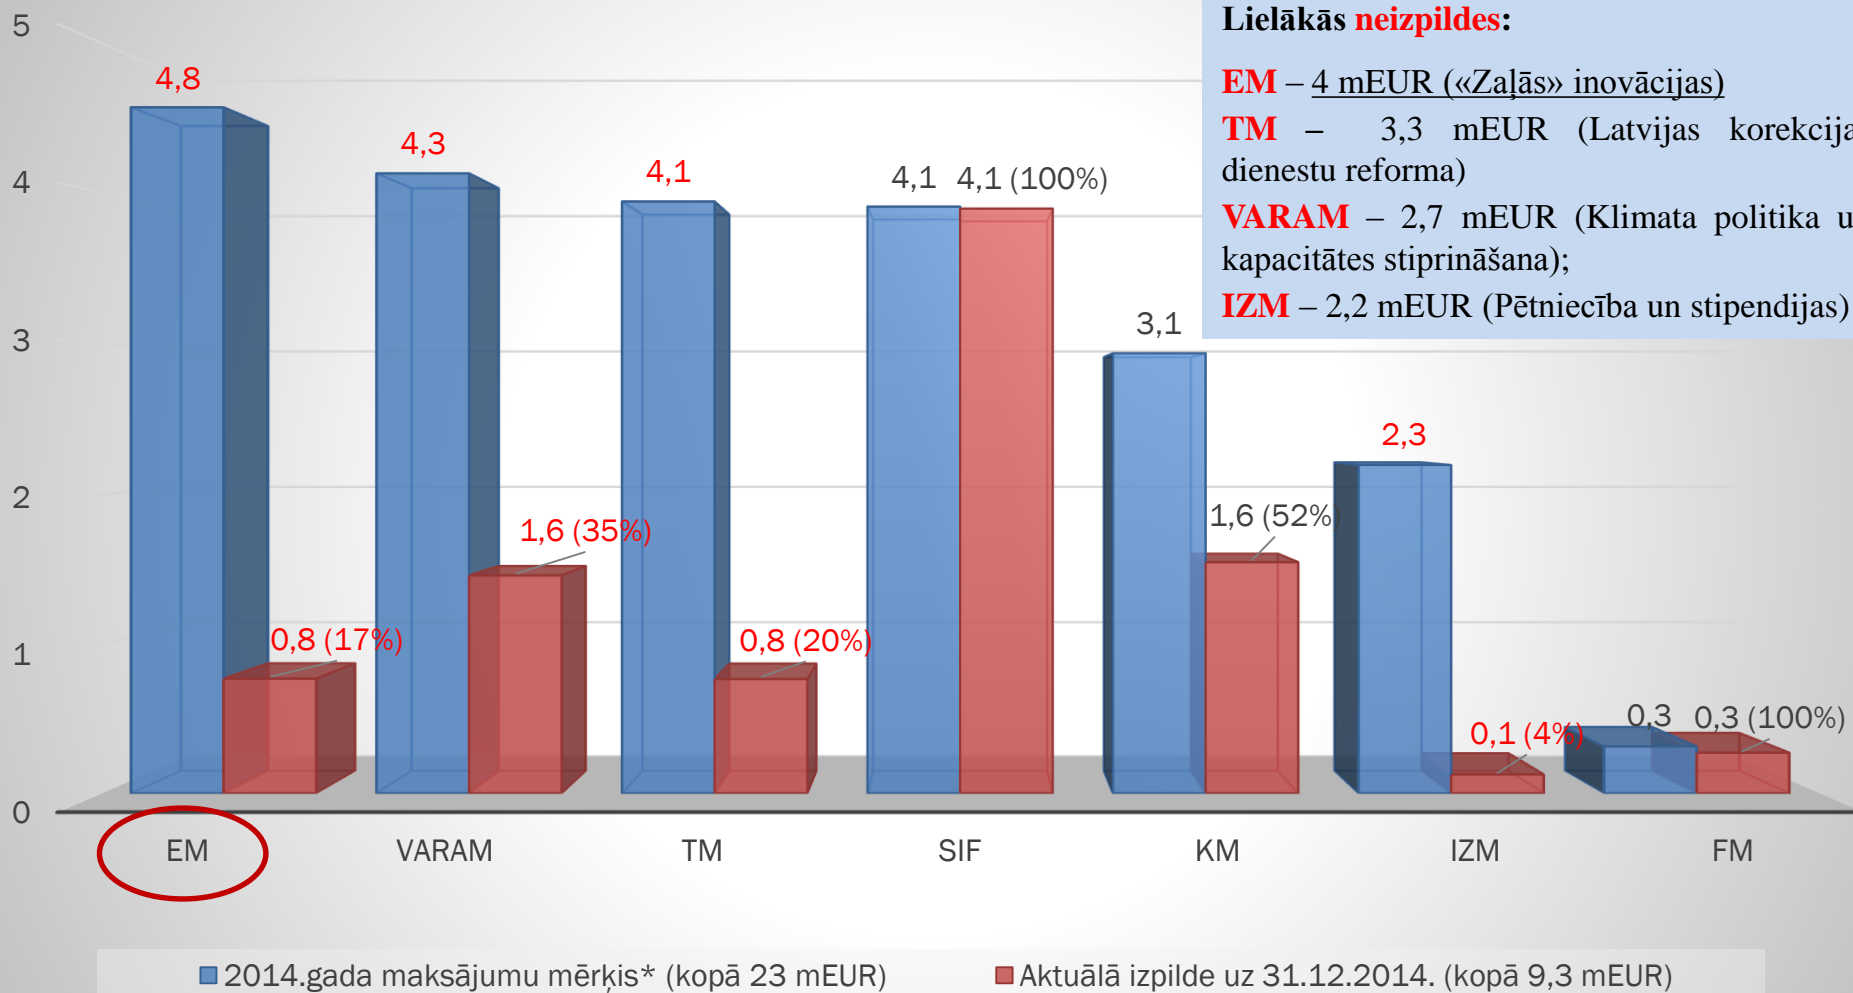


\* Saskaņā ar MK 11.03.2014. sēdes protokollēmuma Nr.16, 38.§, 12.punktu.



## EM programmas “Inovācijas zaļās ražošanas jomā” maksājumu pieprasījumu plāni, mEUR – **ievērojami jākāpina temps!**

**94%** - starpība starp 2012.g.  
un 2015.g. plāniem –  
negatīva plānu nobīde uz  
pēdējo gadu

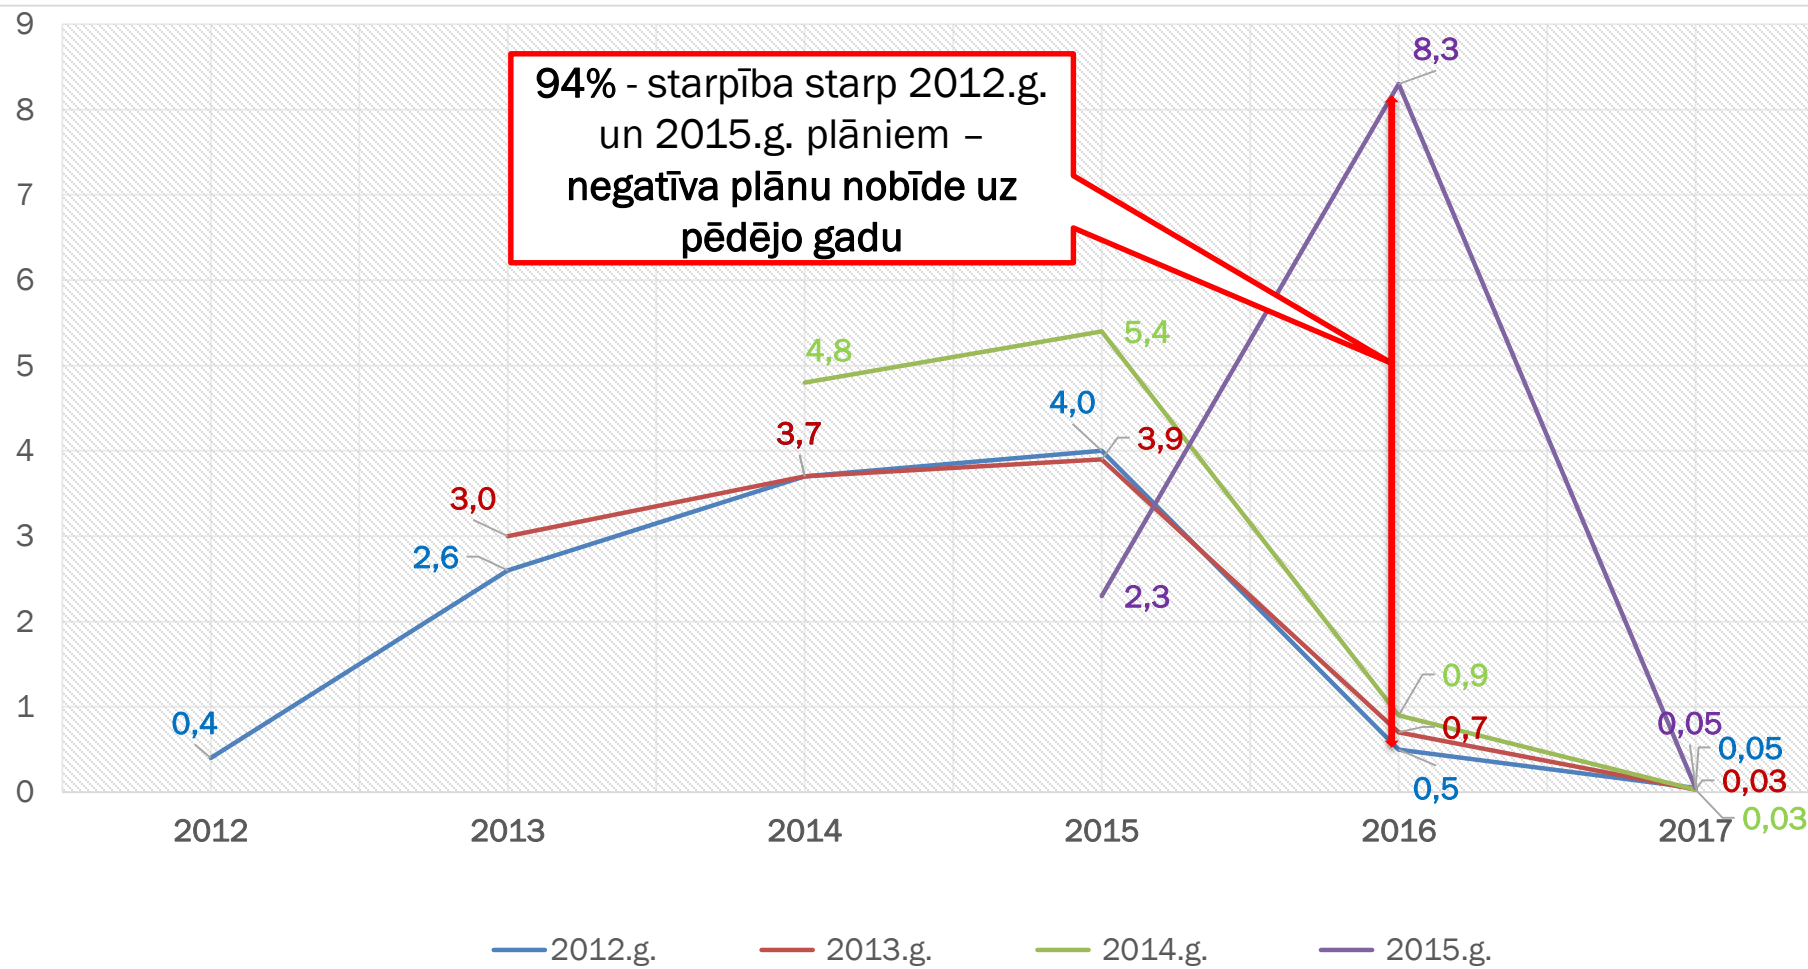



## Apdraudēta EM programmas “Inovācijas zaļās ražošanas jomā” 12,59 mEUR finansējuma efektīva izmantošana

### Risks, ka netiks pilnvērtīgi izmantots paredzētais atbalsts uzņēmējiem zaļo tehnoloģiju izstrādē un ieviešanā

- EM programmu īsteno jau 3,5 gadus un projektu īstenošanai ir **palicis tikai 1 gads un 1 mēnesis (30.04.2016.)** - termiņu nevar pagarināt:
  - noslēgti **tikai 4 līgumi** par 3,4mEUR (**29%**) no finansējuma (11,5 mEUR)
  - veiktie **maksājumi ir tikai 7%** - 0,86 mEUR
- **EM/LIAA ir ievērojami jāpaātrina darbs!**
- **Steidzami ir jānodrošina:**
  - projektu izvērtēšana, līgumu noslēgšana un avansu izmaksāšana
  - neliela apjoma grantu shēmas 3.kārtas izsludināšana
  - pasākumu plāns risku novēršanai



## Saturs

1. 2007-2013 periods: progress, riski un pasākumi
2. 2014–2020 perioda aktualitātes
  - Finanšu informācija
  - Priekšnosacījumi, riski un pasākumi
3. EEZ/Norvēģijas programmu statuss, riski, pasākumi
4. Protokollēmuma projekts



## Protokollēmuma projekts paredz:

- 1) Tā kā programmā “Uzņēmējdarbība un inovācijas” ERAF zaudēšanas riski novērsti – atcelta elastība finansējuma izmantošanai, sākot ar 2015.gada 31.martu
- 2) Ar mērķi sekmīgi nodrošināt 24.lkgadējās **augsta līmeņa ES fondu auditoru sanākumi** Latvijā atļaut FM uzņemties saistības (73 897 euro) Latvijas kā uzņemošās valsts organizēšanas izdevumiem
- 3) **Neatbilstību fiksēšana:** tā kā īstenotāji ir valsts iestādes, tie ir valsts budžeta izdevumi:
  - a) Izglītības un zinātnes ministrijas projektā “Portāla [www.skolas.lv](http://www.skolas.lv) attīstība (2.kārta)”: 100% EK nedeklarējami **3 328 795,16 euro** - nefunkcionāls projekts
  - b) Kultūras informācijas sistēmas centra projektā „Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga pilnveidošana” 2. kārta”: 25% EK nedeklarējami **374 798,32 euro** – nav īstenotāja vaina – stingrāka EK interpretācija par iepirkumu pārkāpumiem
- 4) Apstiprināt precizētos maksājumu mērķus 2015.g. 2007–2013. perioda ES fondu ietvaros
- 5) Uzskatīt par izpildītu Latvijas interešu aizstāvēšanu pirms-uzklausišanas procedūrā par EK ierosinātajām finanšu korekcijām 2004.-2006.gada perioda Kohēzijas fonda projektos, ņemot vērā, ka panākts kopējais korekcijas samazinājums par 33%





# Paldies!

Vairāk informācijas:

[www.esfondi.lv](http://www.esfondi.lv)

[www.fm.gov.lv](http://www.fm.gov.lv)

[esfondi@fm.gov.lv](mailto:esfondi@fm.gov.lv)

The screenshot shows the homepage of the website for EU Funds in Latvia. At the top, there is a navigation bar with links for 'Managing Authority', 'Contacts', 'Logotypes', 'Publications', 'Links', 'Disclaimer', and 'Twitter'. Below this is a header section with logos for ESF (EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS), ERAF (EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS), and KF (KOHĒZIJAS FONDS). To the right of the logos is a banner with the text 'INVESTING IN YOUR FUTURE!' and three small images. Below the header is a 'News' section with a list of updates, including dates and brief descriptions of events like 'Open Days of European Union Fund Projects in Latvia' and 'The EC transfers to the Latvian budget all resources of terminated EU fund payments'. On the right side, there are four green boxes for 'For media' (Video, audio, photo), 'Publicity measures', 'Financial progress', and 'EU Funds projects'. At the bottom of the screenshot, there is a search bar and some statistics: 'Visits today: 300', 'Since 20-03-2009: 705386', and 'Last update: 11-10-2012'.







## Sasniegtie rezultāti 2007-2013.gada plānošanas periodā

Bez ES fondu ieguldījuma 2014.gadā būtu:

- IKP izaugsme būtu par 1,1 procentpunktu **zemāka**
- **privātā patēriņa** izaugsmes temps - par 1,8 procentpunktiem **zemāks**
- nodarbinātības pieauguma temps - par 0,3 procentpunktiem **zemāks**



1 059 ekonomiski  
aktīvi uzņēmumi  
gūst atbalstu  
biznesa  
inkubatoros




200 041  
bezdarbnieki  
iesaistīti sabiedrībai  
derīgos darbos



līdz 5 000 jaunas  
darba vietas




21 832 pedagogi  
pilnveidojuši  
savu kompetenci  
un kvalifikāciju



Rekonstruēti 784,7  
km autoceļu un ielu,  
uzbūvēti 52 km  
dzelzceļa




## 2007.-2013.gada plānošanas perioda KP finansējuma sadalījums pa nozarēm (mEUR; %)

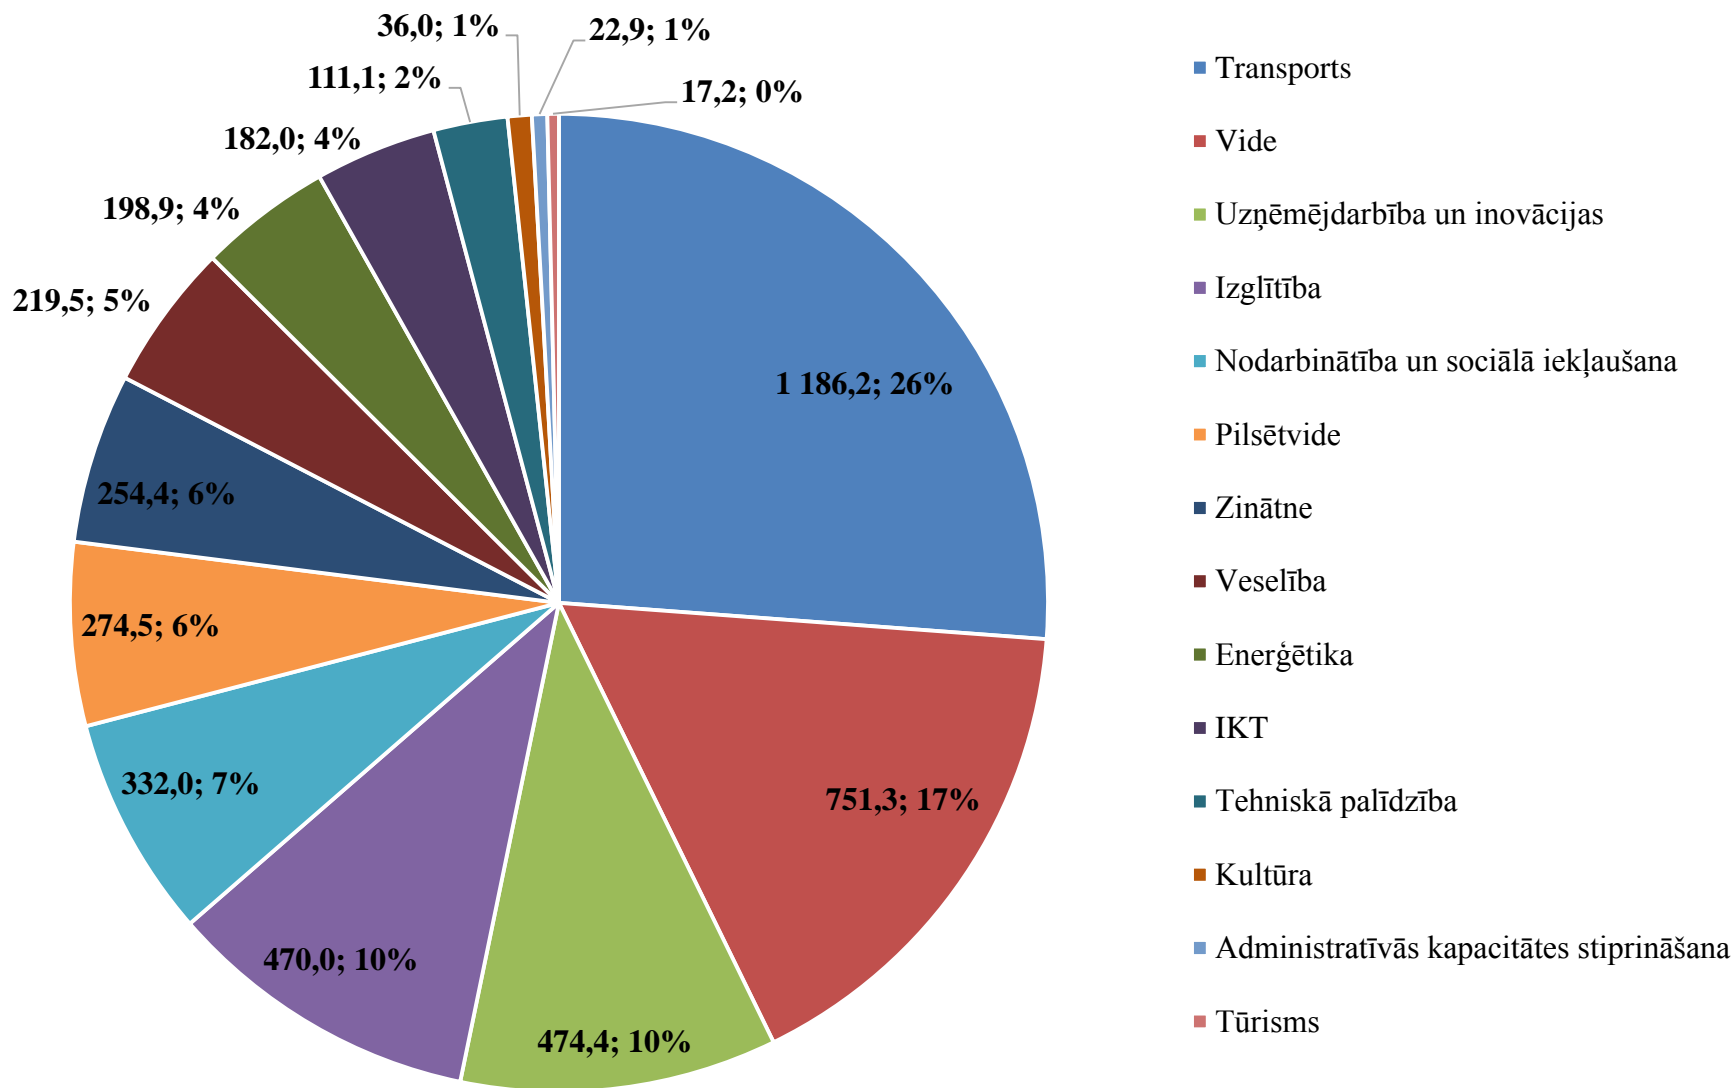



# Projektu līgumi NOZARĒS – 104,7%

ES fondi, uz 31.01.2015, mEUR, % pret kopējo

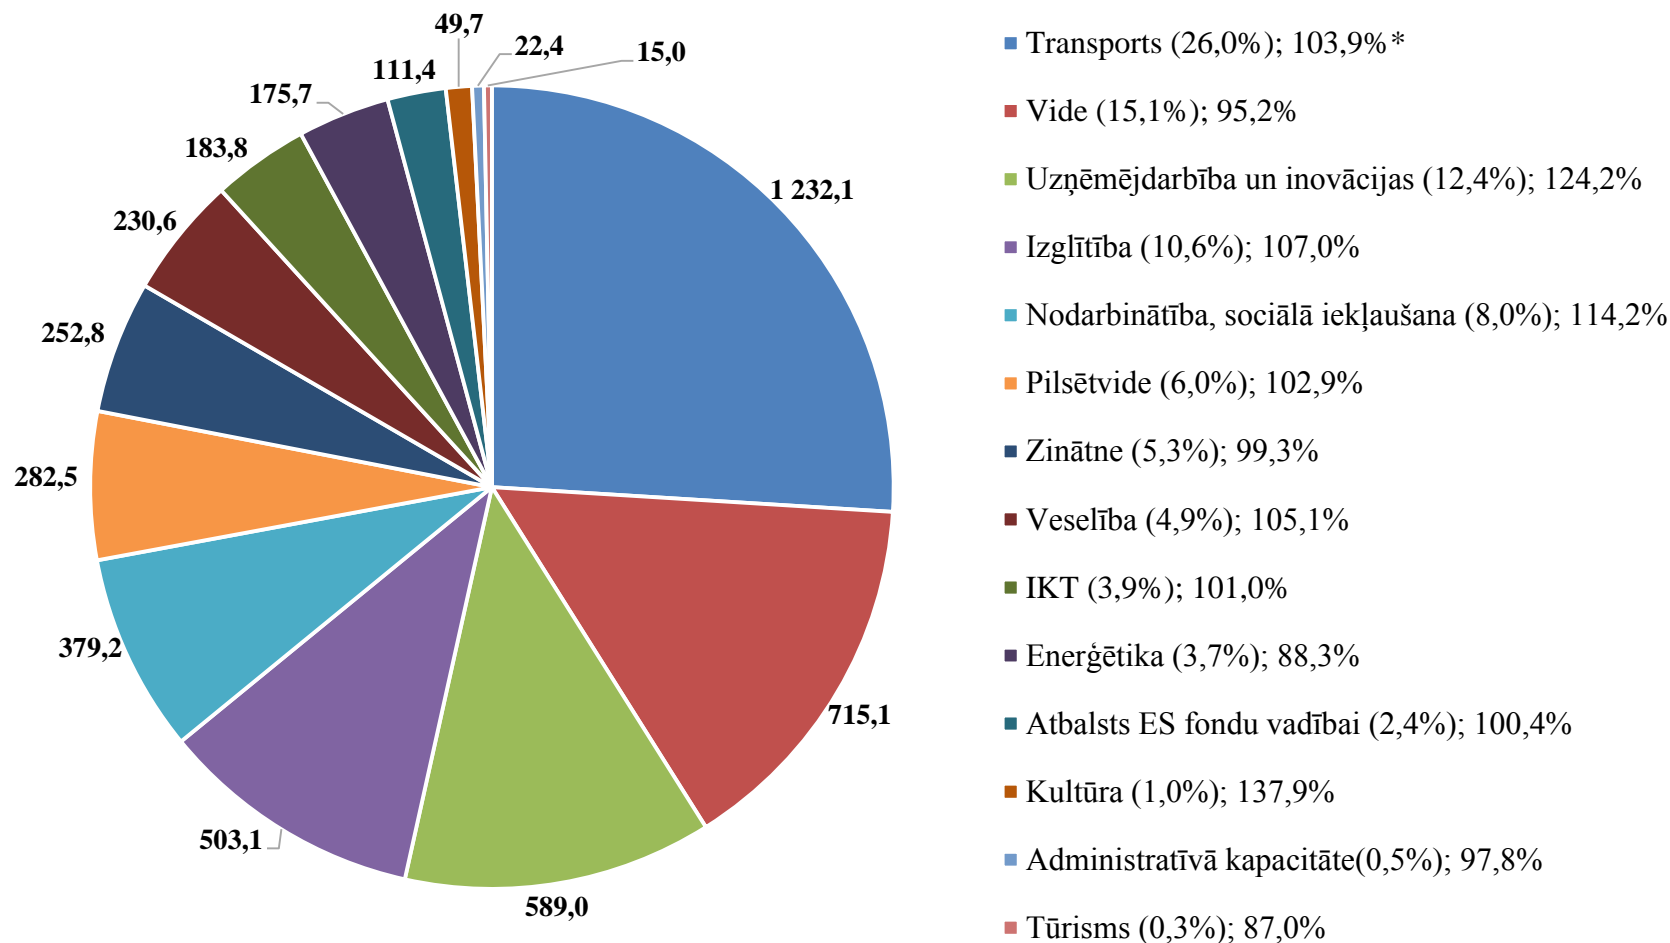


Projektu līgumu apjoms kopā uz 31.01.2015 – 4 742,2 mEUR

\* - noslēgtie līgumi % pret pieejamo ES fondu finansējumu nozarē




## Maksājumu mērķu izpilde 2014.gadā, mEUR, % pret gada mērķi

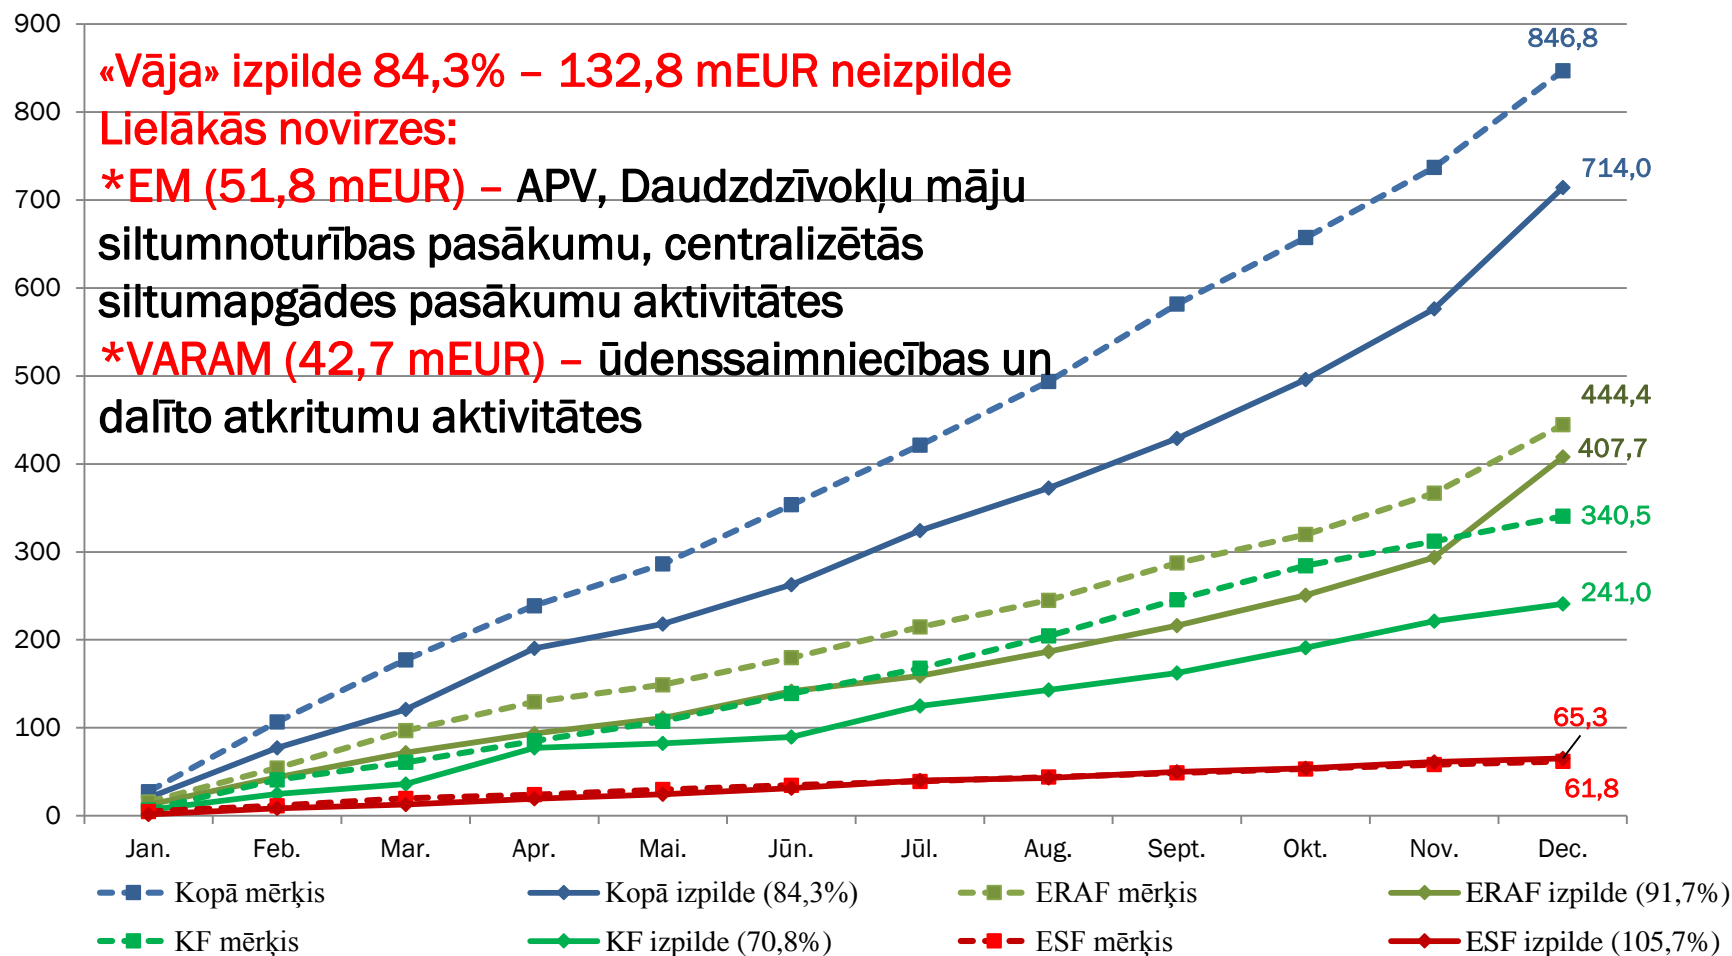




## Maksājumu mērķu izpilde ministrijās 2014.gadā, mEUR, % pret gada mērķi

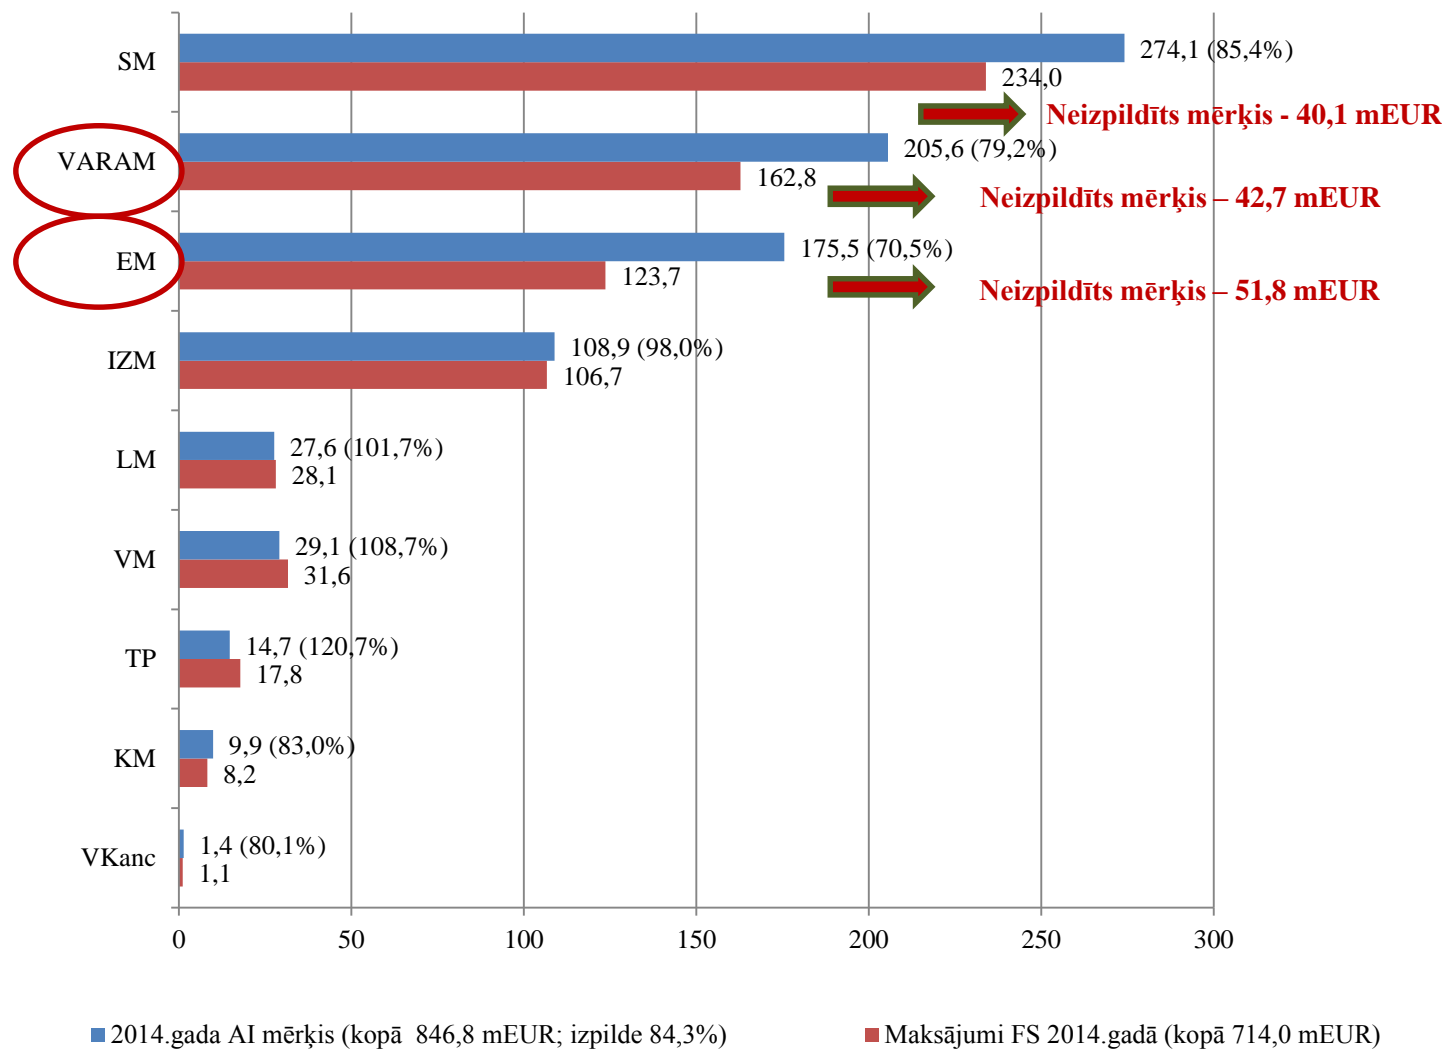




## Ministriju budžeta plānošanas kļūdas: prognožu izpilde 2014.gadā abos periodos, mEUR

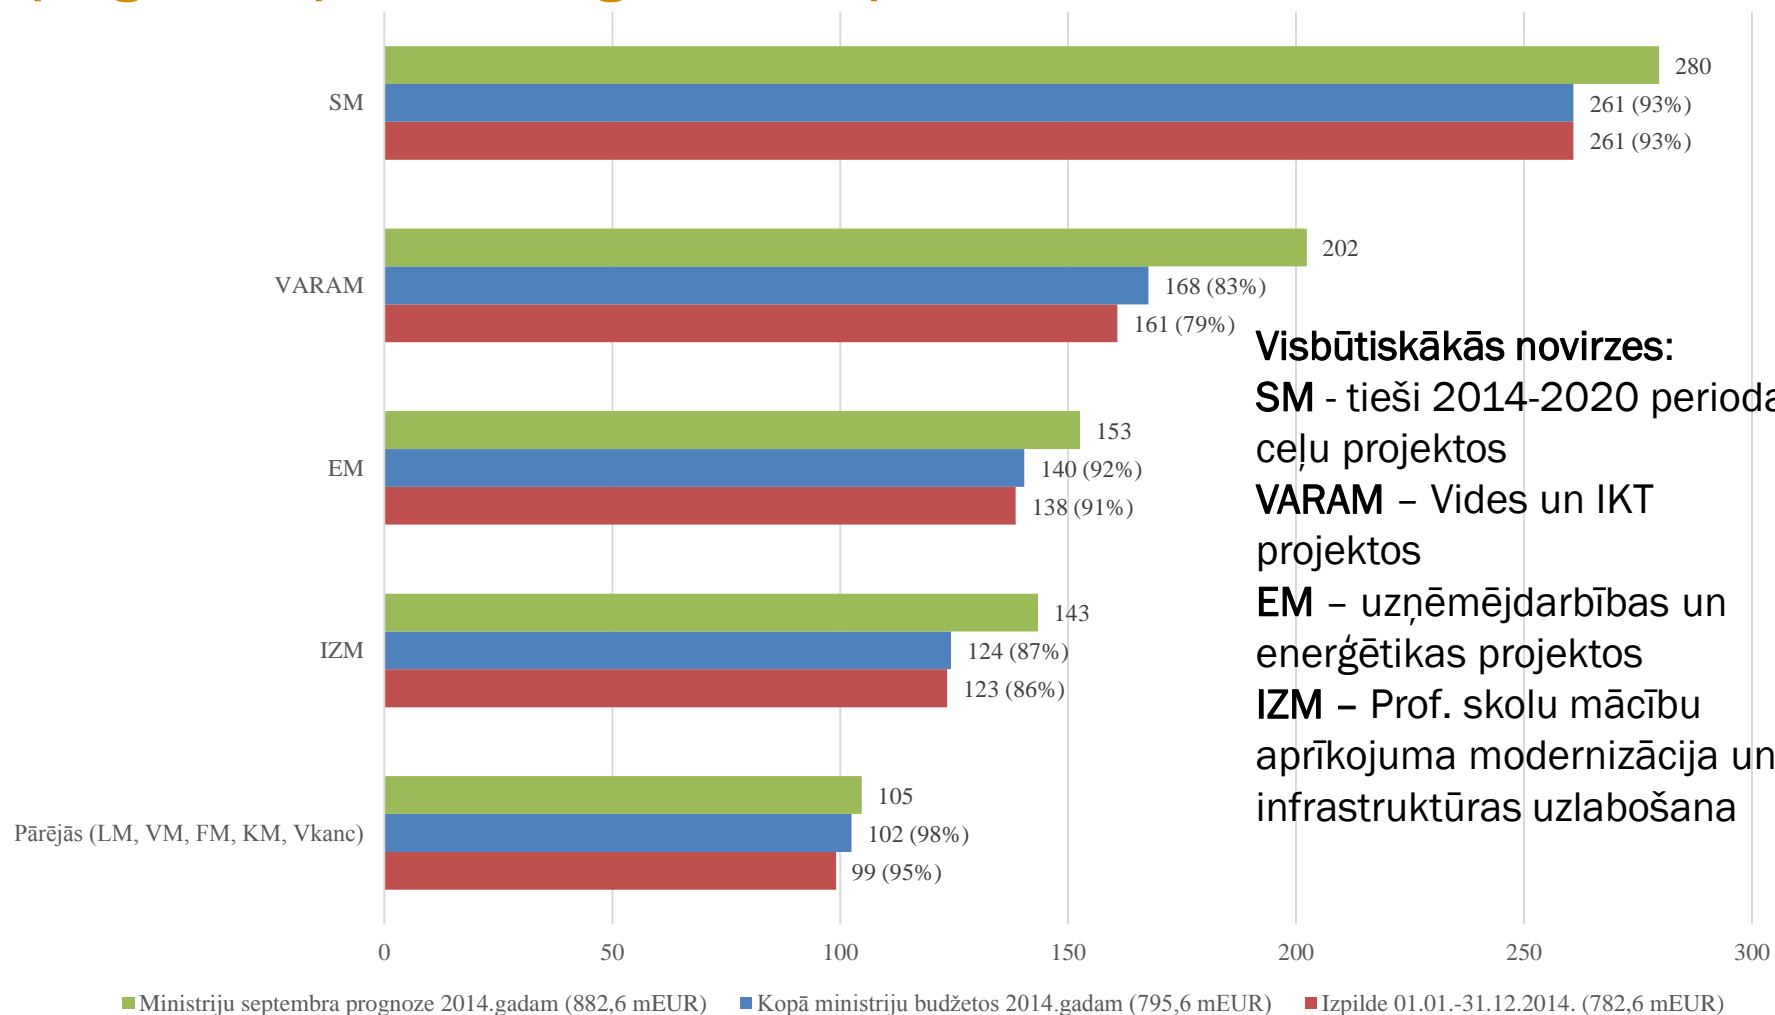




## Negatīvā pieredze - RISKU ESKALĀCIJA: Ekonomikas ministrijas maksājumu plāni, mEUR

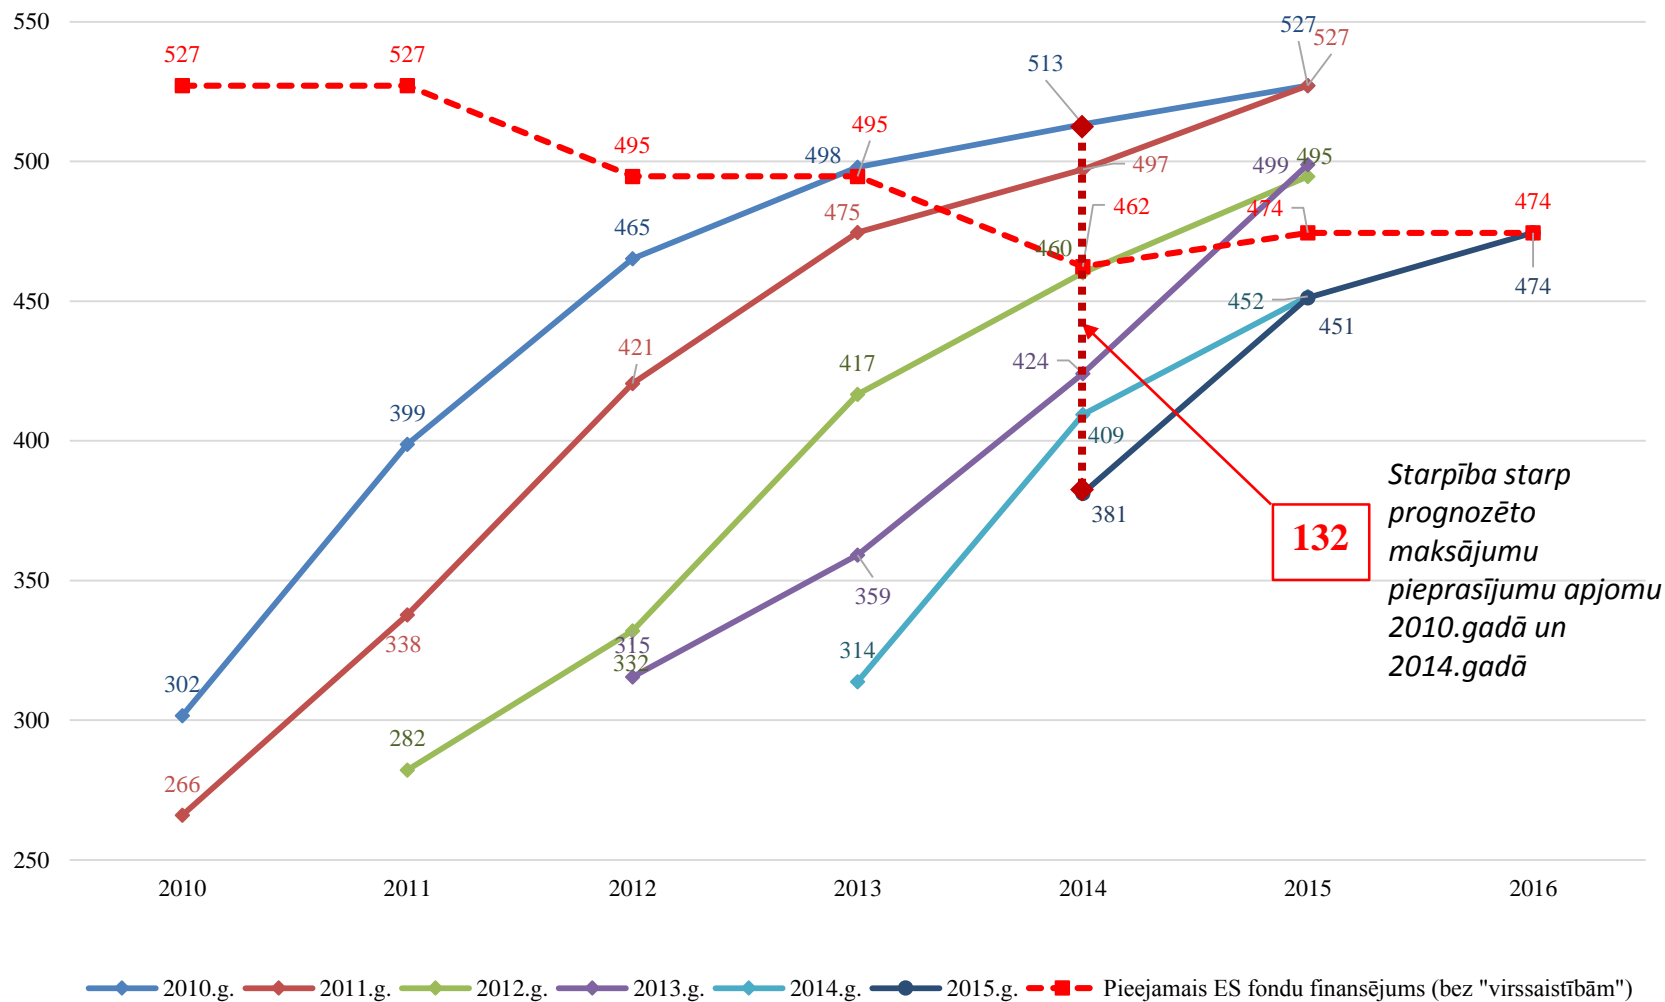



## Negatīvā pieredze - RISKU ESKALĀCIJA: Izglītības un zinātnes ministrijas maksājumu plāni, mEUR

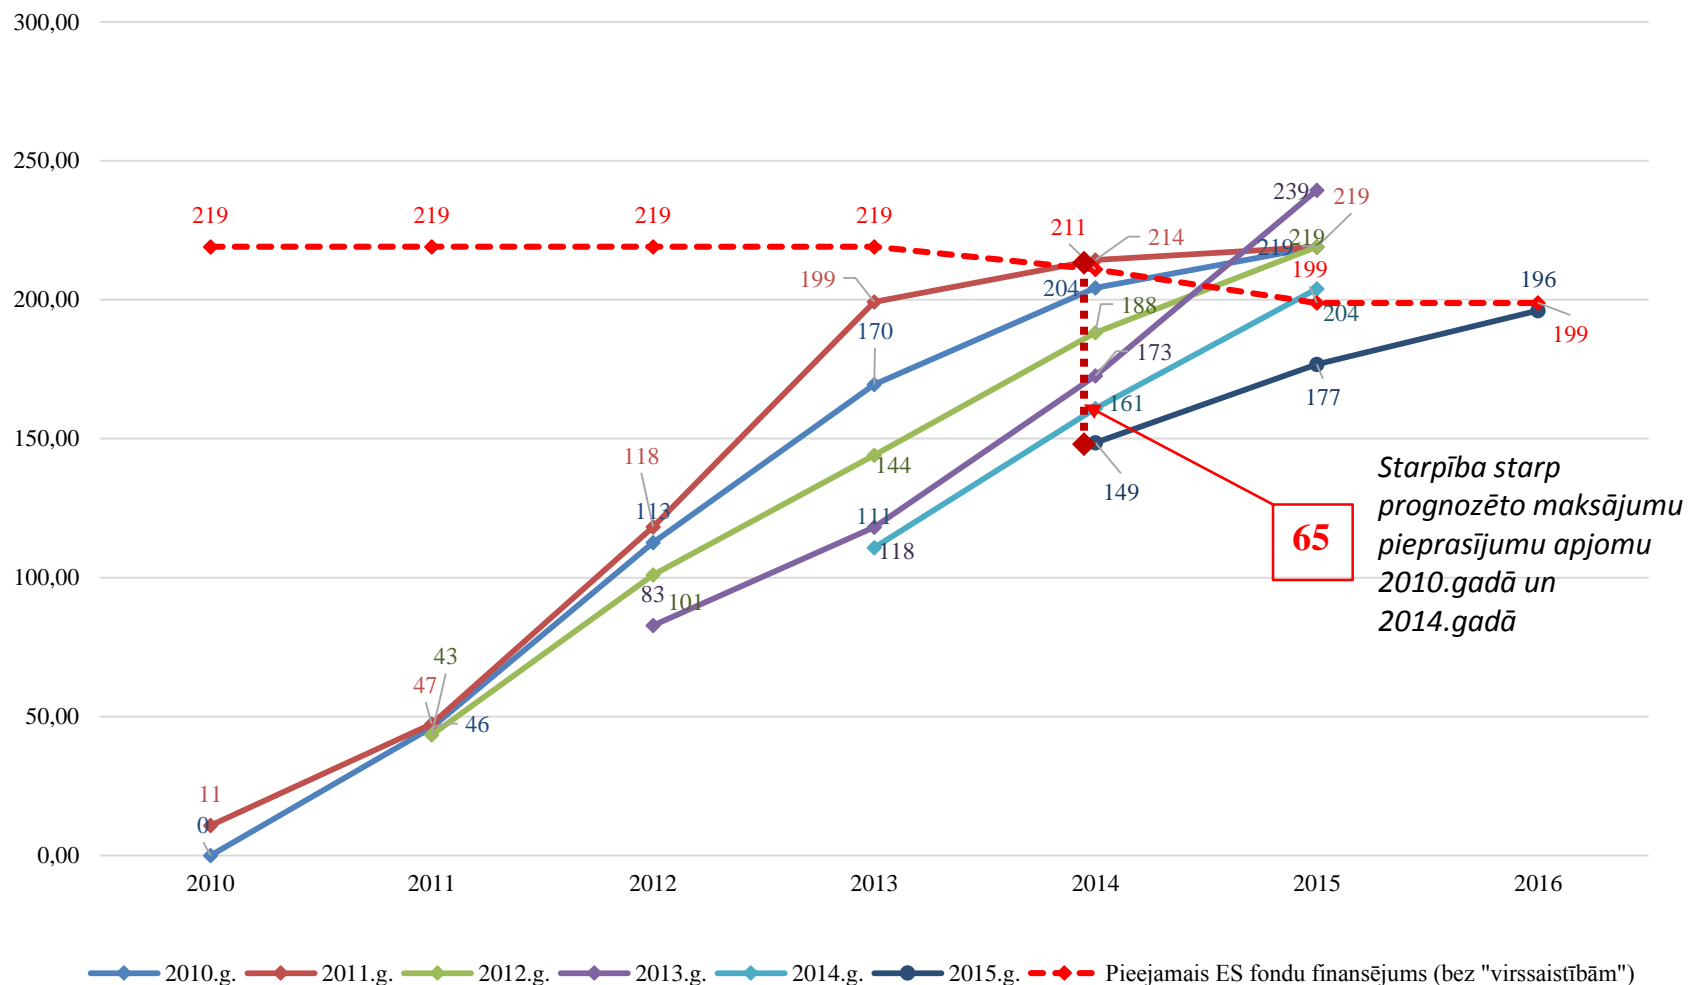






## 2007-2013 perioda ERAF programma «Infrastruktūra un pakalpojumi» deklarējamie EK izdevumi un prognozes, mEUR

Pašlaik nav risks ERAF finansējuma pilnīgai izmantošanai

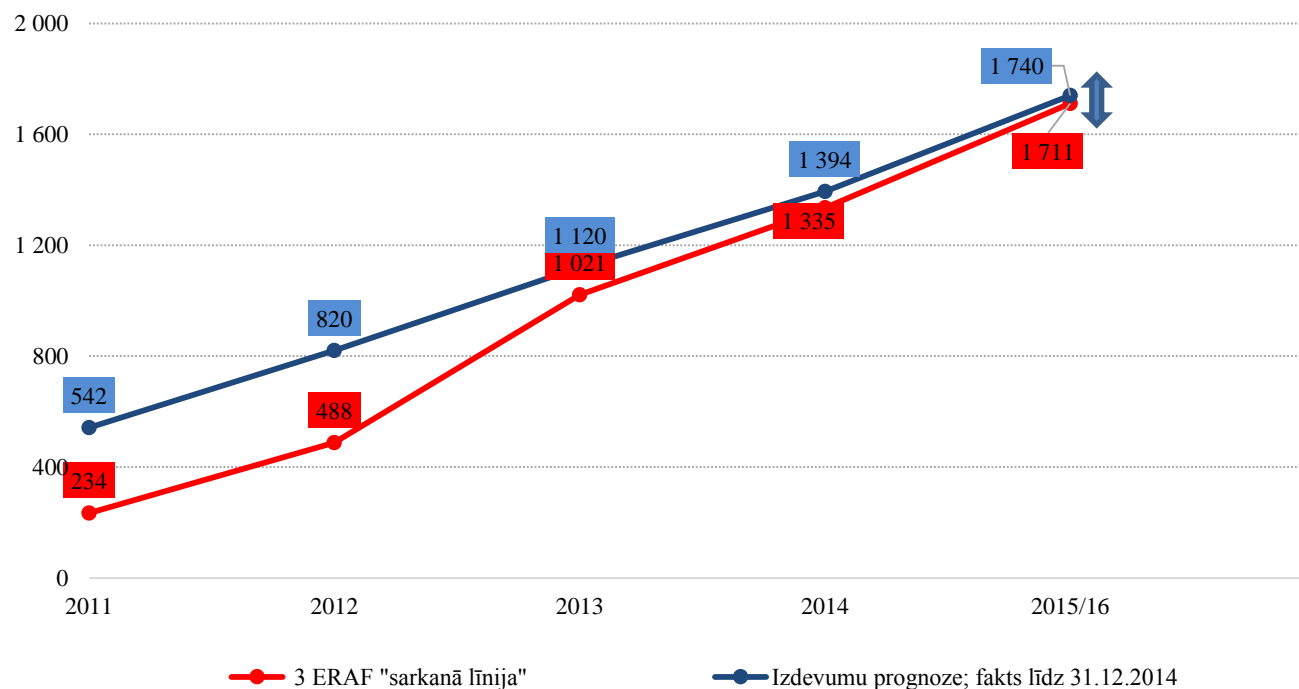


Perioda beigās, ievērtējot zināmos riskus, uz «virssaistību» rēķina veidojas apm. **28 mEUR rezerve** – pārsniegts max ERAF piešķirums no EK  
+ ir papildus «drošības spilvens», deklarējot EK pēc augstākām prioritāšu likmēm, lai kompensētu šobrīd neparedzamus, «neievērtētus riskus»



## 2007-2013 perioda Kohēzijas fonda (KF) deklarējamie EK izdevumi un prognozes, mEUR

Saglabājas minimāls risks KF finansējuma pilnīgai izmantošanai – ir zināmi riskus kompensējošie pasākumi – sekojošā slaidā

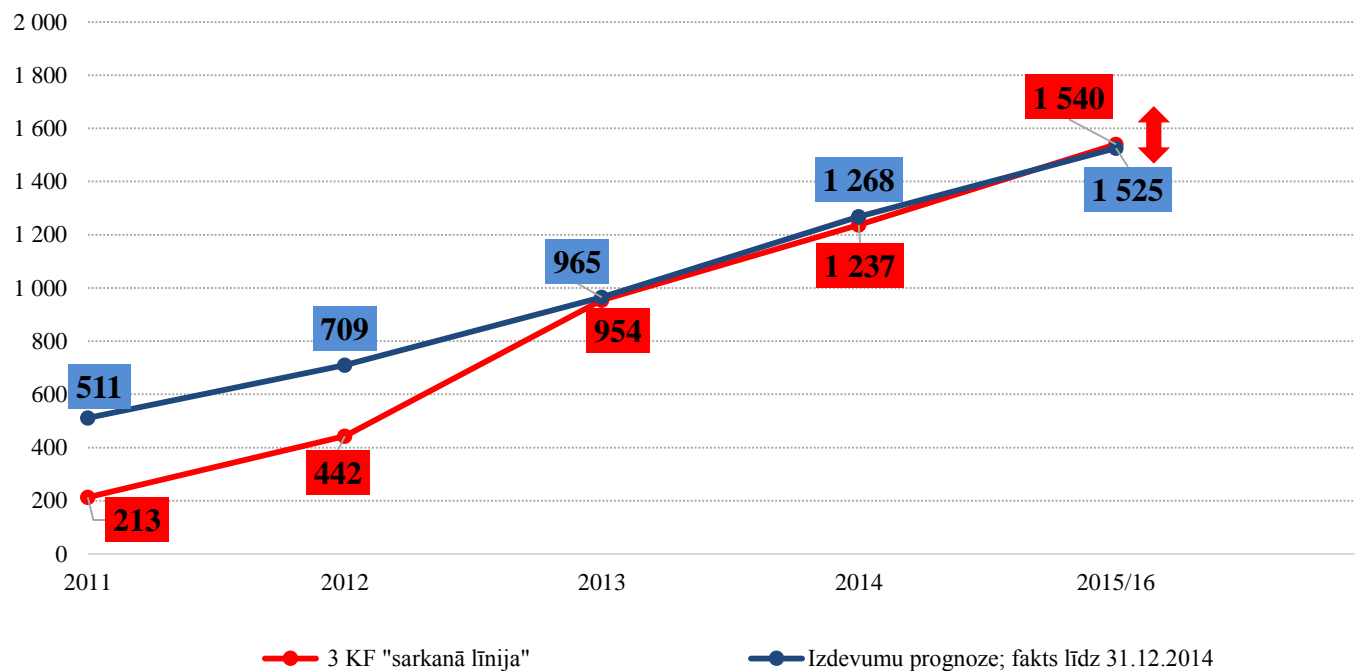


Ņemot vērā prognozes par lauzto līgumu un neatbilstību apjomu **perioda beigās «zem aploksnēs» iespējami 14,4, mEUR**

**+ ir papildus «drošības spilvens», deklarējot EK pēc augstākām prioritāšu likmēm, lai kompensētu šobrīd neparedzamus, «neievērtētus riskus»**



## 2.1. ES fondu budžeta izdevumu plānu negatīvas novirzes turpinās arī 2014-2020 periodā - riski, mEUR

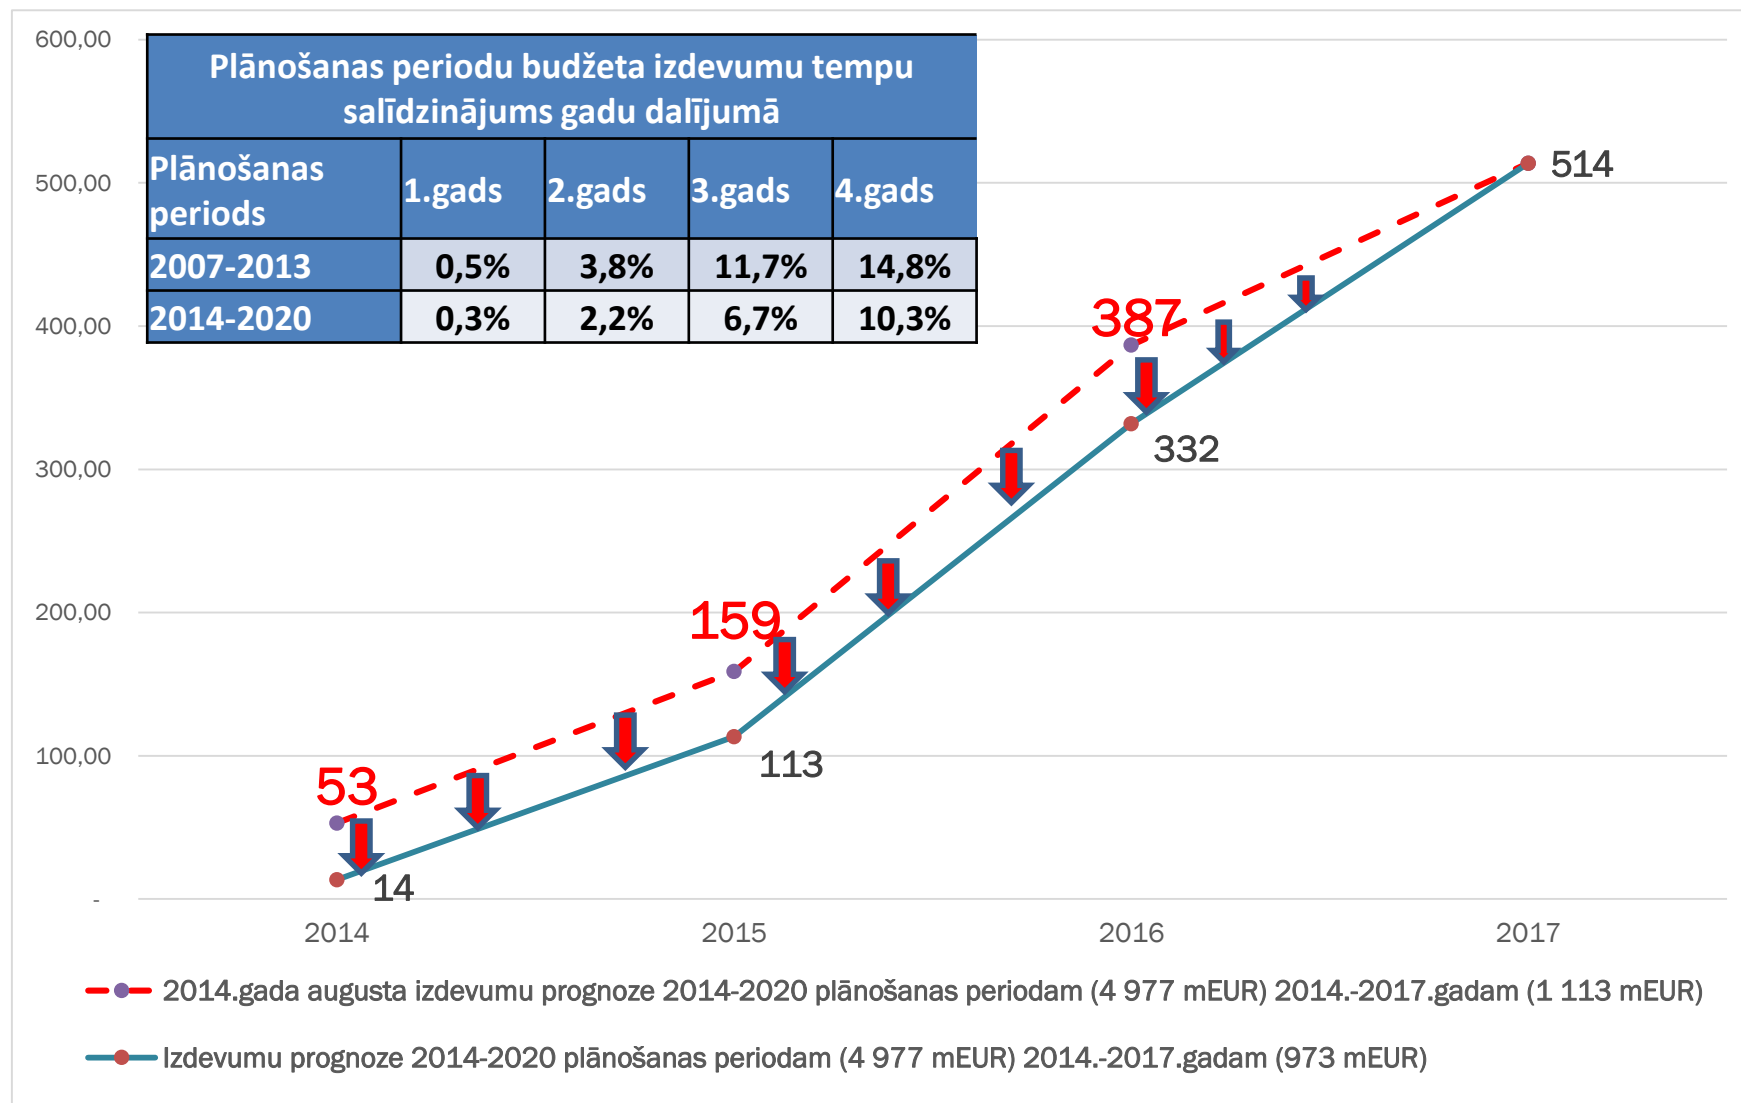




## 2014-2020 perioda ES fondu maksājumu pieprasījumu

# EK PROJEKCIJA - RISKI, JA SAGLABĀJAS TENDENCES

KĀ 2007-2013 PERIODĀ, mEUR

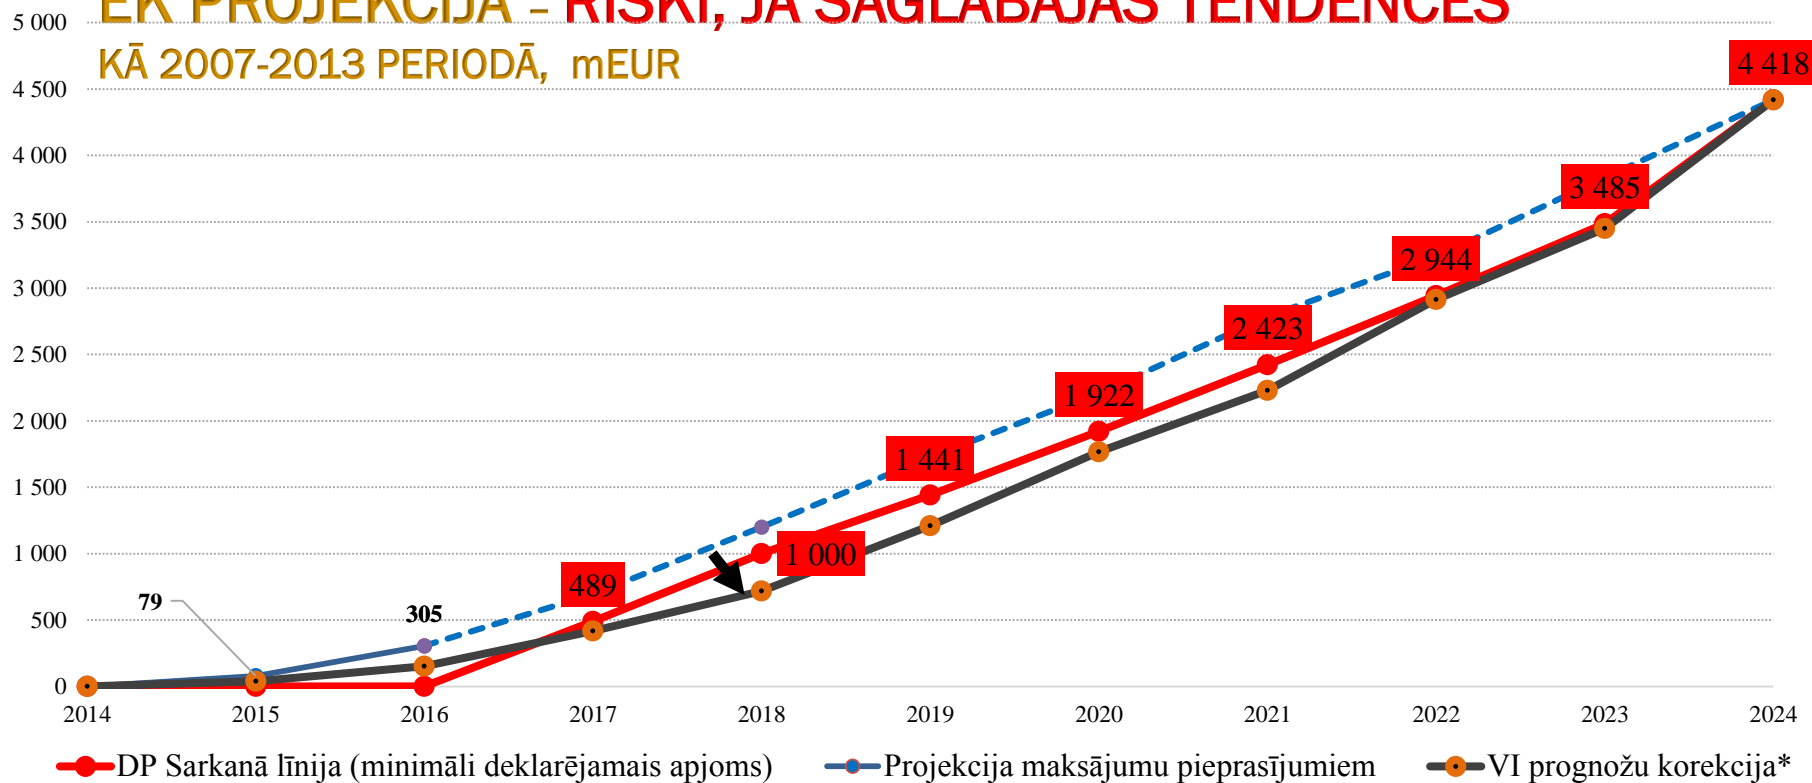

\* Ņemot vērā 2007-2013 perioda maksājumu pieprasījumu prognožu izpildes gaitu (50-70% plānu izpildes novirzes), tendencēm saglabājoties, 2014-2020 periodā jau var paredzēt ievērojamu **ES finansējuma zaudējuma risku 2017-2018.g. !!!**

**SECINĀJUMS: NAV PIEĻAUJAMI KAVĒJUMI NEPIECIEŠAMO LĒMUMU PIENĒMŠANĀ UN ATBILSTOŠĀ IZPILDĒ; JĀPAĀTRINA TEMPS, LAI VARĒTU REĀLI IEVIEST PROJEKTUS !**



## Progress SAM ieviešanas uzsākšanā – UK apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (I)

- 5.1.1.SAM “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” pirmās projektu iesniegumu atlasēs kārtas “Pasākumi augsta plūdu riska novēršanai” īstenošanai (VARAM);
- 6.1.3.SAM “Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu” 6.1.3.1.pasākuma “Salu tilta kompleksa rekonstrukcija un Raņķa dambja un Vienības gatves, Mūkusalas ielas savienojuma izbūve” īstenošanai (SM);
- 6.1.5.SAM “Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana” īstenošanai (SM);
- 6.3.1.SAM “Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti” īstenošanai (SM);



## Progress SAM ieviešanas uzsākšanā – UK apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji (II)

- 7.1.1.SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” īstenošanai (LM);
- 7.1.2.SAM “Izveidot darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošināt tās sasaisti ar nodarbinātības barometru” 7.1.2.1.pasākuma “EURES tīkla darbības nodrošināšana” īstenošanai (LM);
- 7.2.1.SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.1.pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” īstenošanai (LM);
- 7.2.1.SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 7.2.1.2.pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanai (LM);



## Progress SAM ieviešanas uzsākšanā – UK apstiprinātie projektu atlases kritēriji (III)

- 8.3.3.SAM “Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanai (IZM);
- 9.1.1.SAM “Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.1.pasākumam “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgā situācijā esošiem bezdarbniekiem” īstenošanai (LM);
- 9.2.1.SAM “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām” 9.2.1.1.pasākumam “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (LM);
- 9.2.3.SAM “Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” īstenošanai (VM).





## 07.01.2015. KDG lēmumi par ex-ante nosacījumiem (II)

Iestāde	Uzdevums	Statuss
VKanc	Informatīvais ziņojums Valsts pārvaldes cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanai, nolūkā mazināt administratīvo slogu uzņēmējdarbības videi, kā arī veicināt korupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanu laika periodā no 2014.-2020.gadam, <b>30.01.2015.</b>	Informatīvais ziņojums <b>apstiprināts ar MK 27.01.2015.</b> rīkojumu.
TM	TM - Tiesu varas un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanas un kompetenču attīstības plānu 2014.-2020.gadam, <b>30.01.2015.</b>	Attīstības plāns <b>apstiprināts ar MK 03.03.2015.</b> rīkojumu.





## 07.01.2015. KDG lēmumi par ex-ante nosacījumiem (I)

Iestāde	Uzdevums	Statuss
IZM	Rīcības plāns Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam ieviešanai, ar analīzi par optimālāko mūžizglītības atbalsta ieviešanas mehānismu, kā arī karjeras pasākumu ieviešanas aprakstu. <b>27.02.2015.</b>	Nav saņemts rīcības plāns jeb cits politikas plānošanas dokuments, kas paredz analīzi par optimālāko mūžizglītības atbalsta ieviešanas mehānismu, kā arī karjeras pasākumu ieviešanas aprakstu.
IZM sadarbībā ar EM	Informatīvs grafiks un skaidrojums (ceļa karte), kā plānots izpildīt 1.1.ex-ante nosacījumu – <b>13.02.2015.</b>	16.03.2015. plānota tikšanās ar Eiropas Komisiju.
TM	Informatīvais ziņojums par pasākumu plānu notiesāto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas laika periodam no 2014.–2020.gadam – <b>01.02.2015.</b>	Sarunās ar TM ir saņemts priekšlikums informatīvā ziņojuma vietā izstrādāt pamatnostādnes un plānu. Tādējādi izpildot ex-ante nosacījumu Partnerības līgumā noteiktajā termiņā – līdz 01.06.2015. Attiecīgi KDG noteiktais termiņš nav aktuāls.
KNAB sadarbībā ar VKanc	Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, <b>30.01.2015.</b>	Saņemts priekšlikums no KNAB un Vkcanc pamatnostādnes iesniegt izskatīšana VSS 26.03.2015.



## Progress SAM ieviešanas uzsākšanā – MK noteikumu izstrāde

Specifiskais atbalsta mērķis	Statuss
5.1.1. SAM "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (VARAM)	Apstiprināts MK – 10.02.2015.
7.1.1.SAM "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" (LM)	Apstiprināts MK – 23.12.2014.
8.3.3. SAM "Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā "	Izsludināts VSS – 22.01.2015.
9.1.1.SAM "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" pasākums "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" (LM)	Apstiprināts MK – 23.12.2014.
9.1.1.SAM "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākums "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi" (LM)	Izsludināts VSS – 05.02.2015.
9.2.1.SAM "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.1.pasākums "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (LM)	Izsludināts VSS – 27.11.2014.
9.2.2.SAM "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitutionalizācija" īstenošanu (LM)	Izsludināts VSS – 30.10.2014.
9.2.3.SAM "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" (VM)	Apstiprināts MK – 28.10.2014.




## Progress SAM ieviešanas uzsākšanā

Specifiskais atbalsta mērķis	Statuss
6.1.3.SAM «Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu» (SM)	Atlase plānota 2015.gada beigās. 2014.gada jūlijā uzsākta 1.kārtas projekta «Salu tilta kompleksa rekonstrukcija» īstenošana.
6.1.5.SAM «Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana» (SM)	Atlase plānota 2015.gada beigās. Projektu īstenošana uzsākta pēc pagaidu regulējuma apstiprināšanas 2014.gada aprīlī.
6.3.1.SAM «Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti» (SM)	Atlase plānota 2015.gada beigās. Projektu īstenošana uzsākta pēc pagaidu regulējuma apstiprināšanas 2014.gada septembrī
7.1.1.SAM “Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam” (LM)	Atlase plānota 2015.gada martā. Izmaksu attiecināmība un projektu īstenošana tika uzsākta 2015.gada janvārī.
7.2.1.SAM “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvu Jauniešu garantijas ietvaros” 1. un 2.pasākums (LM)	Atlase plānota 2015.gada maijā. Izmaksu attiecināmība un projektu īstenošana tika uzsākta 2014.gada janvārī.
8.3.3. SAM “Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā “.	Atlase plānota 2015.gada maijā. 01.09.2014. JSPA uzsāka projekta “PROTI un DARI!” īstenošanu.
9.1.1.SAM “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” pasākums “Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem” (LM)	Atlase plānota 2015.gada martā. Izmaksu attiecināmība un projektu īstenošana tika uzsākta 2015.gada februārī.




## 2014.-2020.gada perioda Kohēzijas politikas finansējuma sadalījums pa tematiskajiem mērķiem (mEUR; %)

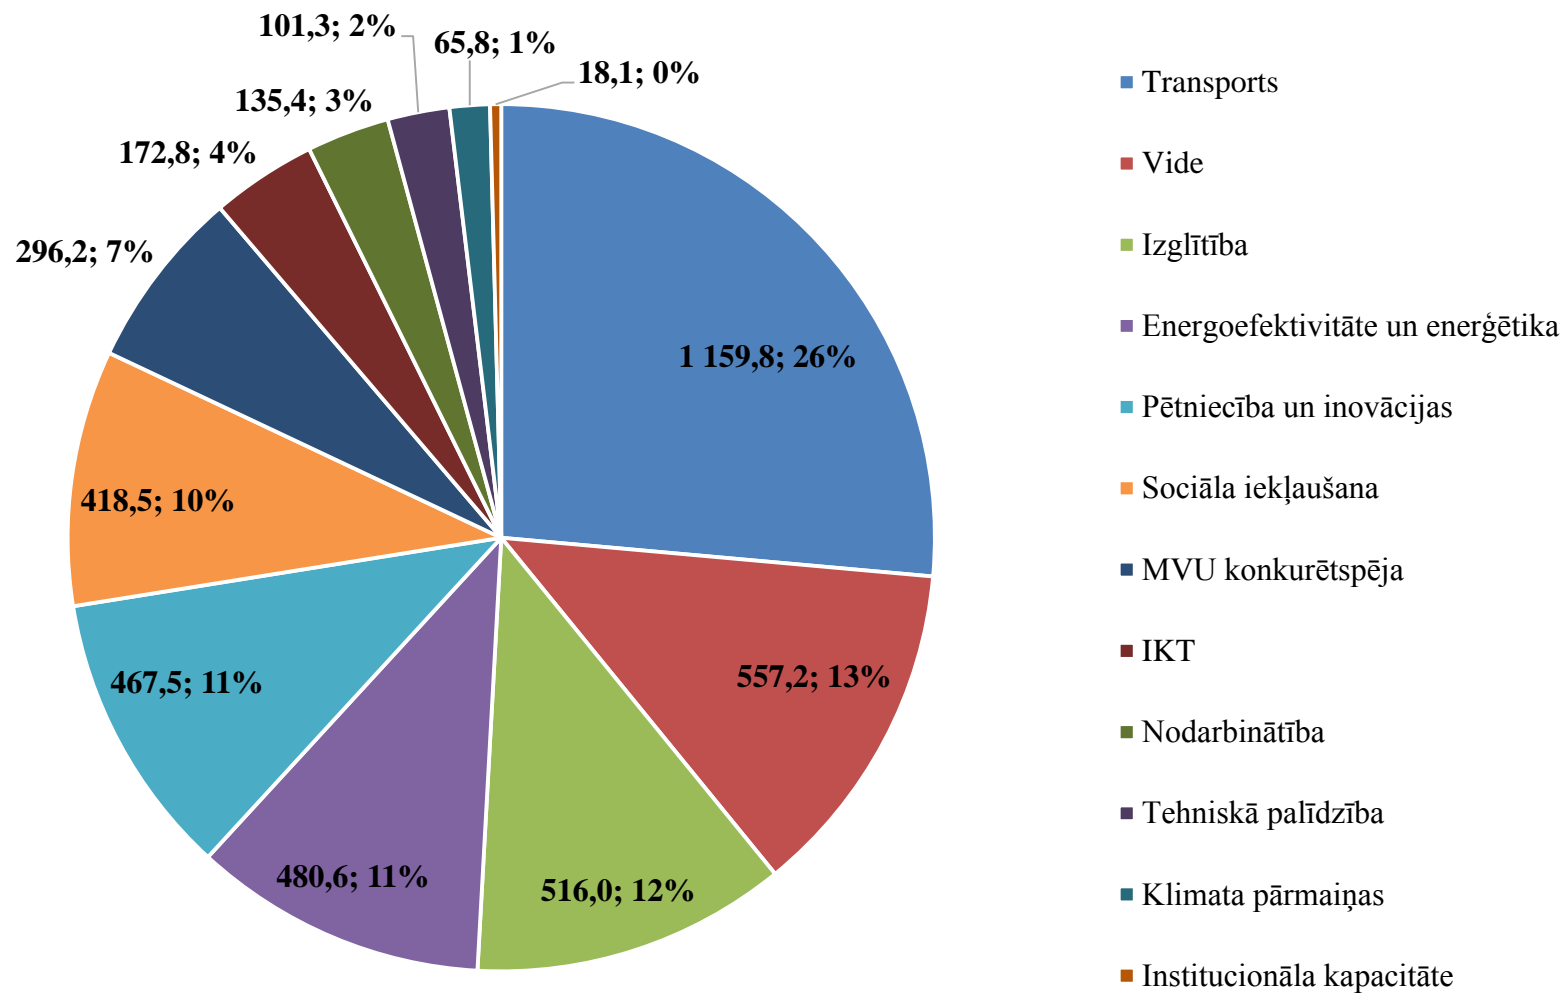



## 2014.–2020.gada perioda Kohēzijas politikas finansējuma sadalījums pa prioritārajiem virzieniem - ESF, ERAF, KF (mEUR; %)

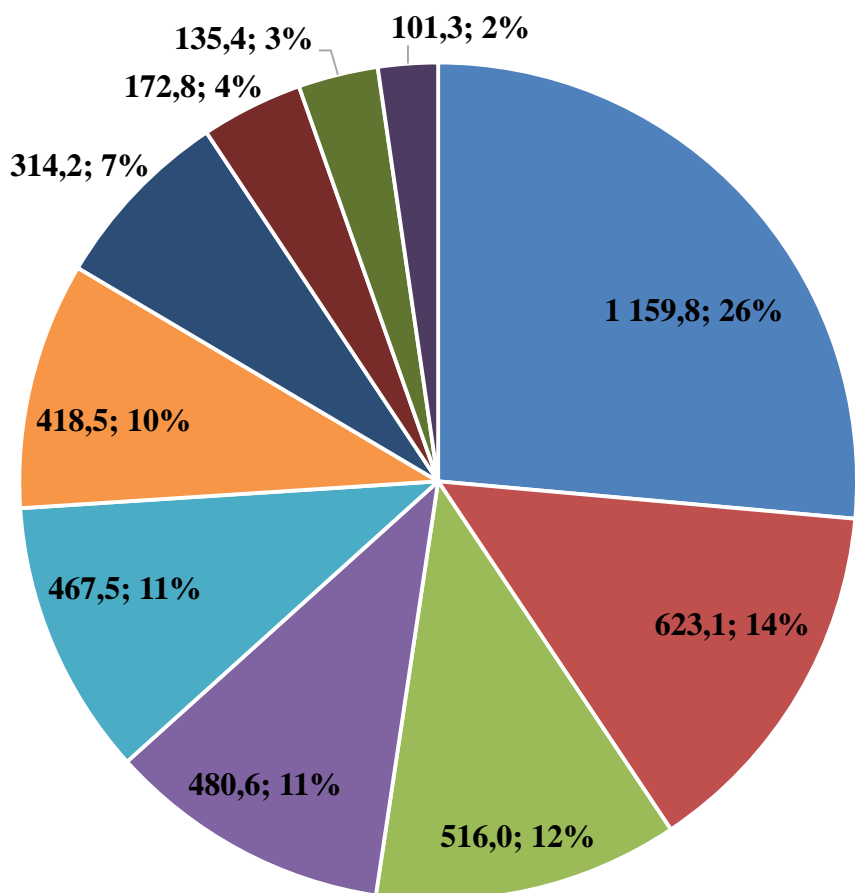

- Ilgtspējīga transporta sistēma
- Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
- Izglītība, prasmes un mūžizglītība
- Pāreja uz ekonomiku, kura rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs
- Pētniecības, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
- Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
- Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
- IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
- Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
- Tehniskā palīdzība



## EEZ/Norvēģijas programmu maksājumu pieprasījumu plāni un saņemtie maksājumi, mEUR – ievērojamas novirzes

