



LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

Kohēzijas politikas ES fondu investīcijas progresa informācija

22.03.2016. Ministru kabineta sēde





Saturs


1. 2007-2013 periods: progress, riski un pasākumi
2. 2014–2020 perioda aktualitātes



2007-2013 ES fondu periods -

uz 29.02.2016 (% pret 31.08.2015), mEUR;

«virssaistības» = ES fondi + budžeta daļa

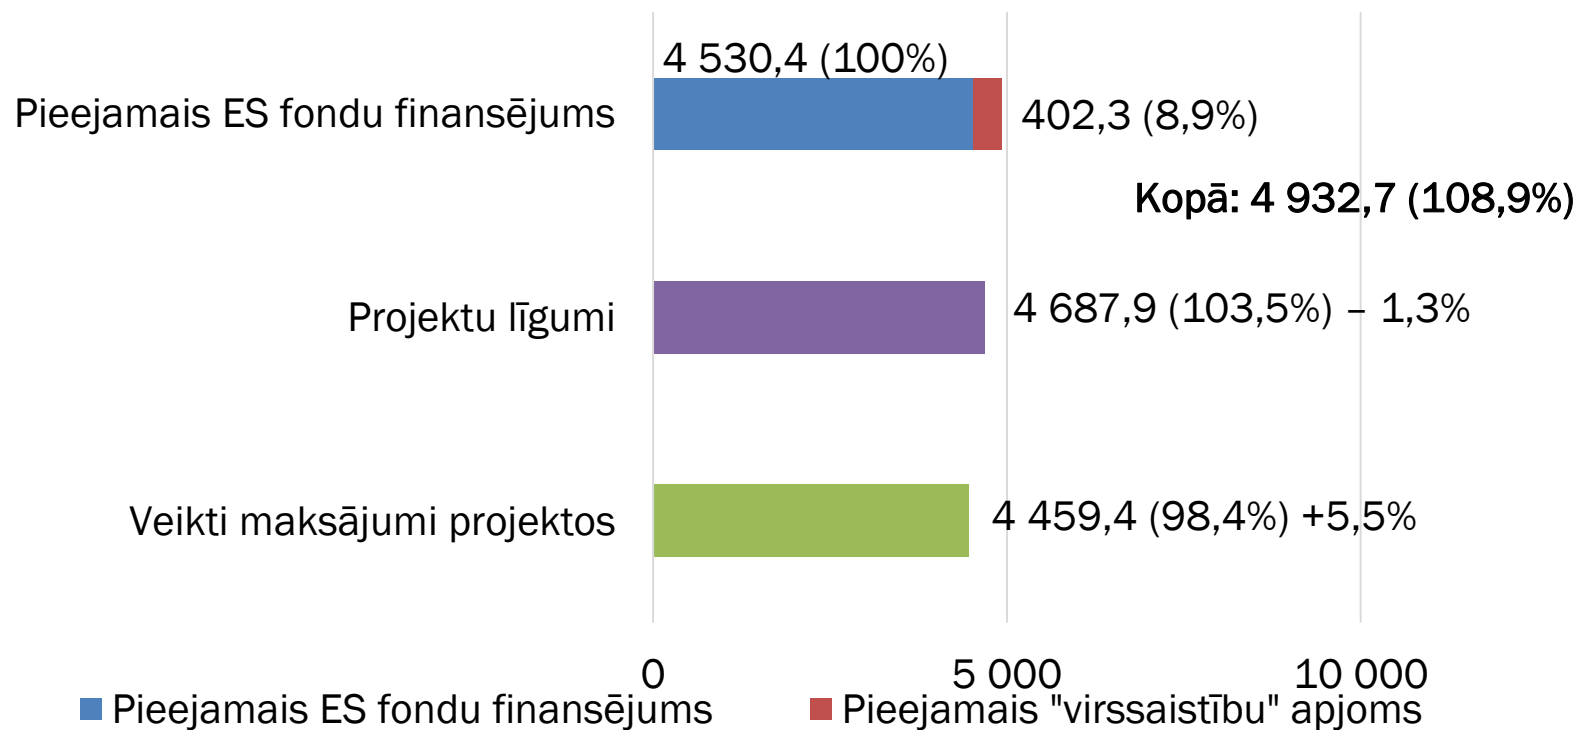


No EK saņemts max – 95% no pieejamā ES fondu finansējuma (4 303,9 mEUR)



2007-2013 ES fondu periods -

01.03. - 31.03.2016. - kopā 228,5 mEUR atlikušie maksājumi pārbaudes procesā (5,0% no ES fondu «aploksnes») mEUR un % no līgumu summas; (mēneša laikā samazinājums par 47,1 mEUR)

Prognoze – ES finansējums būs pilnībā sekmīgi izmantots, **Riski** tiek vadīti + ir deklarējamo izdevumu rezerve uz valsts budžeta «virssaistību» rēķina

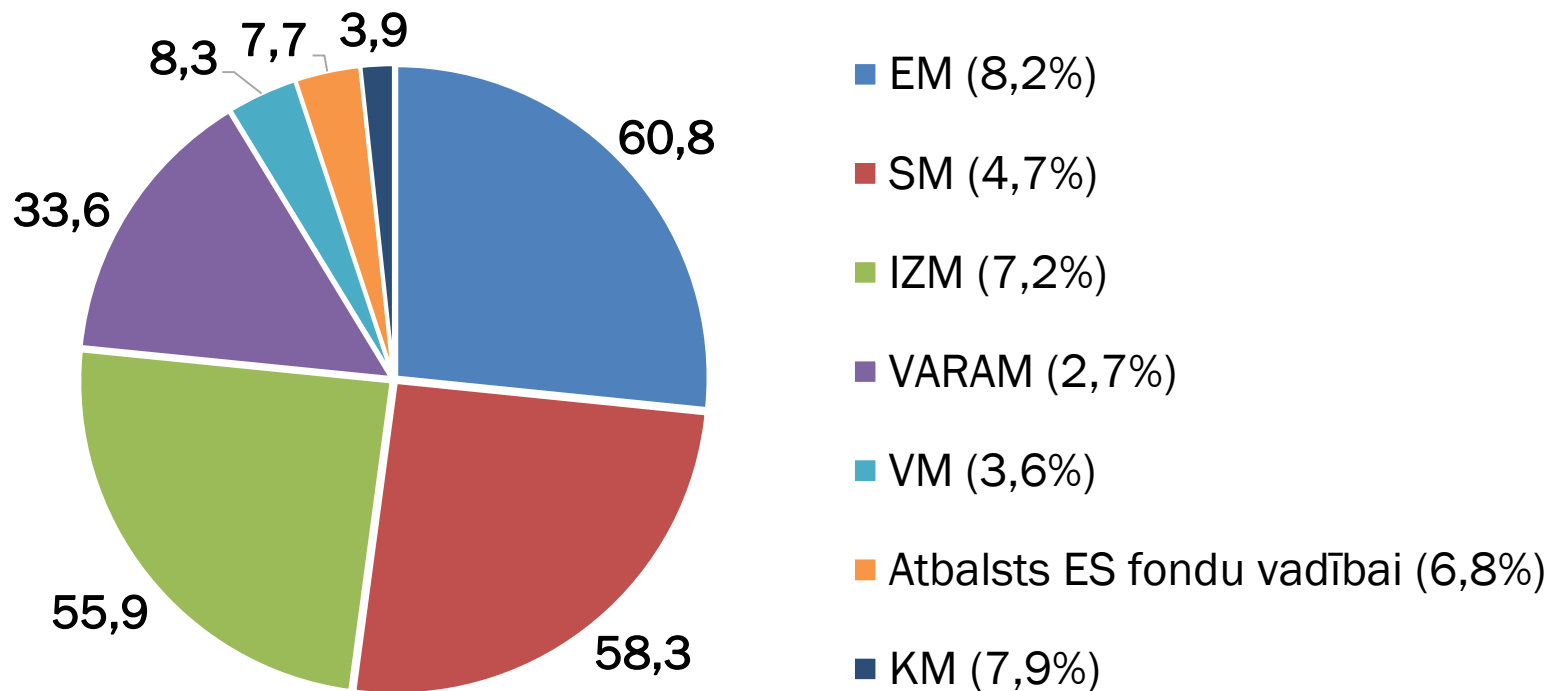




Saturs

1. 2007-2013 periods: progress, riski un pasākumi
2. 2014–2020 perioda aktualitātes




2014-2020 ES fondu periods -

uz 29.02.2016, mEUR;

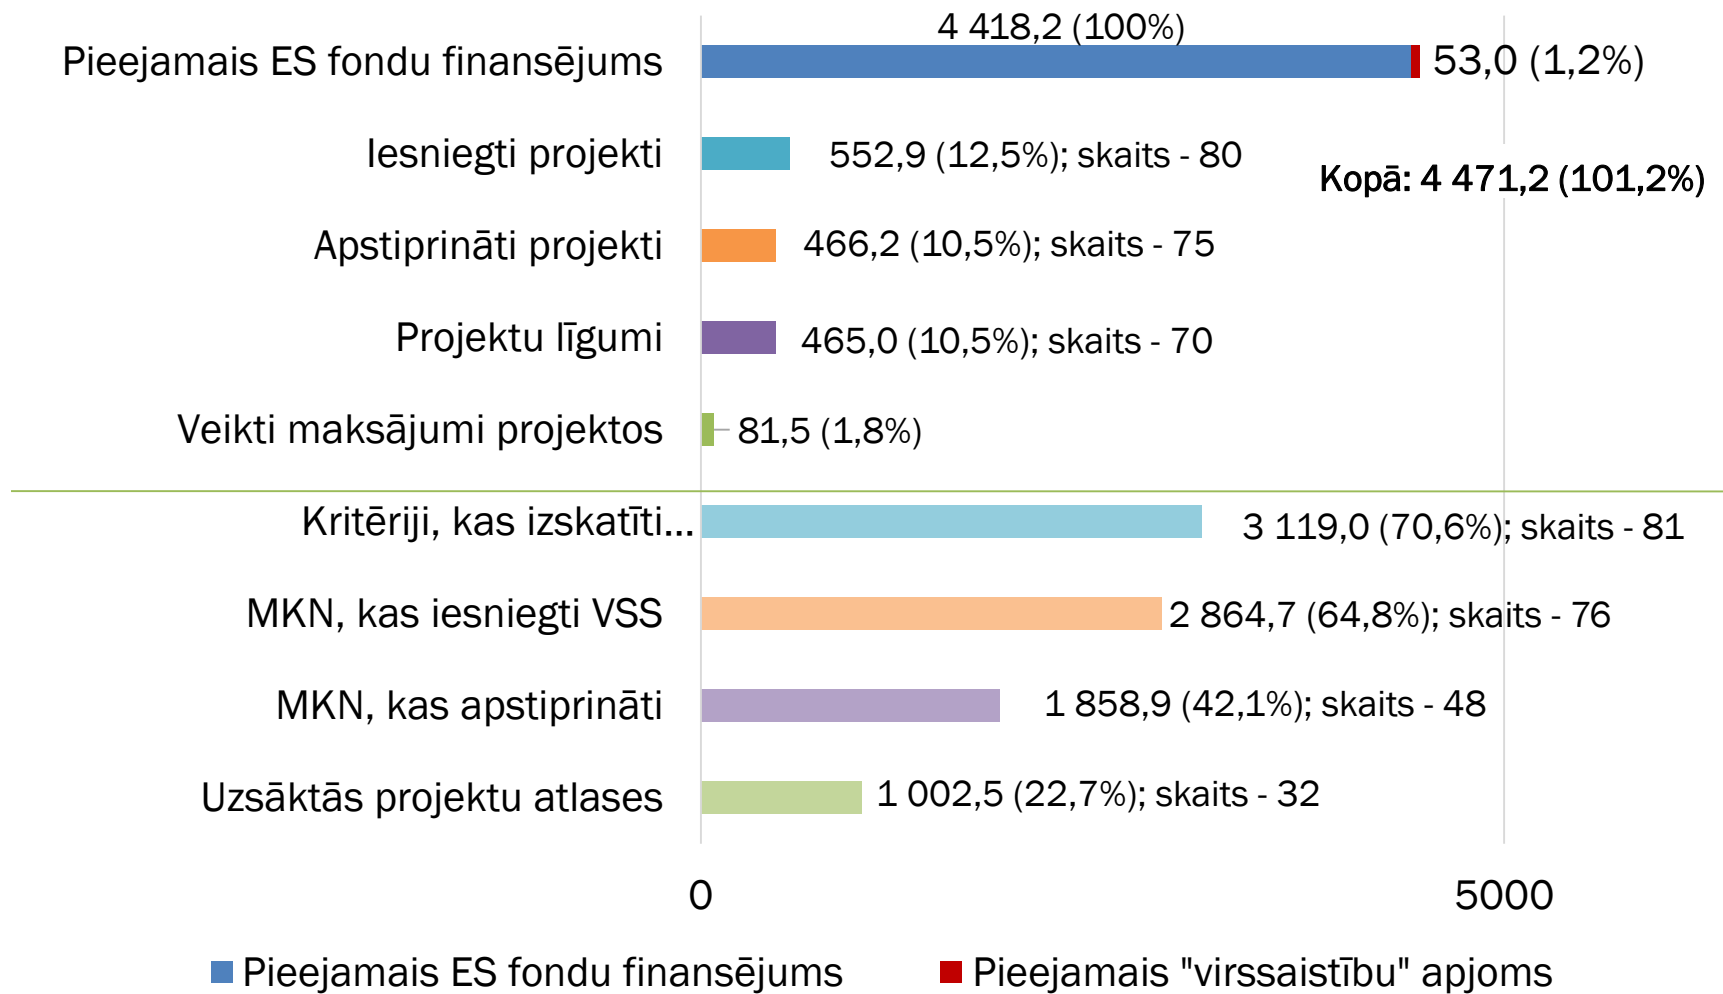




ES fondu budžeta plūsmas prognozes plānošanas periodu paralēlā ieviešanā, mEUR

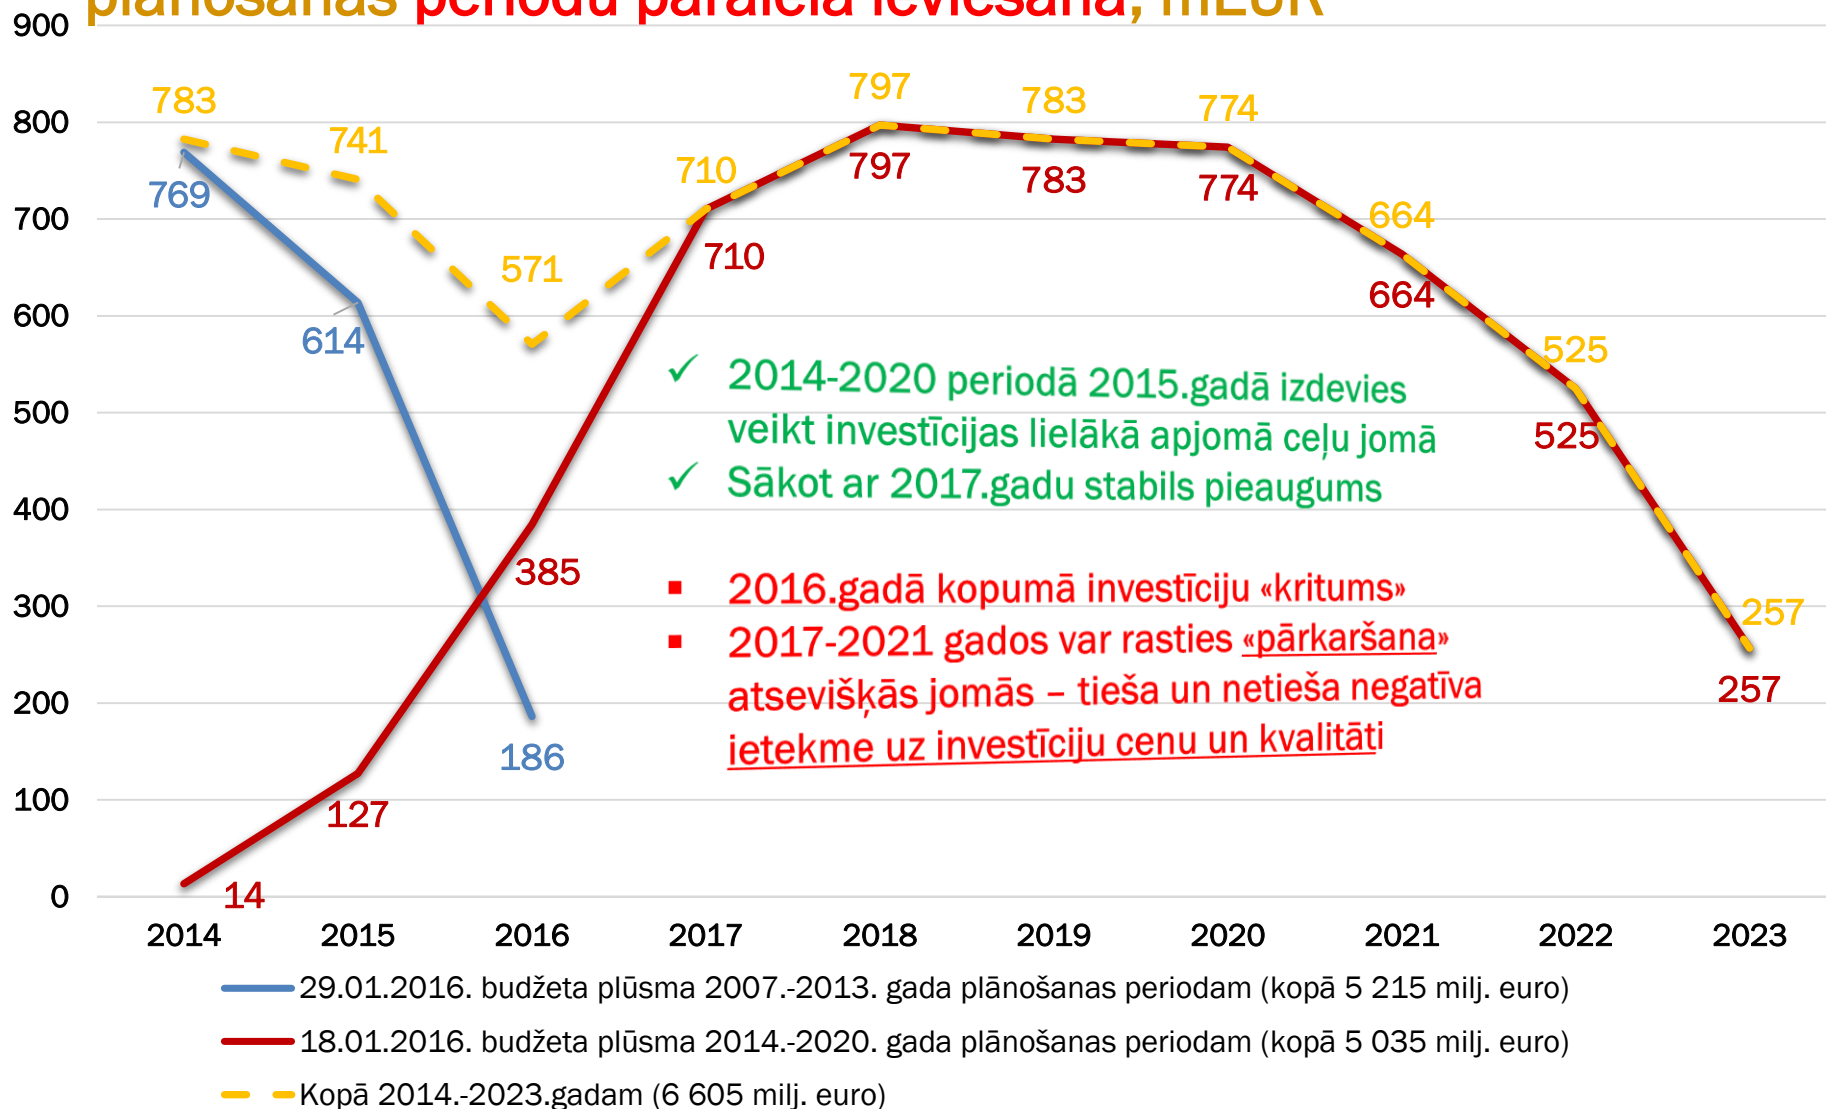



2014-2020 periodā budžeta izdevumu tempa prognoze 2016.gadam pasliktinājusies - JĀPAĀTRINA PROCESI

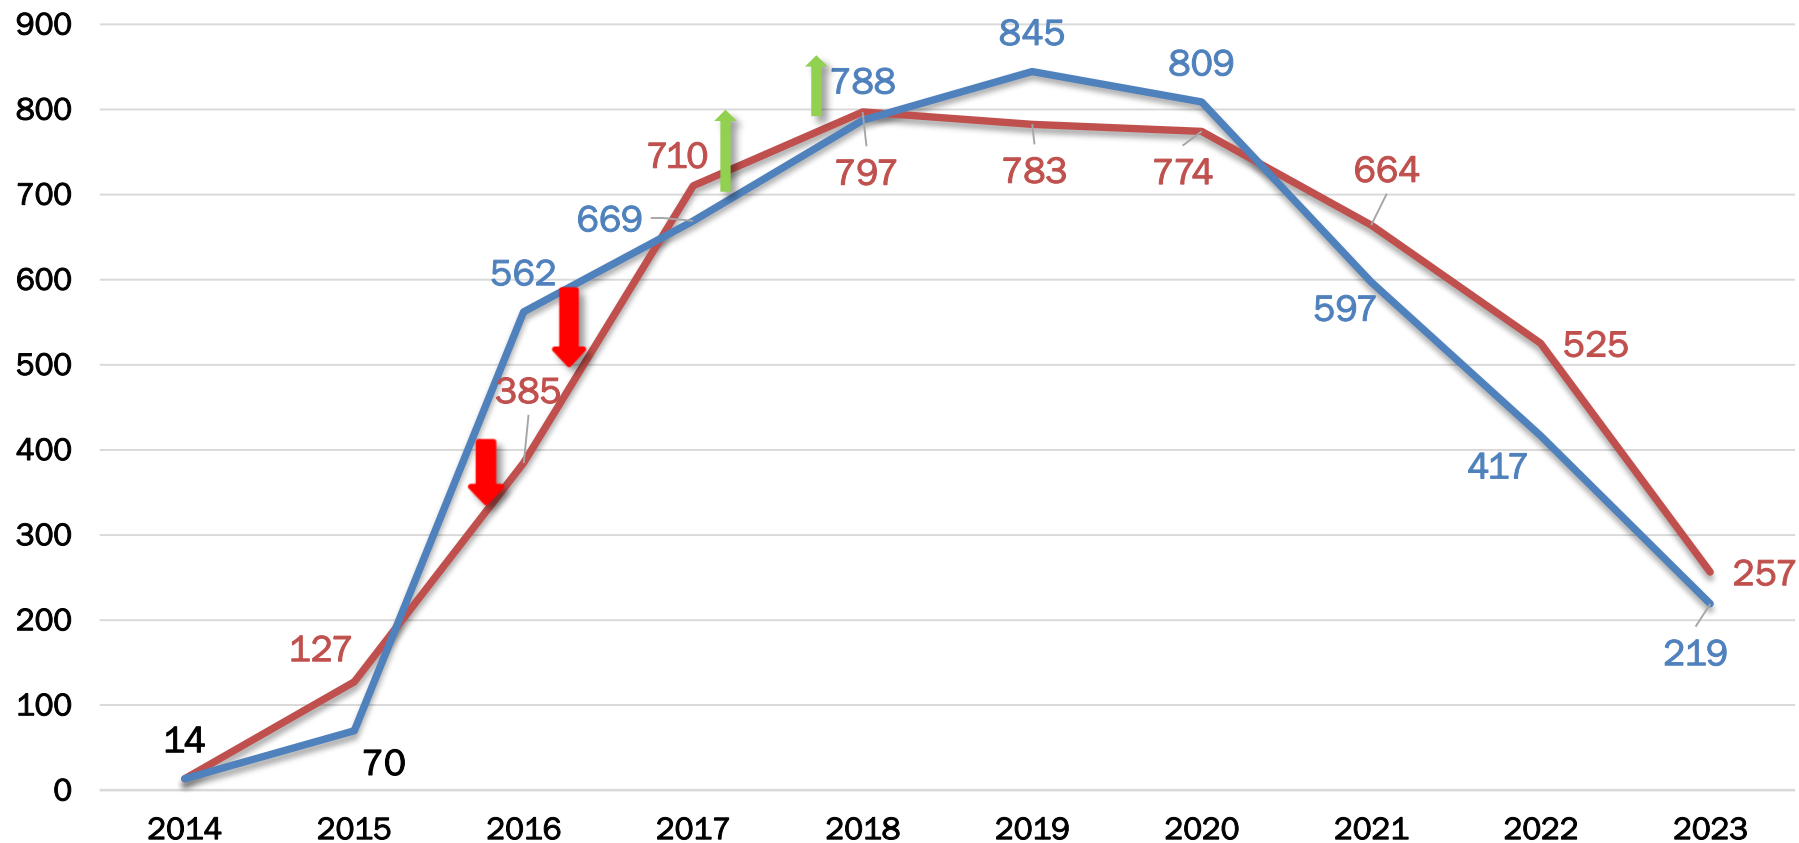


— 18.01.2016. Izdevumu prognoze 2014.-2020. gada plānošanas periodam (kopā periodam 5 035 milj. euro)

— 30.07.2015. Izdevumu prognoze 2014.-2020. gada plānošanas periodam (kopā periodam 4 989 milj. euro)




ES fondu budžeta plūsmas abos plānošanas periodos – 2007-2013 straujāka plūsma lielā mērā skaidrojamas ar sākumā lielākiem avansiem (krīzes ietekmes mazināšanai) un 100% maksājums finanšu instrumentos

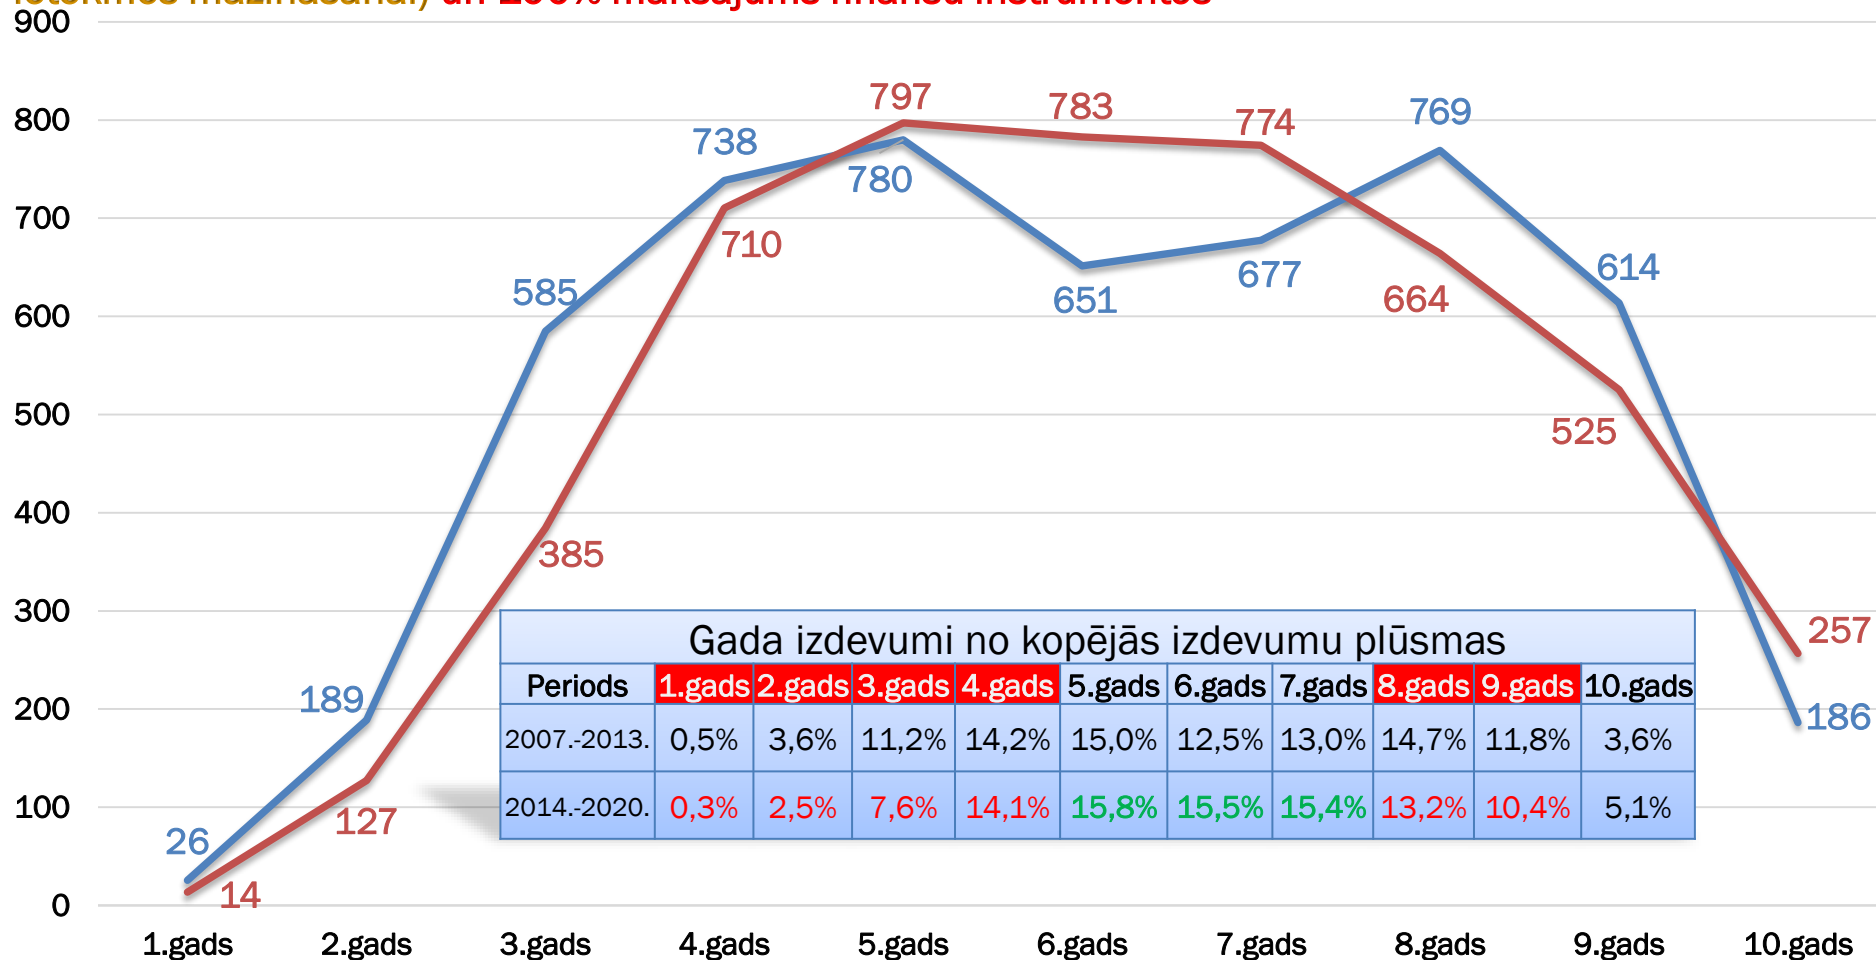




66% (vidēji) no 2014.-2020. perioda budžeta izdevumiem paredzēti būvniecības jomā

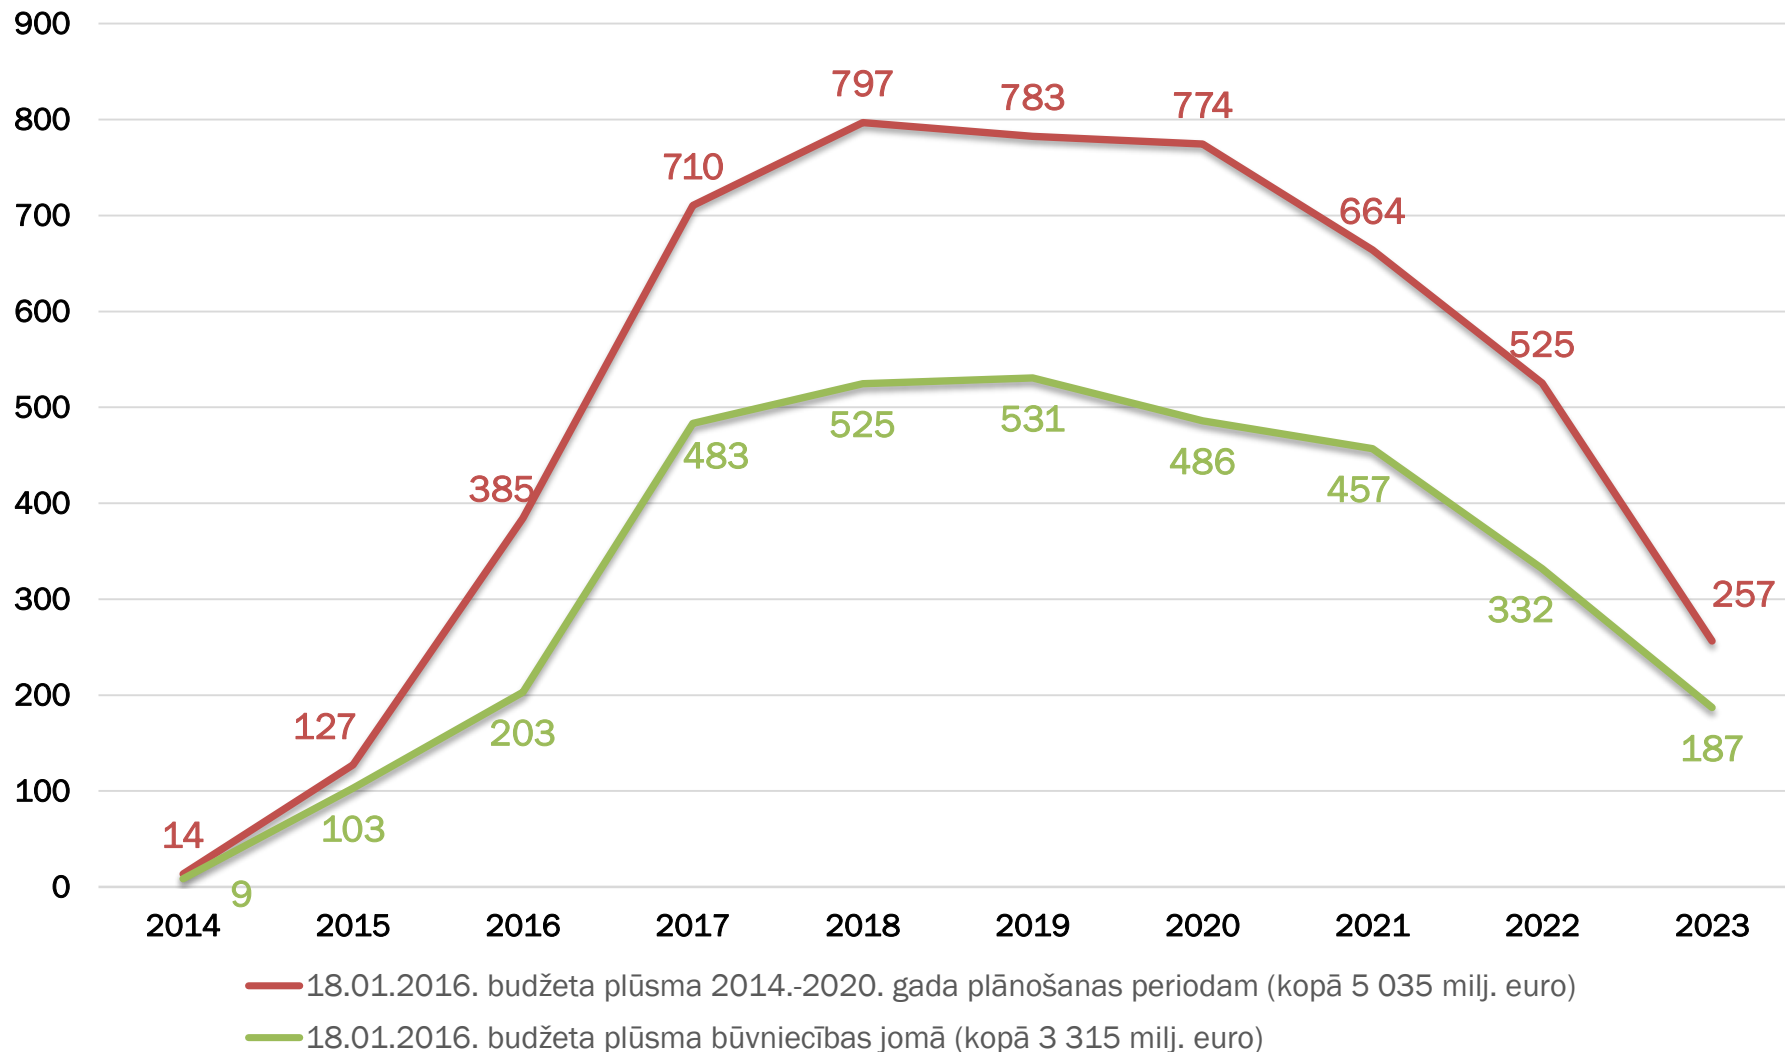




2014-2020 ES fondu periods - kavējumi

MK noteikumi VSS - plānotais pret faktisko 2015.gadā

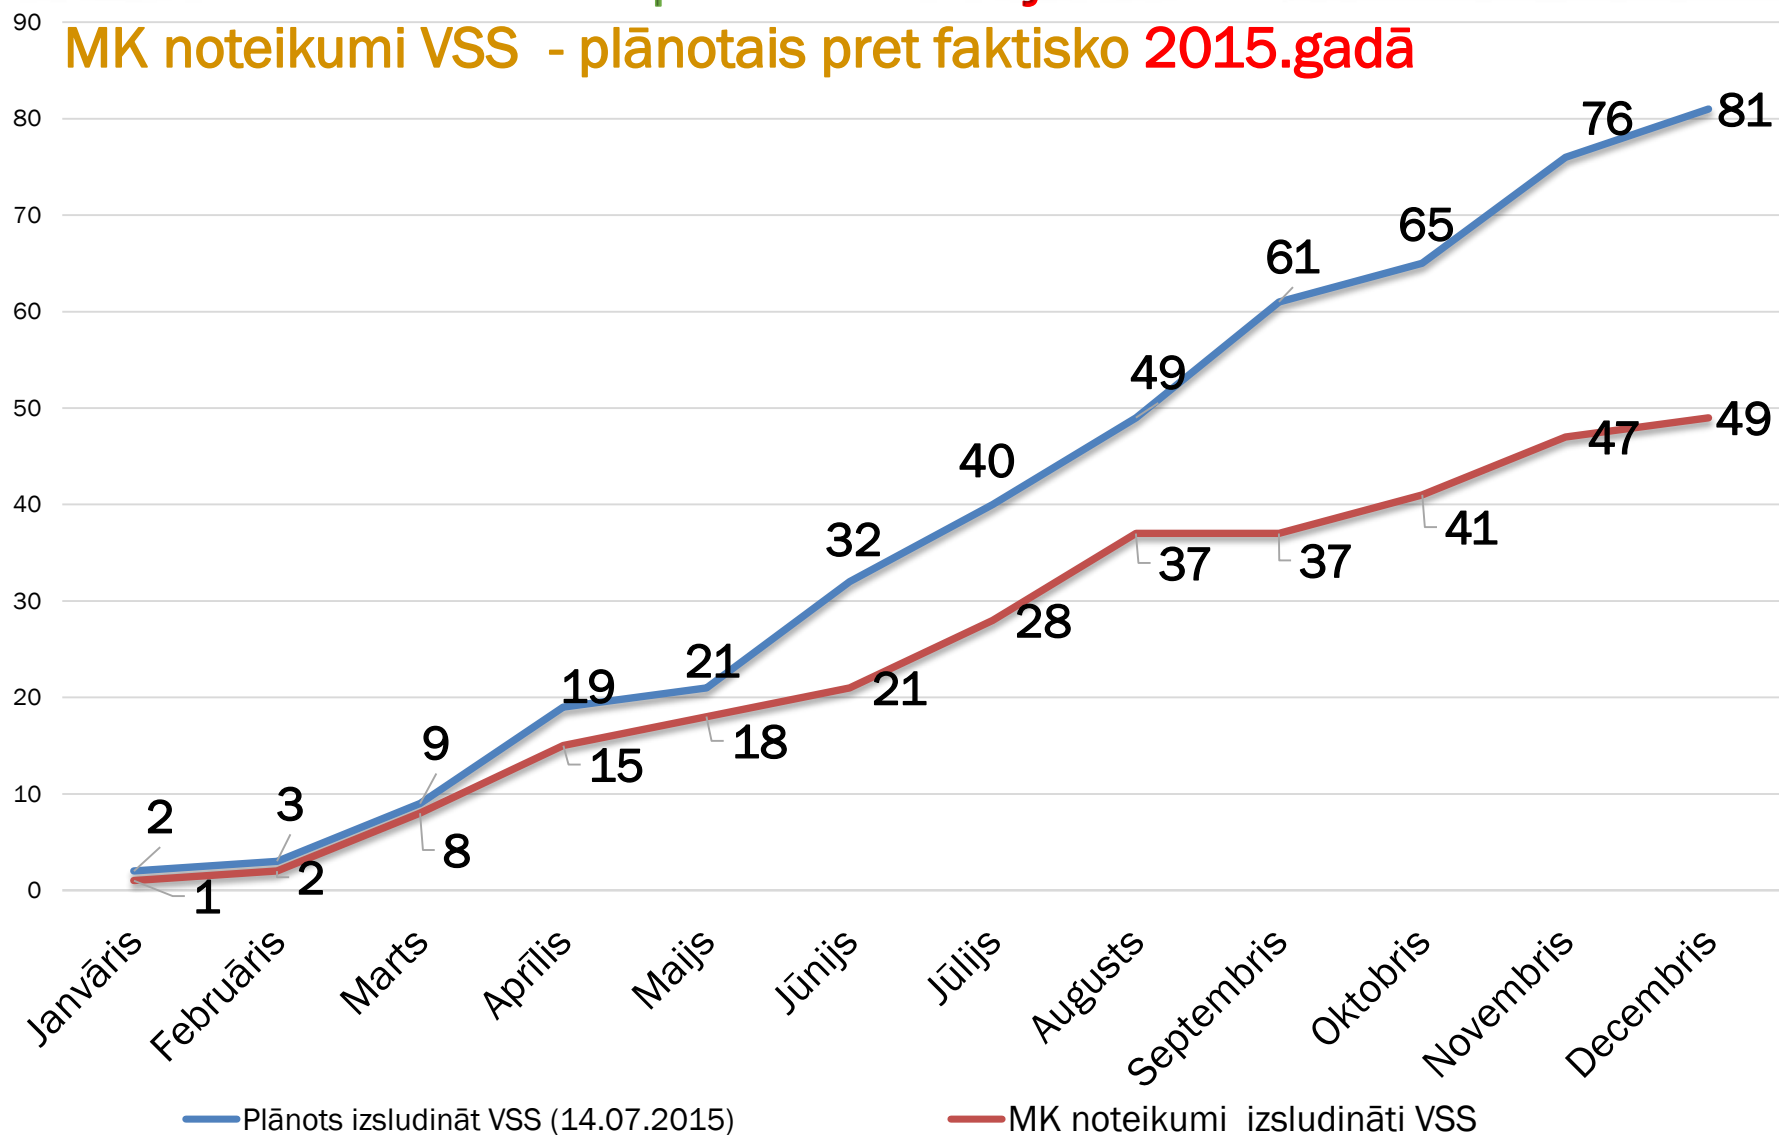



ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība 2016.g mEUR

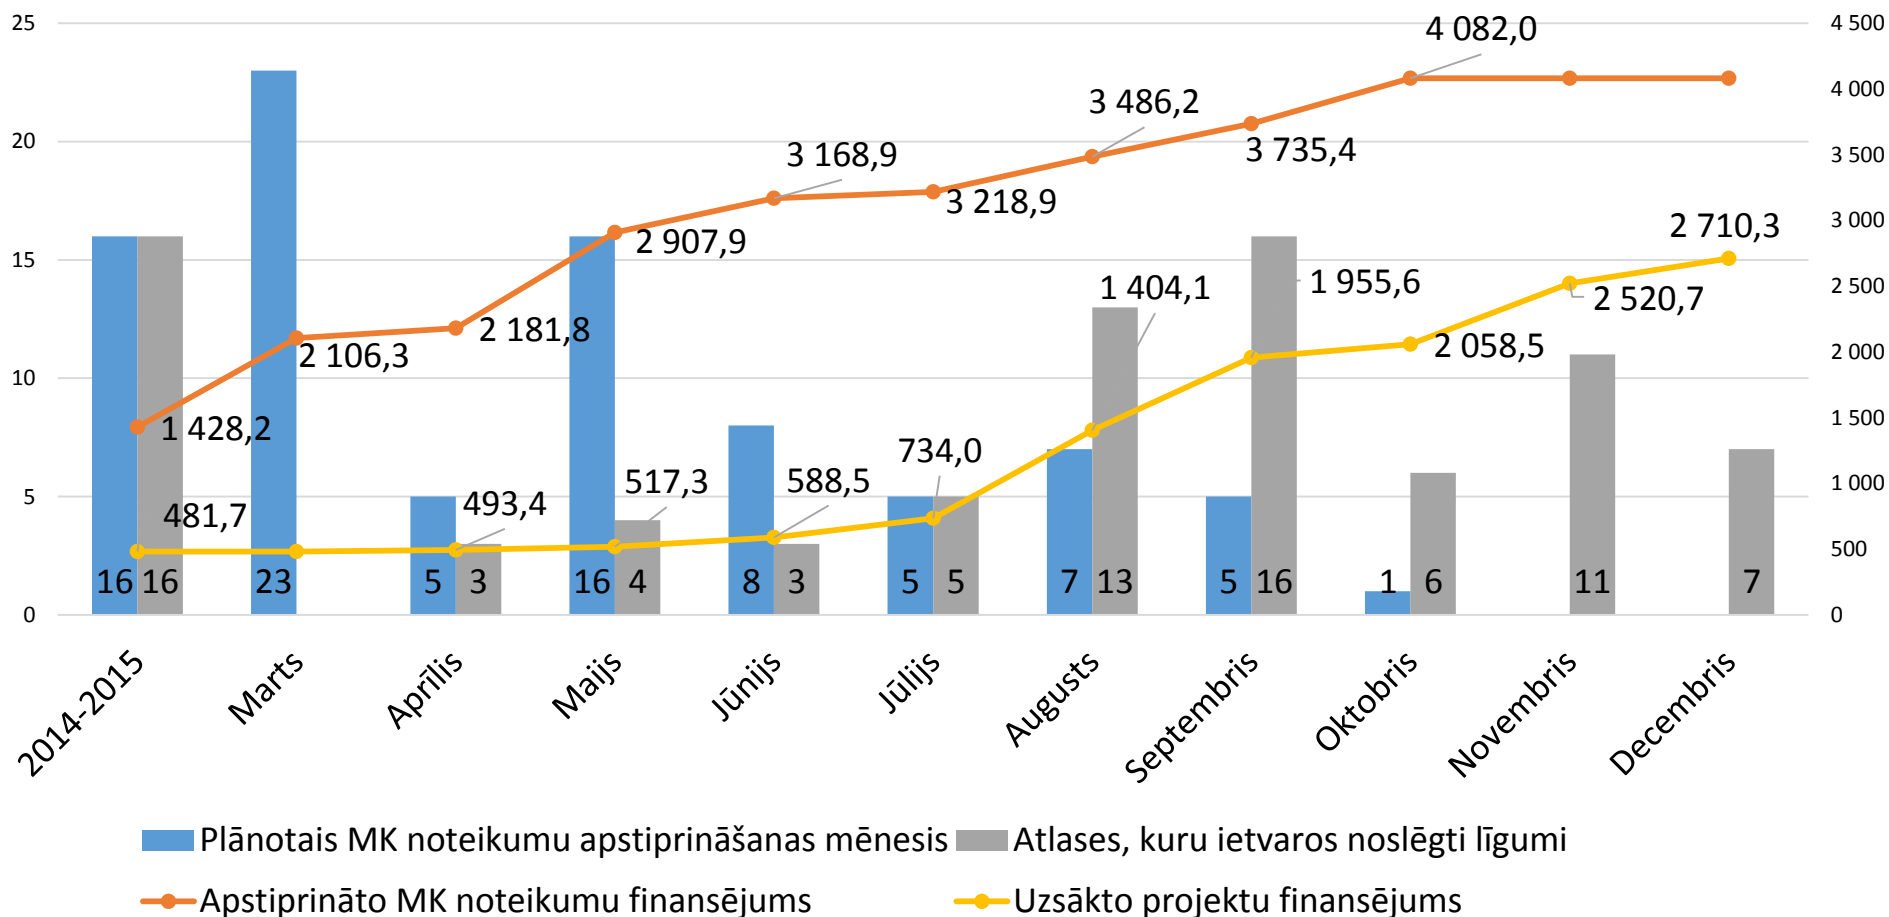



Lielākie izaicinājumi ES fondu uzsākšanā


- Lielie transporta infrastruktūras projekti
- 4.2.1.1. pasākums “Daudzdzīvokļu ēku siltināšana”
- 3.1.1.SAM un 3.1.2.SAM “ finanšu instrumenti”
- 4.2.1.2.pasākums “Valsts ēku siltināšana”
- 8.1.3.SAM “Profesionālo skolu infrastruktūra”
- 8.4.1.SAM “Nodarbināto profesionālās kompetences attīstība”
- 9.3.2.SAM “Veselības infrastruktūras attīstība”
- 5.3.1. «Ūdenssaimniecība»
- 5.6.1. «Degradēto teritoriju revitalizācijas Rīgā»
- 5.5.1. «Dabas un kultūras mantojums»



2014-2020 ES fondu periods – prognoze 2016.g.janvārī

POZITĪVI – kavējumi vēl nerada ES fondu «aploksnes» zaudēšanu

Turpmāka negatīva tendence nav pieļaujama – tuva «sarkanā» līnija, mEUR

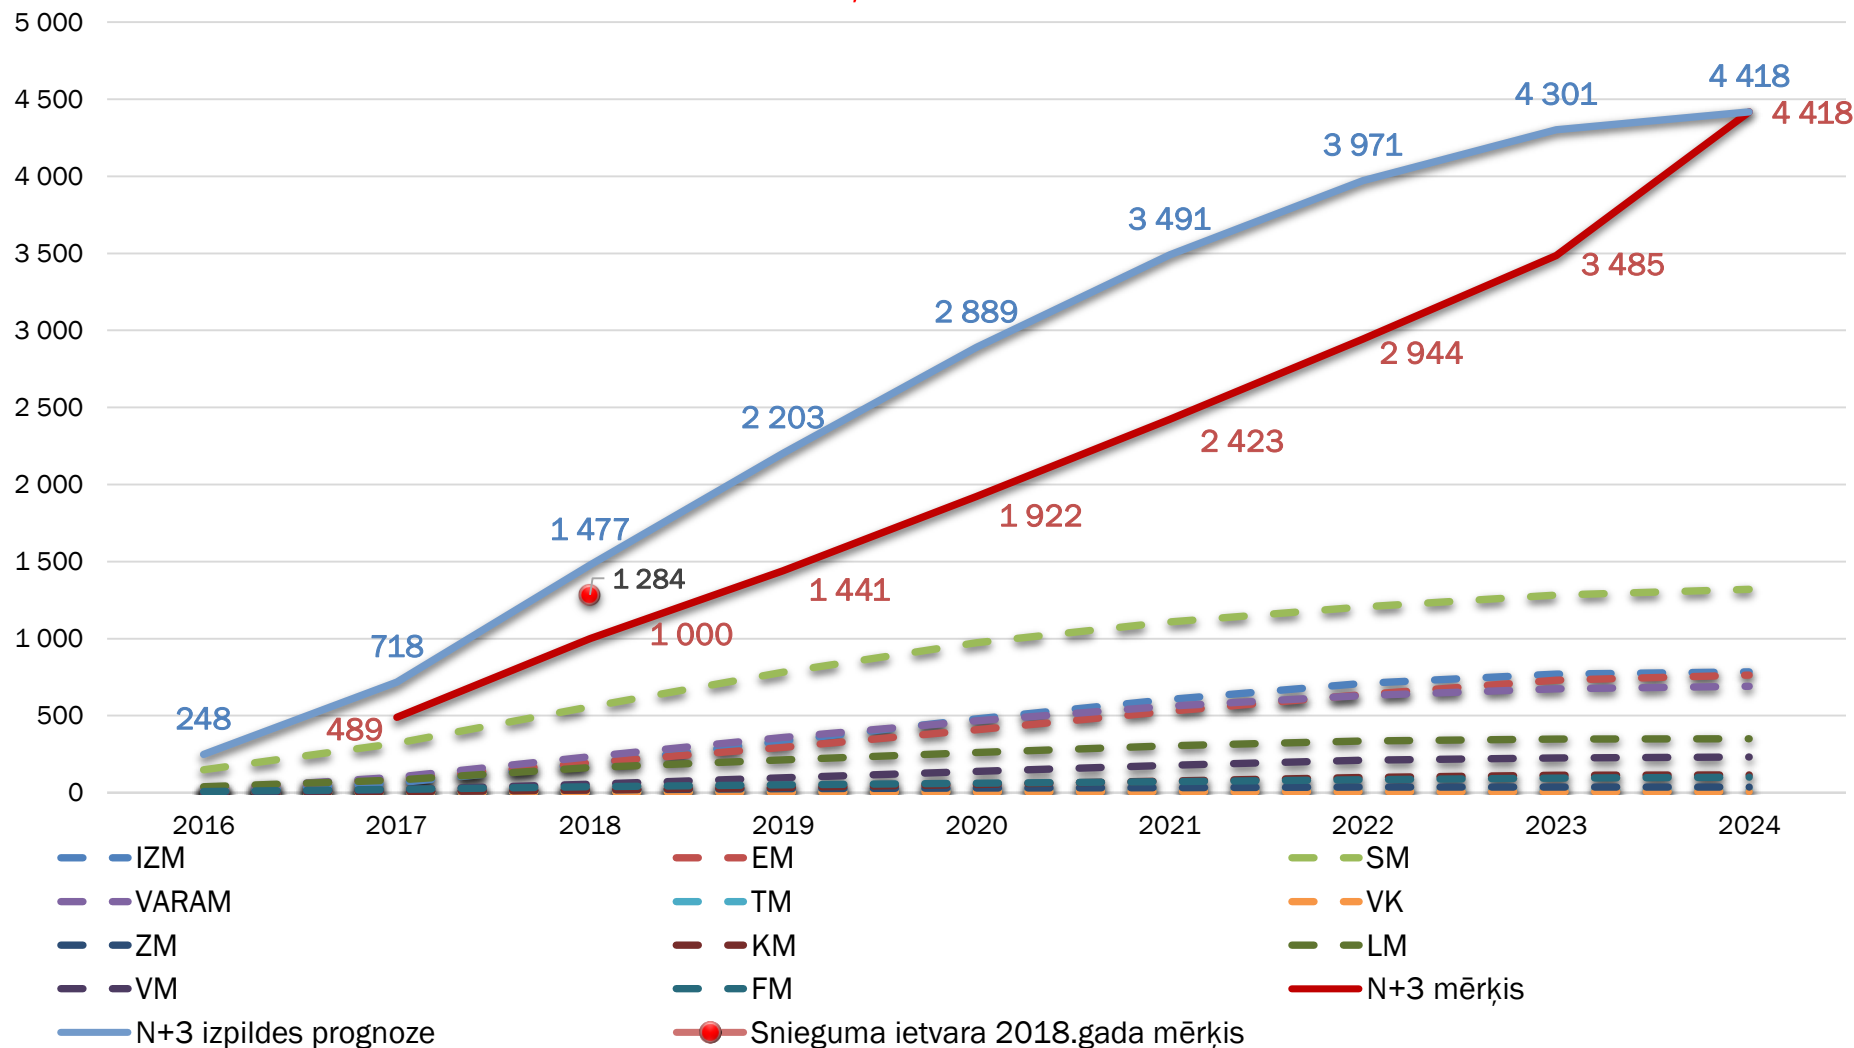


N+3 izpildes prognoze

22.03.2016



2014-2020 ES fondu periods – prognoze 2016.g.janvārī

Maksājumi projektos pa gadiem - prognoze, ES fondu daļa, kumulatīvi, mEUR

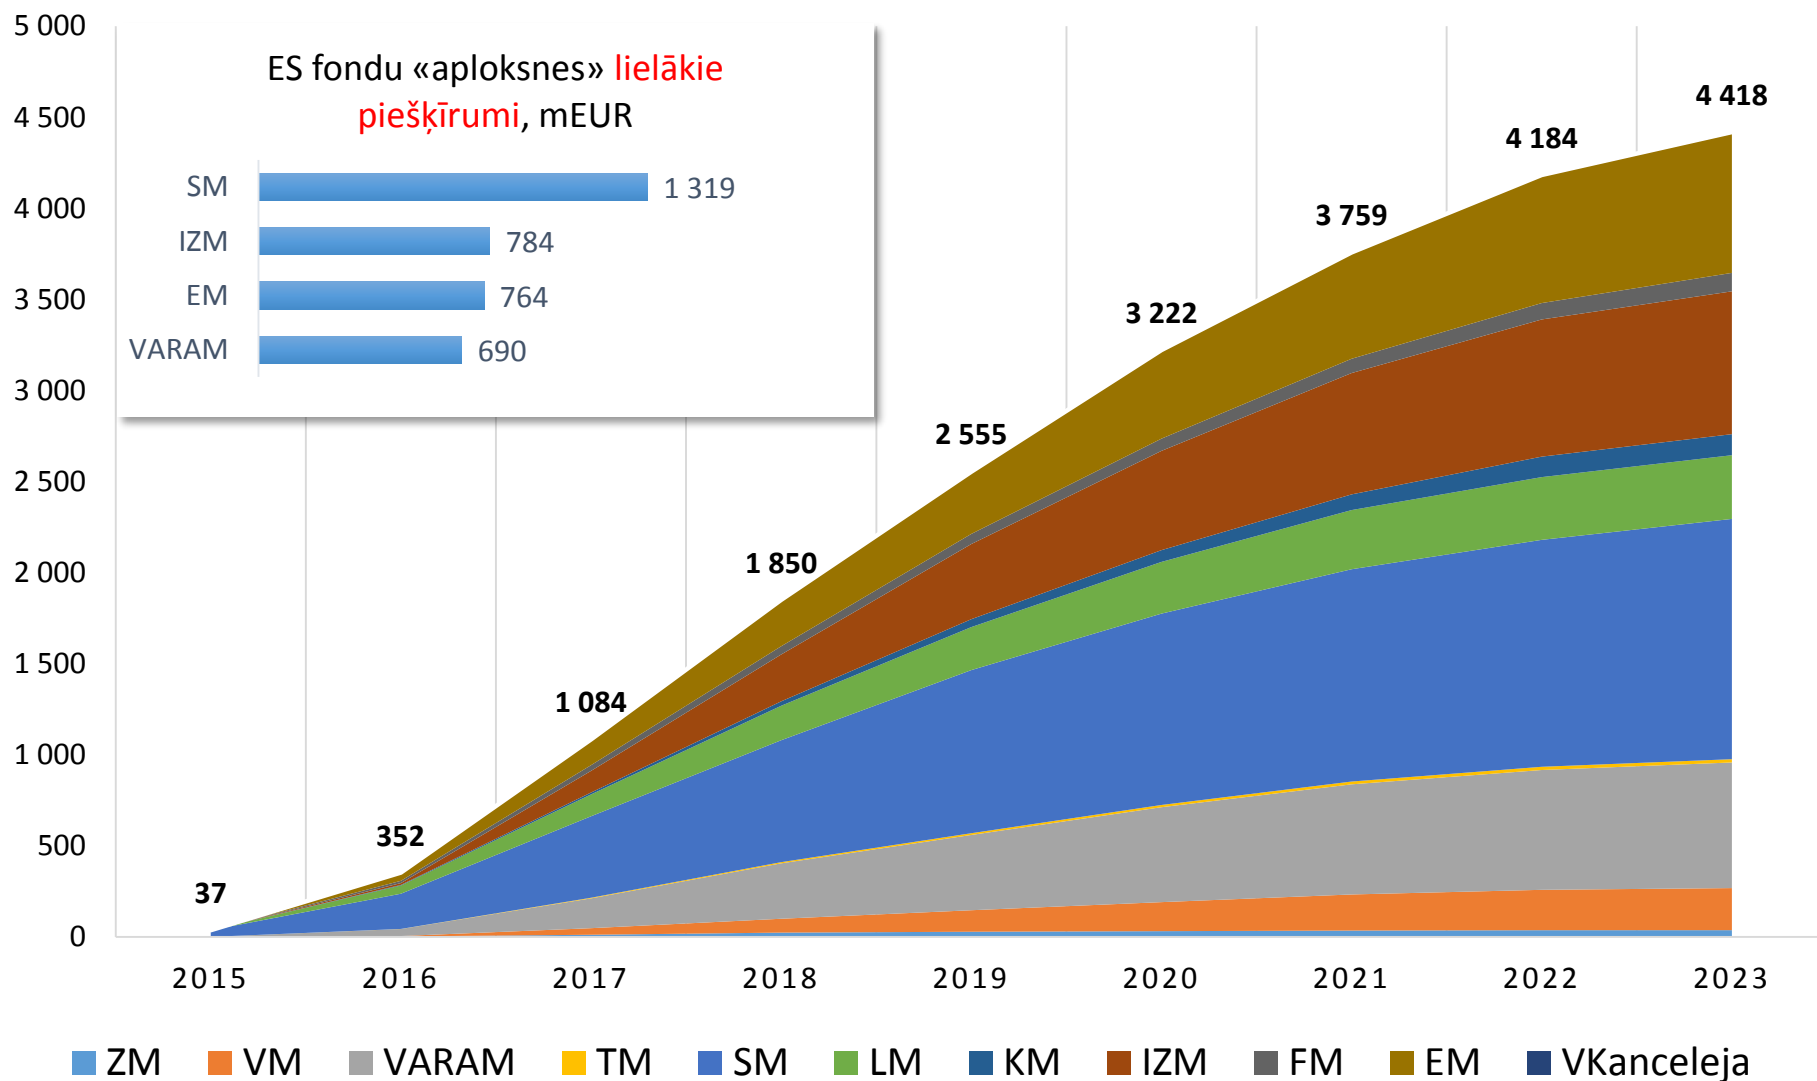




2014-2020 ES fondu periods – – prognoze 2016.g.janvārī


2016.gads – maksājumi projektos ievērojami pieaug gada beigās,

kumulatīvi, ES fondi mEUR

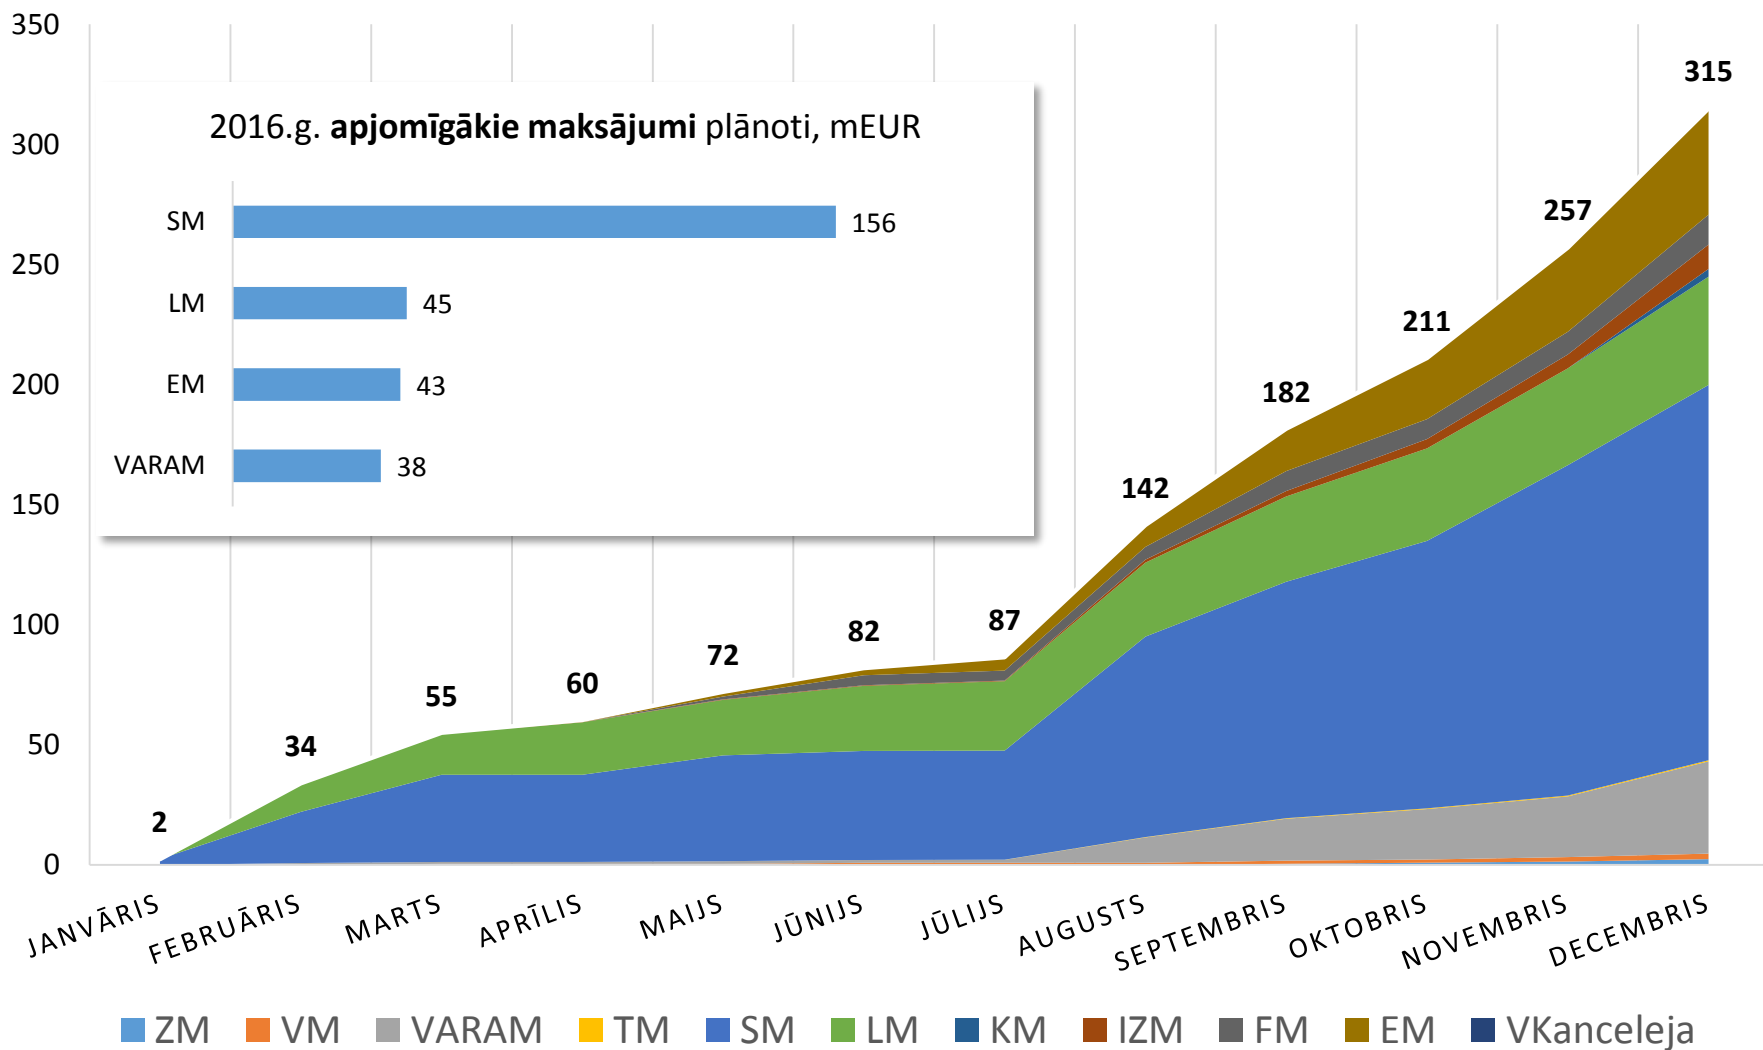



2014-2020 ES fondu periods – riski pilnībā neaizpildīt 2018.gada sertificēto izdevumu mērķi trijos prioritārajos virzienos

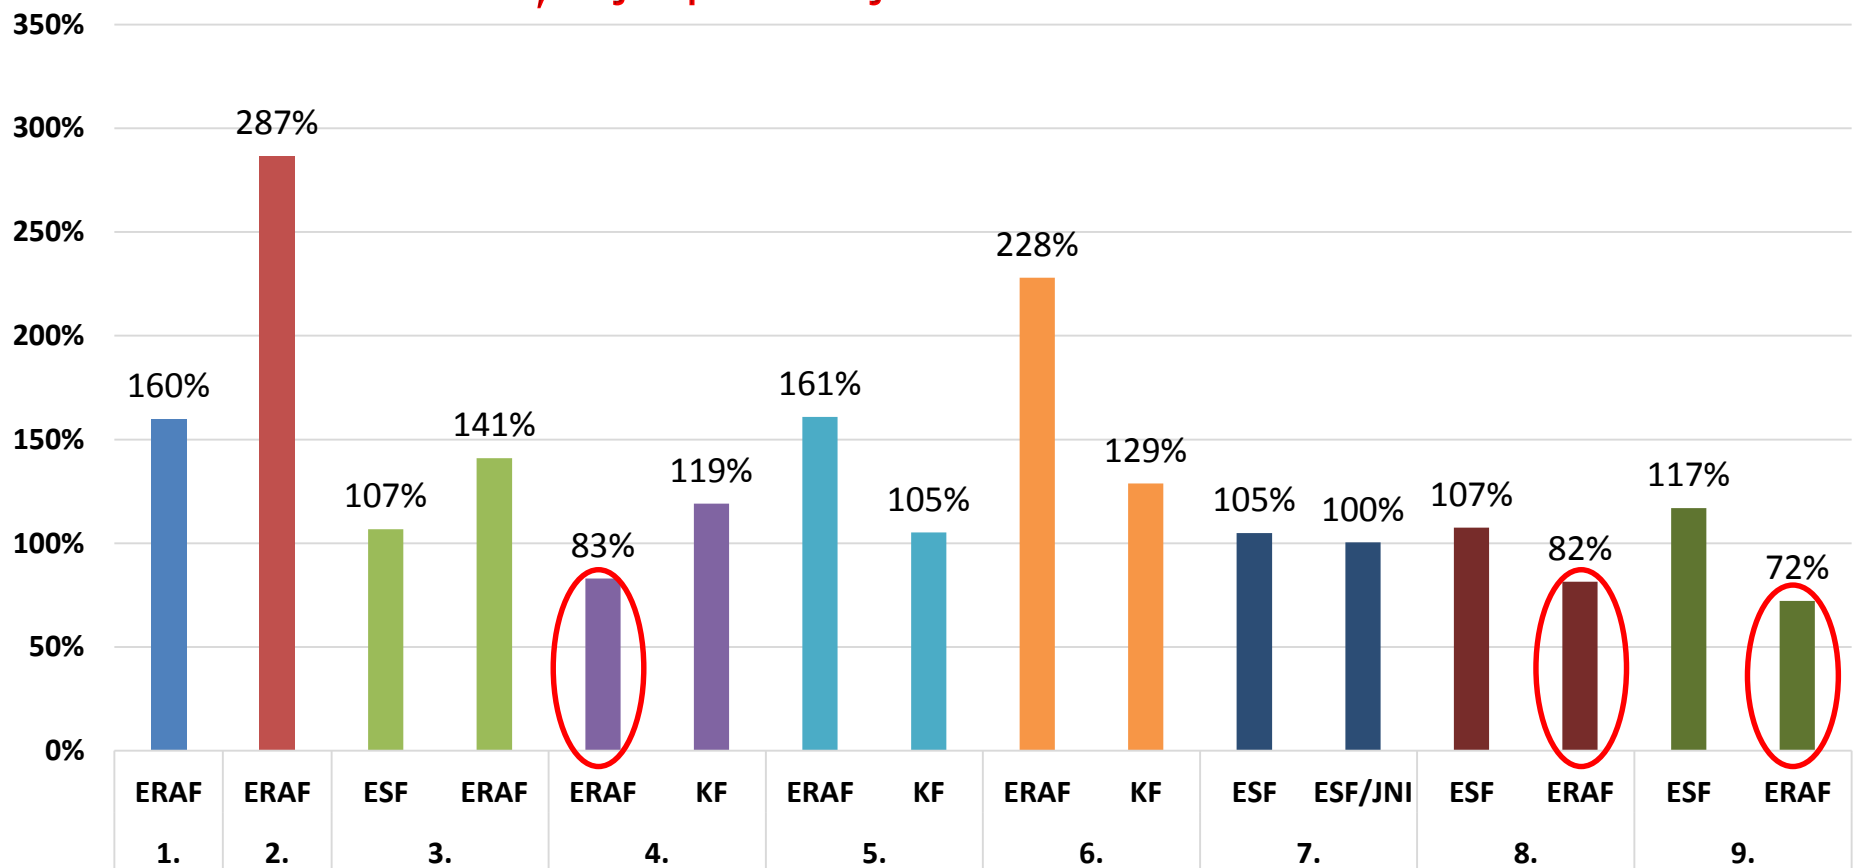

■ 1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas

■ 3. Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja

■ 5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte

■ 7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte

■ 9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana

■ 2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi

■ 4. Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs

■ 6. Ilgtspējīga transporta sistēma

■ 8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība



Iestāžu pasākumi efektīvā sadarbībā paātrināt investīciju uzsākšanas procesus

- Nozaru ministrijas un FM uzņemas solidāru atbildību par plānu izpildi.
- Lai maksimāli izvairītos no vairākkārtējas formālas tiesību aktu projektu skaņošanas starp FM un nozaru ministrijām, tiks organizētas kopējas Ministru kabineta noteikumu un pavadošo dokumentu precizēšanas sesijas.
- Ministri ieviešanas MK noteikumu projektus, kas 2 mēnešus pēc izsludināšanas VSS vēl nav iesniegti izskatīšanai MK, virza uz MKK sēdi.



Paldies!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

esfondi@fm.gov.lv

The screenshot shows the homepage of the website for EU Funds in Latvia. At the top, there is a navigation bar with links for 'Managing Authority', 'Contacts', 'Logotypes', 'Publications', 'Links', 'Disclaimer', and 'Twitter'. Below this is a header section with logos for ESF (EIROPAS SOCIĀLAIS FONDS), ERAF (EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS), and KF (KOHĒZIJAS FONDS). To the right of the logos is a banner with the text 'INVESTING IN YOUR FUTURE!' and three small images. Below the header is a 'News' section with a 'Search within the homepage' box. The news items are listed with dates and titles. On the right side, there is a 'For media' section with icons for 'Video, audio, photo', 'Publicity measures', 'Financial progress', and 'EU Funds' projects'. At the bottom of the page, there is a footer with statistics: 'Visits today: 300', 'Since 20-03-2009: 705386', and 'Last update: 11-10-2012'.





Papildus informācija par 2007-2013 periodu



BŪTISKĀKIE «ATVĒRTIE» JAUTĀJUMI:

1. **Stradiņu slimnīcas lielais projekts**, max deklarējamie ERAF 24,1 mEUR, nefunkcionējošs, īstenošanas termiņš 31.03.2017., VM ir īpaši jāuzrauga projekta pabeigšana. CFLA konstatēja, ka būvdarbi varētu iekavēties - termiņa pagarinājuma risks (max termiņš 31.03.2019., kad jāapliecina EK projekta pabeigtība).
2. **Bērnu slimnīcas projekta funkcionēšanas nodrošināšana** (nav iespējams nodot ekspluatācijā saistītā projekta dēļ) - MK noteikumu grozījumi, lai ļautu projektu pabeigt līdz 20.09.2016. (potenciālā ietekme uz budžetu 1,2 mEUR).
3. **EK audita konstatējums par publiskām ēkām, potenciālā korekcija 5%-25%** (līdz 1,2 mEUR), būs jāpieņem lēmums, vai izmaksāt Bērnu slimnīcai, ja nebūs no EK atbildes.
4. **IKT projekti :**
 - a) projektu pabeigšana - kritiski NVD «e-veselība» (būtiski kavēts) - ERAF 12 mEUR - VM virza MK noteikumu grozījumus, ļaujot «e-veselības» projektus pabeigt līdz 30.12.2016.
 - b) Risks 100% (ERAF 13,8 mEUR) - izdevumu «neattiecināmībai» lekšlietu ministrijas Informācijas centra «rāciju» projektā dēļ iepirkuma procedūras (saruna procedūra ar vienu izvēlētu pretendentu Motorola) - Revīzijas iestādes RI) konstatējums, ilgstoši risināts, Vadošā iestāde 2016.gada februāra beigās sniedza RI viedokli, ka nav pārkāpumu, procedūra pamatota, balstoties uz IUB un CFLA vērtējumu. Sagaidāms RI gala slēdziens.
 - c) turpmāka **ilgtspēja** - efektīva e-pakalpojumu un sistēmu darbība



BŪTISKĀKIE «ATVĒRTIE» JAUTĀJUMI:

5. Inčukalna gudrona dīķi – EK piekritusi risinājumam dalīt posmos starp periodiem kopā abos periodos (45,1-53,6 mEUR) - projekts sekmīgi jāpabeidz 2014-2020 periodā. Pretējā gadījumā visi izdevumi uz valsts budžetu, t.sk. 19,4 mEUR ERAF no 2007-2013 perioda. **VARAM ar MK lēmumu uzdots līdz 31.12.2016. sagatavot priekšlikumu par 2014-2020 ES fondu finansējuma nodrošināšanu.**

6. LU Dabaszinātņu akadēmiskā centra Torņakalnā projektā (ERAF 27,5 mEUR) kopš 2013.gada – negatīvs Augstākās tiesas lēmums par iespējamu būvniecības līguma nelikumīgu piešķiršanu.

Rīcība: VI, RI un IUB jāvērtē tiesas lēmuma ietekme uz izdevumu attiecināmību.
Potenciāla ietekme uz budžetu – 5,3 mEUR.

7. Rīgas domes dabaszinātņu apguves bāzes modernizēšanas projektā ir konstatētas interešu konflikta pazīmes, par ko ir piemērota finanšu korekcija - 372,1 tūkst. EUR. Izdevumi nebūs iekļaujami noslēguma deklarācijā.

- *Rīcība:* ja Kriminālprocess noslēgsies bez rezultāta ***iespējama izdevumu kompensēšana no budžeta***, VIAA veicot atmaksu finansējuma saņēmējam. Jārod skaidrība līdz noslēguma deklarācijai 30.06.2016.



BŪTISKĀKIE «ATVĒRTIE» JAUTĀJUMI:

8. Krievu salas lielā projekta sekmīga pabeigšana/funkcionēšana līdz 2019.g. (KF 75,8 mEUR) – uzraugāma mērķu sasniegšana

9. Citu pagarināto projektu sekmīga pabeigšana 2016.g.– uzraugāmi – ja netiek pabeigti, negatīvi ietekmē kopējās deklarācijas prognozes:

- Pasažieru vilciena (PV) vagonu modernizācija – nepabeidzot, nevar deklarēt max KF 8,8 mEUR un tās jāsedz PV (jau šobrīd pēc 31.12.2015. KF 4,2 mEUR izmaksas sedz PV)
- Ventspils brīvosta – nepabeidzot, nevar deklarēt max KF 14 mEUR (jāsedz ostai)
- Liepājas lidostas projekts – nepabeidzot, nevar deklarēt max KF 7,8 mEUR (jāsedz lidostai)

10. Ilgstošie strīdi ar LDz – risināšana - 3,2 mEUR neatbilstības (būtiski līguma grozījumi) ieturēšana 2007-2013 sliežu ceļu projektā – LDZ tiesājas pret SM – jāgaida apelācijas tiesas lēmums (31.05.2016. sēde)



Papildus informācija par 2014-2020 periodu



Satiksmes ministrija

Lielo infrastruktūras projektu sagatavošana un uzsākšana:

Ņemot vērā projektu sarežģītību un ietekmi uz programmas vidusposma rādītāju sasniegšanu nav pieļaujama turpmāka kavēšanās ar lielo projektu sagatavošanu un uzsākšanu

- **Rīcības plāns attiecībā uz Rīgas tramvaju projektu (70 milj. ERAF finansējums):**
 - Rīgas Satiksmei sadarbībā ar JASPERS izstrādāt izmaksu – ieguvumu analīzi un sagatavot tehniski ekonomisko pamatojumu.
 - SM sadarbībā ar CFLA un Rīgas Domi jānodrošina profesionāla lielā projekta vadība un uzraudzība.

Rīcības plāns attiecībā uz dzelzceļa elektrifikācijas projektu:

- Līdz 30.06.2016. SM informēt valdību par Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta izpētes rezultātiem un sniegt priekšlikumus rīcībai attiecībā uz projekta saturu un ieviešanu, lai nodrošinātu projekta uzsākšanu plānotajā termiņā.
- Balstoties uz SM sniegto informāciju, jāpieņem lēmums par projekta turpināšanu. Gadījumā, ja veiktā analīze parādīs, ka plānotais lielais projekts vairs nav ekonomiski dzīvotspējīgs, SM steidzami jāsāk izvērtēt alternatīvas KF investīcijas dzelzceļa nozarē, kuru īstenošana būtu jāsāk 2017.gadā.



Ekonomikas ministrija (I)

4.2.1.1. pasākums “Daudzdzīvokļu ēku siltināšana”

- **Finansējums:** 166 470 588 EUR un 10 000 000 EUR ESCO atbalstam
- **Termiņš projektu īstenošanas uzsākšanai:**
 - Līdz š.g. aprīlim nodrošināt konsultatīva centra darbības uzsākšanu.
 - Līdz š.g. jūlijam nodrošināt programmas reālu uzsākšanu, lai gala labuma guvējiem būtu iespēja slēgt līgumus par energoefektivitātes pasākumiem.
- **Rīcības plāns programmas uzsākšanai:**
 - ALTUM izstrādā un EM izvērtē biznesa plānu, kā arī ALTUM iesniedz projekta pieteikumu CFLA, lai **aprīlī varētu tikt noslēgts līgums starp ALTUM un CFLA.**
 - EM ar ALTUM līdz līguma slēgšanai ar CFLA jāizstrādā MK noteikumu protokollēmumā noteiktos iekšējos normatīvos aktus, t.sk.:
 - Procedūru izsniegto grantu izdevumu attiecināmības uzraudzībai;
 - Metodiku energoefektivitātes projektu pārfinansēšanas novērtēšanai un noteikumos paredzētās granta intensitātes pārskatīšanas normas piemērošanai;
 - kārtību, kādā kontrolē un uzrauga izsniegto aizdevumu struktūru un ierosina šo noteikumu grozījumus, ja nepieciešams.
 - EM kopā ar FM turpināt risināt ar valsts atbalstu saistītos jautājumus, lai dzīvokļu īpašniekiem - juridiskām personām sniegtais atbalsts netiktu klasificēts kā *deminimis* atbalsts;
 - Turpināt vērtēt ESKO un pašvaldību kā finansētāju iesaistes iespējas un izstrādāt atbilstošo normatīvo bāzi.



Ekonomikas ministrija (II)

Finanšu instrumentu pasākumi

- **Finansējums:** 148 725 313 EUR
- **Termiņš projektu īstenošanas uzsākšanai:** atbalstam jābūt pieejamam uzņēmumiem nepieļaujot finansējuma pārrāvumu starp abu periodu finanšu instrumentu programmām.
- **Rīcības plāns:**
 - Ievērot horizontālajos MK noteikumos noteiktos termiņus ALTUM biznesa plāna apstiprināšanai un finanšu nolīguma slēgšanai. Apstiprināt finanšu instrumentu valsts atbalsta programmas, ievērojot informatīvā ziņojuma par ES fondu progresu līdz 2015.gada 31.decembrim 6.pielikumā noteikto laika grafiku.
 - Nodrošināt finansējuma piešķiršanas uzsākšanu gala labuma guvējiem, lai nerastos pārtraukums starp plānošanas periodiem.
 - 3.1.1.1. «Aizdevumu garantijas» ietvaros atbalsta sniegšana plānota š.g. jūlijā, šobrīd jau ir ierosināti grozījumi MK 26.10.2010 noteikumos Nr.997.
 - 3.1.1.2. «Mezanīna aizdevumi», 3.1.1.4. «Mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem» un 3.1.2.2. «Tehnoloģiju akselerators» jānodrošina MK noteikumu projektu saskaņošanu līdz š.g. maijam.
 - Ņemot vērā finanšu starpnieku ilgstošo atlases laika posmu, ierosinām pēc iespējas ātrāk uzsākt 3.1.1.3. «Biznesa enģeļu ko-investīciju fonds», kā arī turpināt 3.1.2.1. «Riskā kapitāls» MK noteikumu projekta saskaņošanas procesu.



Ekonomikas ministrija (III)

4.2.1.2. pasākums “Valsts ēku siltināšana”

- **Finansējums:** 115 127 027 EUR
- **Termiņš projektu īstenošanas uzsākšanai:** 2016.g. novembris
- **Rīcības plāns:**
 - EM sadarbībā ar ministrijām pabeigt visu resoru prioritāro ēku saraksta gatavošanu, lai MK noteikumus izsludinātu VSS 2016.gada martā un 2016.gada laikā uzsāktu pirmo projektu īstenošanu.
 - Nepieciešamības gadījumā ministrijām ar FM risināt jautājumu par ātrāku VNĪ iesaisti projektu sagatavošanā.
 - Vienoties ar JASPERS ekspertiem par iespējām pasākuma īstenošanā piesaistīt ESKO kompānijas.



Izglītības un zinātnes ministrija

8.1.3.SAM “Profesionālo skolu infrastruktūra”

- **Finansējums:** 104 786 645 EUR
- **Termiņš projektu īstenošanas uzsākšanai:** 2016.g. novembris
- **Rīcības plāns:**
 - IZM atbilstoši diskusiju rezultātiem ar EK un KDG lemtajam līdz š.g. maijam iesniedz MK apstiprināšanai MK noteikumus un uzsāk projektu atlasī ne vēlāk kā š.g. novembrī
 - Vienlaikus atbilstoši 15.03.2016. tikšanās ar EK pārrunātajam, nodrošināt atsevišķu nosacījumu attiecībā uz lietderīguma analīzi saskaņošanu ar EK.

8.4.1.SAM “Nodarbināto profesionālā kompetences attīstība”

- **Finansējums:** 27 034 565 EUR
- **Termiņš atlases uzsākšanai:** 2016.g. oktobris
- **Rīcības plāns:**
 - Saskaņot ar EK Pieaugušo izglītības plānu, lai pēc iespējas ātrāk virzītu to apstiprināšanai MK.



Veselības ministrija

9.3.2.SAM “Veselības infrastruktūras attīstība”

- **Finansējums:** 178 983 828 EUR
- **Termiņš projektu īstenošanas uzsākšanai:** 2017.g. marts
- **Rīcības plāns:** VM pēc Pasaules Bankas pētījuma nodevuma saņemšanas līdz 2016.g. aprīlim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai AK SAM ieviešanas nosacījumus un izsludināt VSS MK noteikumus.



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

5.3.1. «Ūdenssaimniecība»

- Kopējais finansējums: 148 910 808 EUR
- Termiņš projektu īstenošanas uzsākšanai: 2016.g. novembris
- Rīcības plāns:
 - VARAM nodrošināt kritēriju un MK noteikumu apstiprināšanu līdz š.g. maijam, vienojoties ar LPS un pašvaldībām par finansējuma sadalījumu un ieviešanas nosacījumiem SAM ietvaros.
 - Nevienošanās gadījumā jautājumu skatīt MKK
 - FM iesaistās, lai palīdzētu risināt domstarpības ar organizācijām.



Kultūras ministrija

5.6.1. «Degradēto teritoriju revitalizācijas Rīgā»

- Kopējais finansējums: 94 567 990 EUR
- Termiņš projektu īstenošanas uzsākšanai: 2016.g. septembris
- Rīcības plāns:
 - KM nodrošina MK noteikumu iesniegšanu valdībā līdz marta beigām.


5.5.1. «Dabas un kultūras mantojums»

- Kopējais finansējums: 41 400 653 EUR
- Termiņš projektu īstenošanas uzsākšanai: 2016.g. jūlijs
- Rīcības plāns:
 - KM nodrošina MK noteikumu iesniegšanu valdībā līdz marta beigām.
 - Līdz š.g. jūnijam veikt projektu ideju priekšatlasi uz skaidri definētiem (MK noteikumos), ekonomiski pamatoti un DP nosacījumiem atbilstošiem kritērijiem.



Ekonomikas ministrijas veicamo uzdevumu laika grafiks


SAM/pasākumu kopējais skaits	21
SAM kopējais KP finansējums, euro	771 214 622

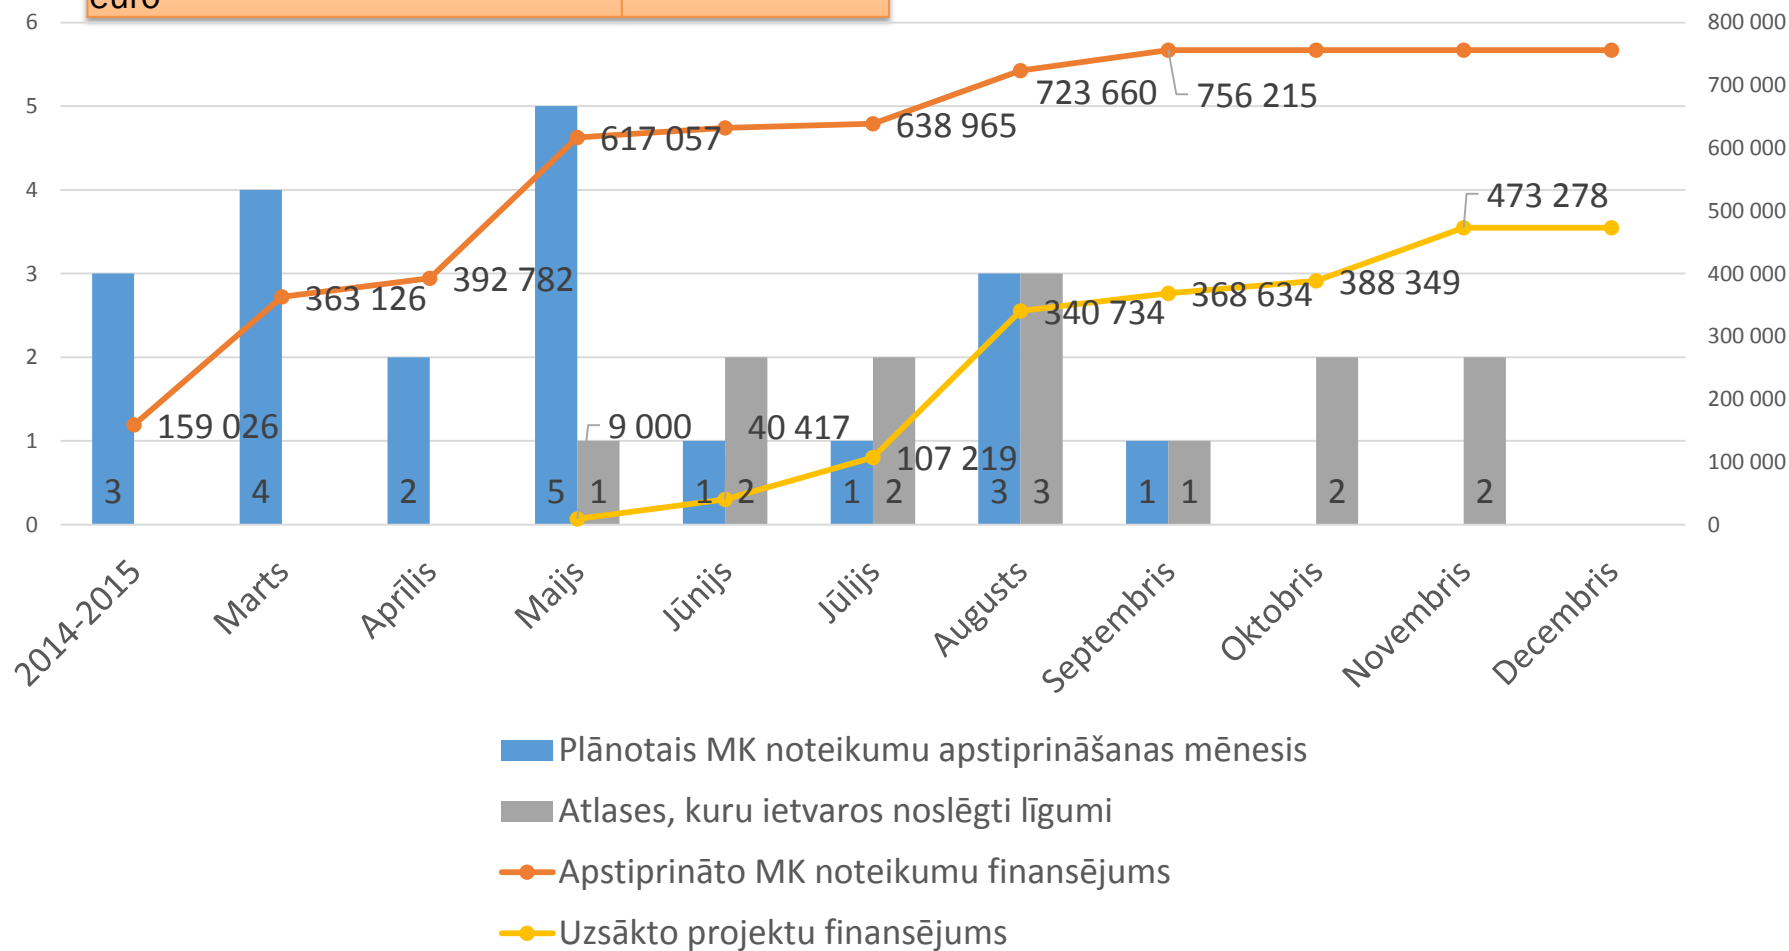



Izglītības un zinātnes ministrijas veicamo uzdevumu laika grafiks


SAM/pasākumu kopējais skaits	27
SAM kopējais KP finansējums, euro	784 208 468

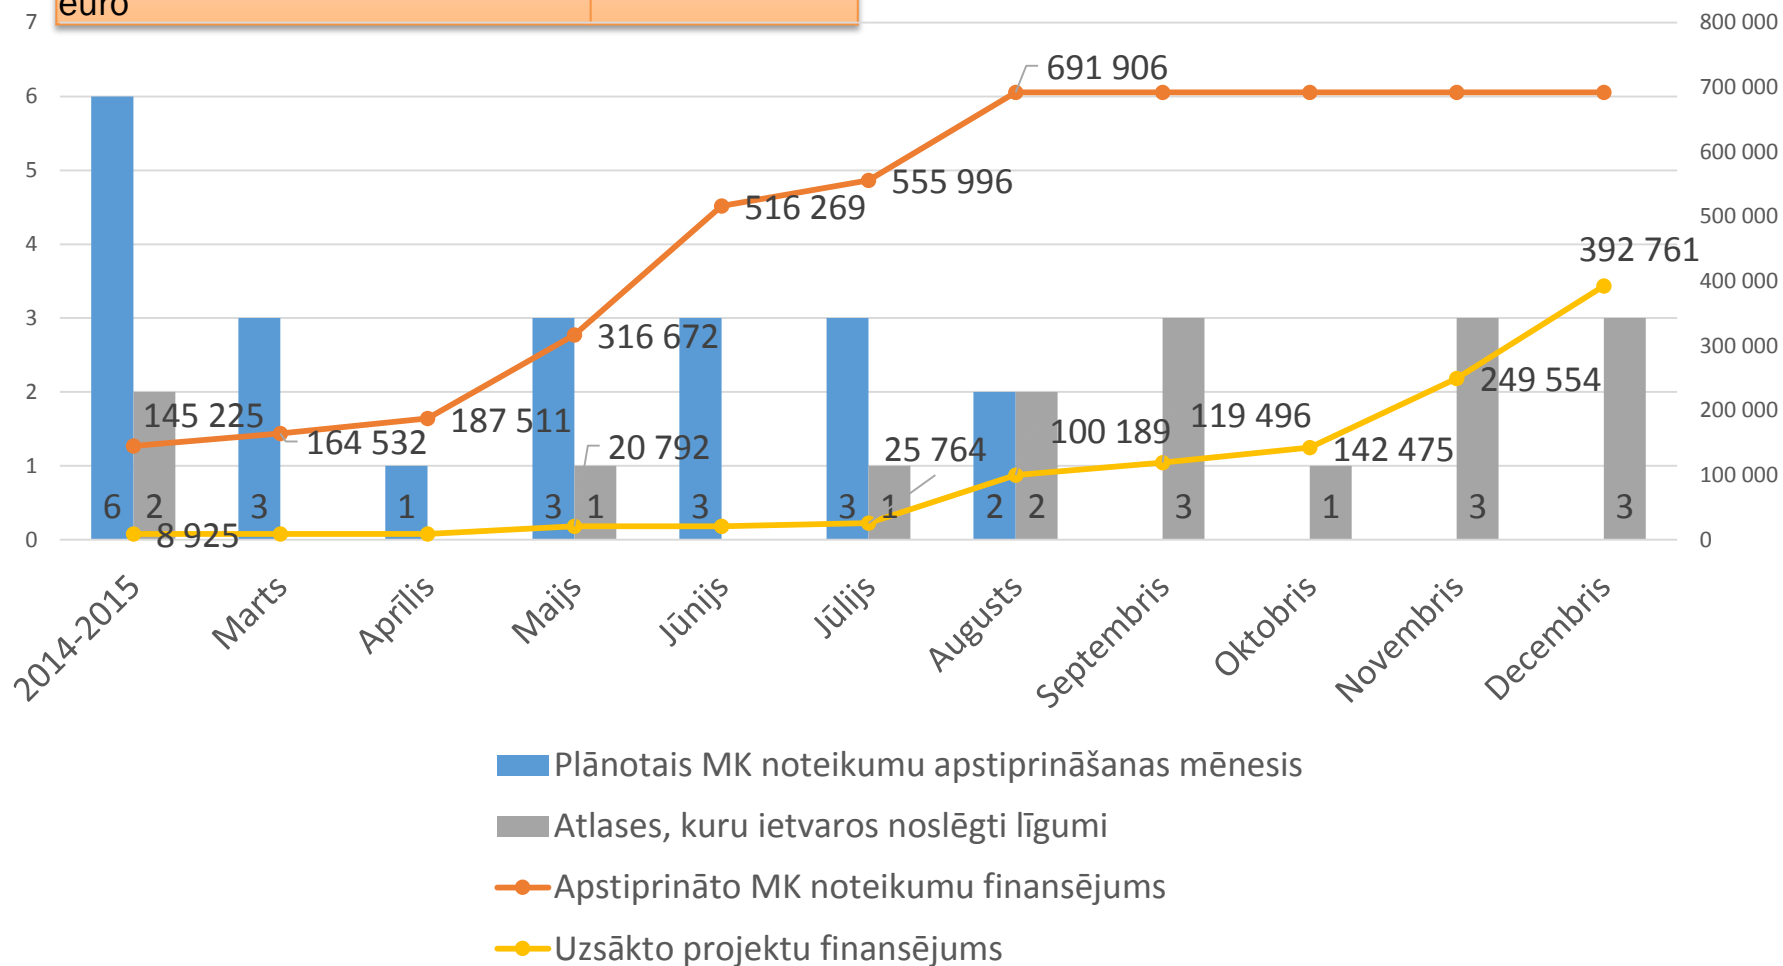



Kultūras ministrijas veicamo uzdevumu laika grafiks

SAM/pasākumu kopējais skaits	2
SAM kopējais KP finansējums, euro	115 573 346

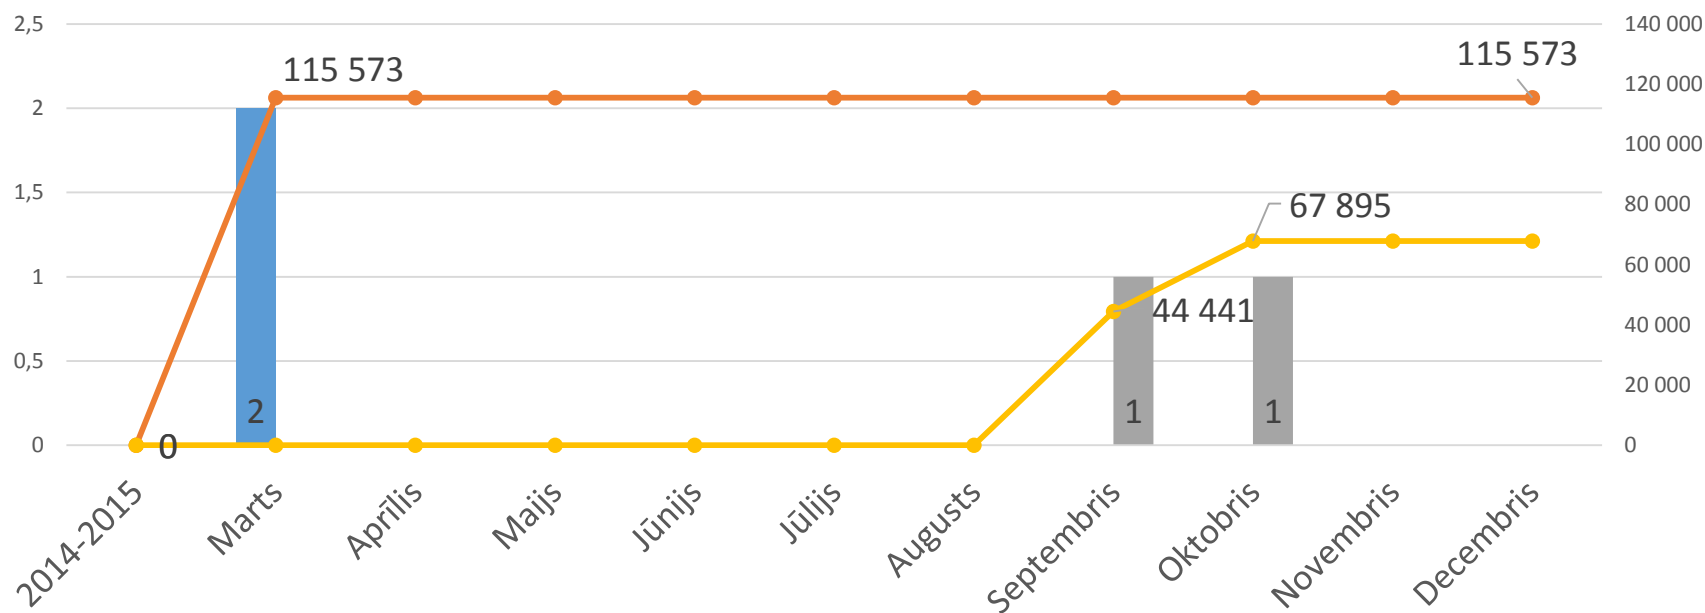


- Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas mēnesis
- Atlauses, kuru ietvaros noslēgti līgumi
- Apstiprināto MK noteikumu finansējums
- Uzsākto projektu finansējums



Labklājības ministrijas veicamo uzdevumu laika grafiks

SAM/pasākumu kopējais skaits	22
SAM kopējais KP finansējums, euro	349 762 153

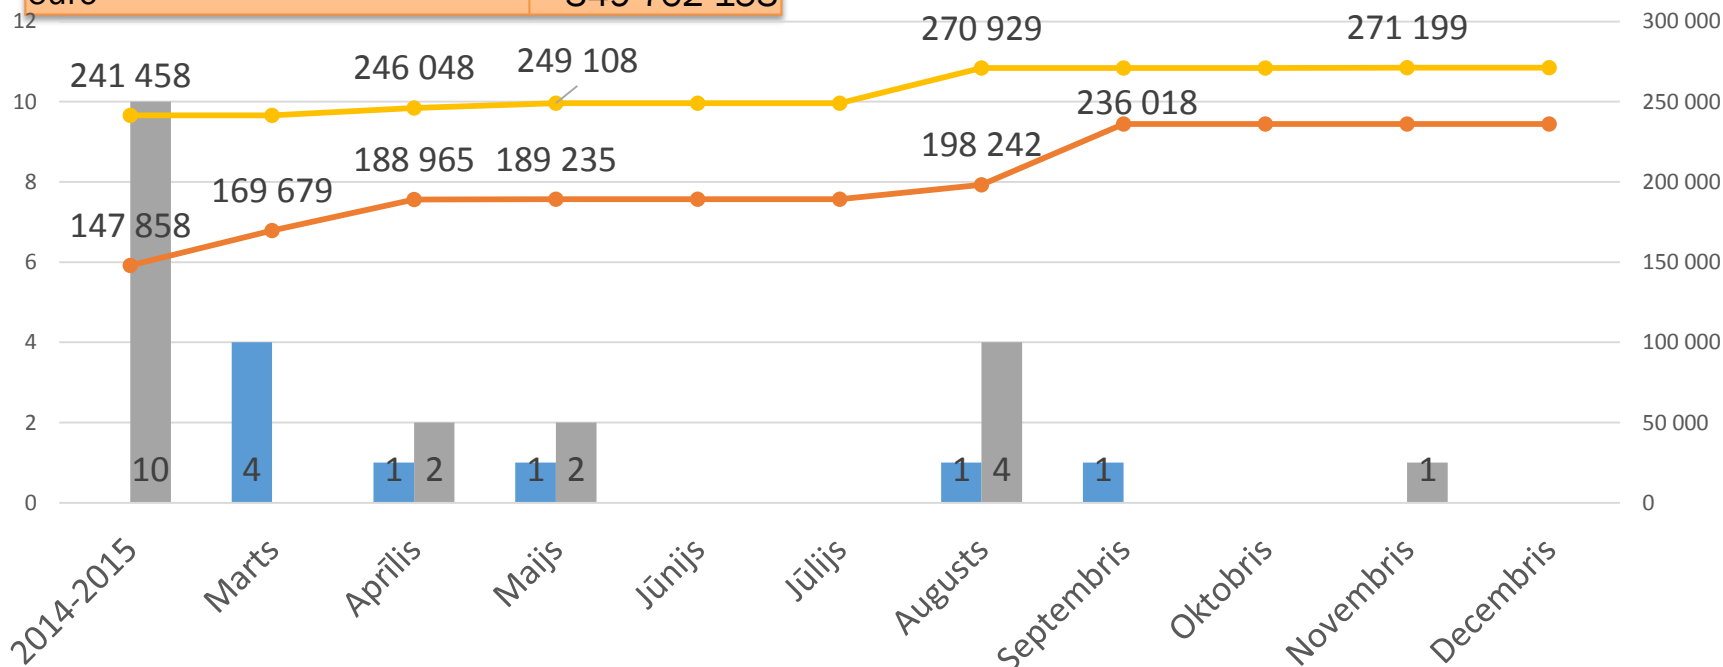


- Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas mēnesis
- Atlases, kuru ietvaros noslēgti līgumi
- Apstiprināto MK noteikumu finansējums
- Uzsākto projektu finansējums



Satiksmes ministrijas veicamo uzdevumu laika grafiks

SAM/pasākumu kopējais skaits	14
SAM kopējais KP finansējums, euro	1 319 355 340

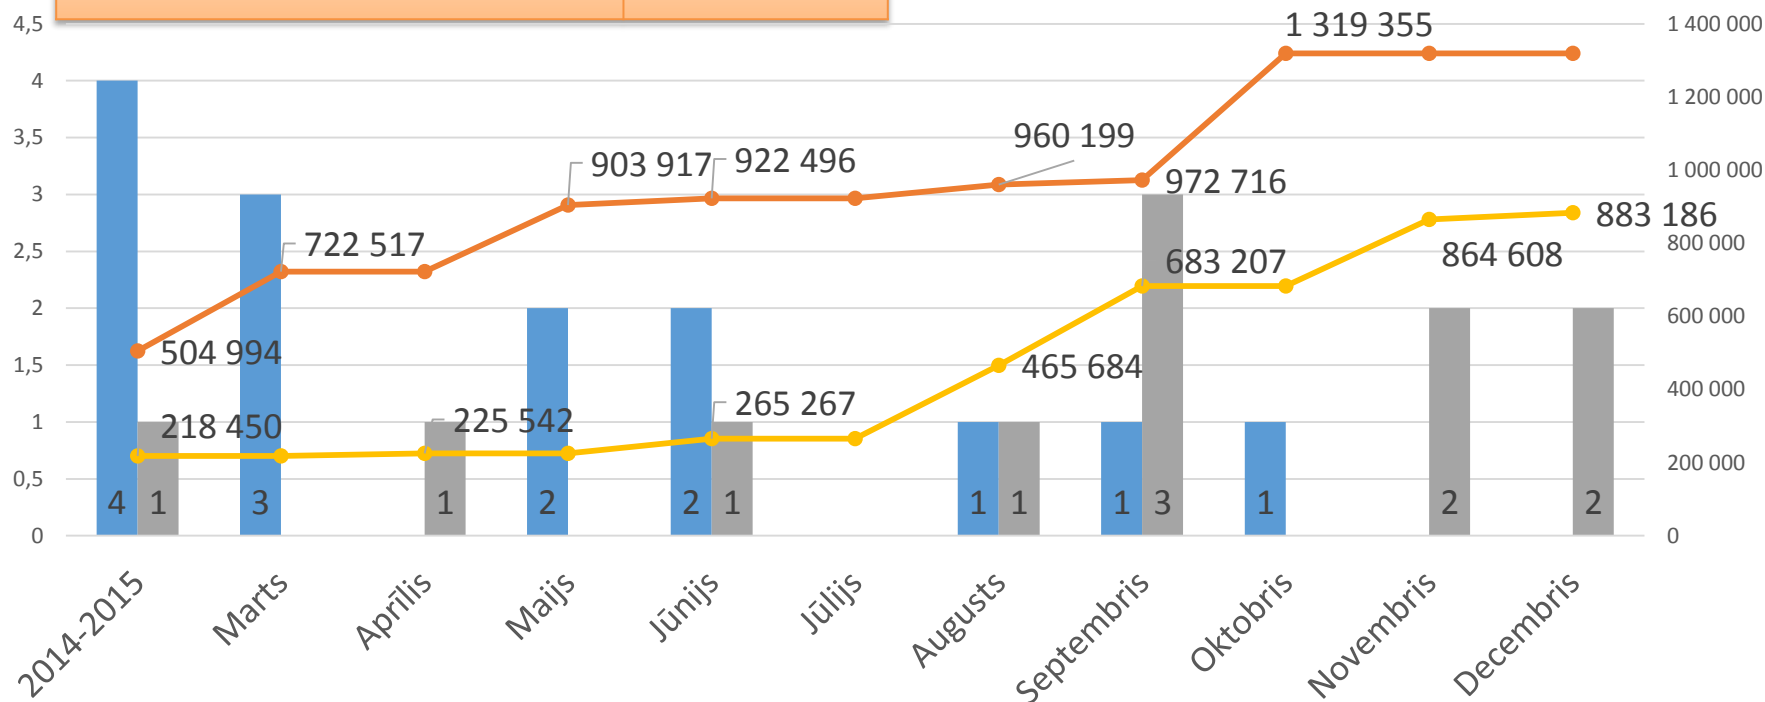


- Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas mēnesis
- Atlašes, kuru ietvaros noslēgti līgumi
- Apstiprināto MK noteikumu finansējums
- Uzsākto projektu finansējums



Tieslietu ministrijas veicamo uzdevumu laika grafiks

SAM/pasākumu kopējais skaits	3
SAM kopējais KP finansējums, euro	17 992 213

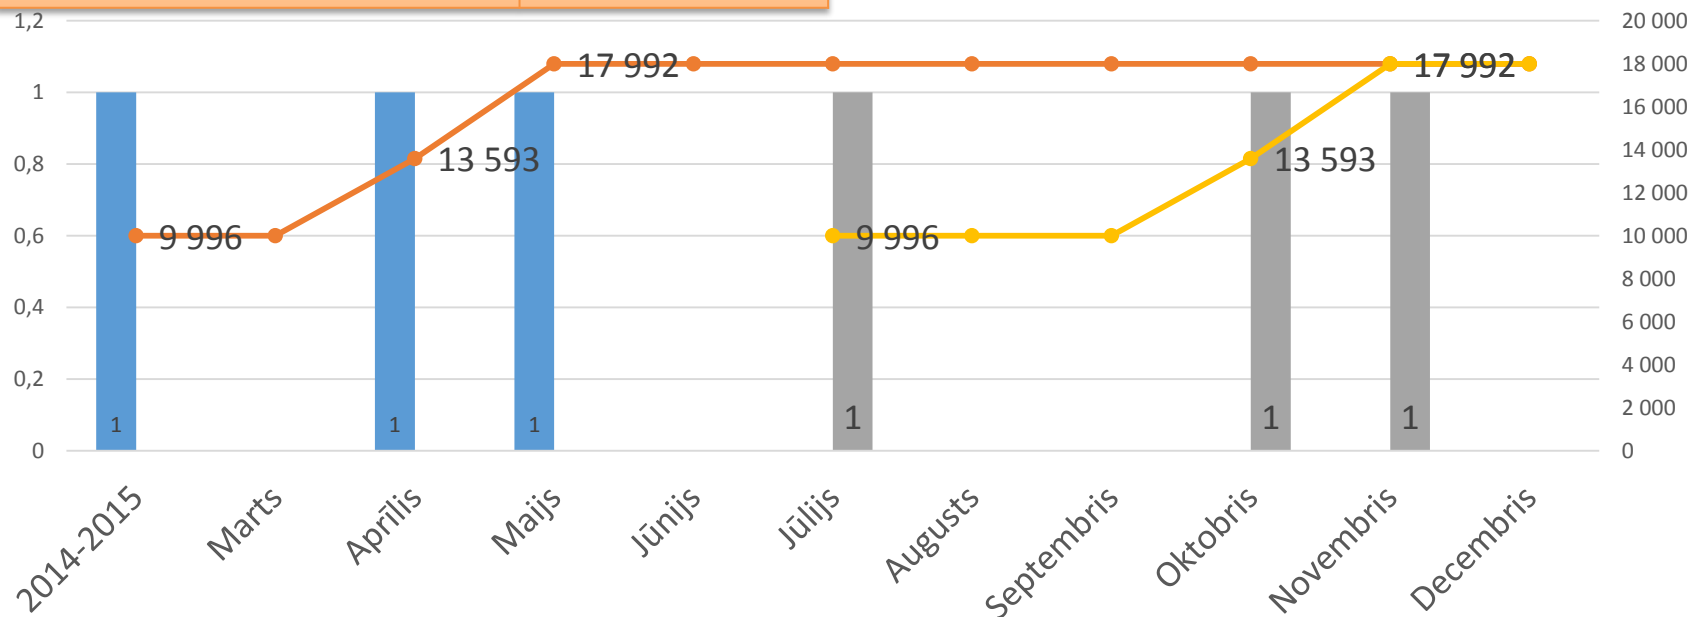


- Plānotais MK noteikumu apstiprināšanas mēnesis
- Atlases, kuru ietvaros noslēgti līgumi
- Apstiprināto MK noteikumu finansējums
- Uzsākto projektu finansējums



Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veicamo uzdevumu laika grafiks

SAM/pasākumu kopējais skaits	15
SAM kopējais KP finansējums, euro	689 820 689

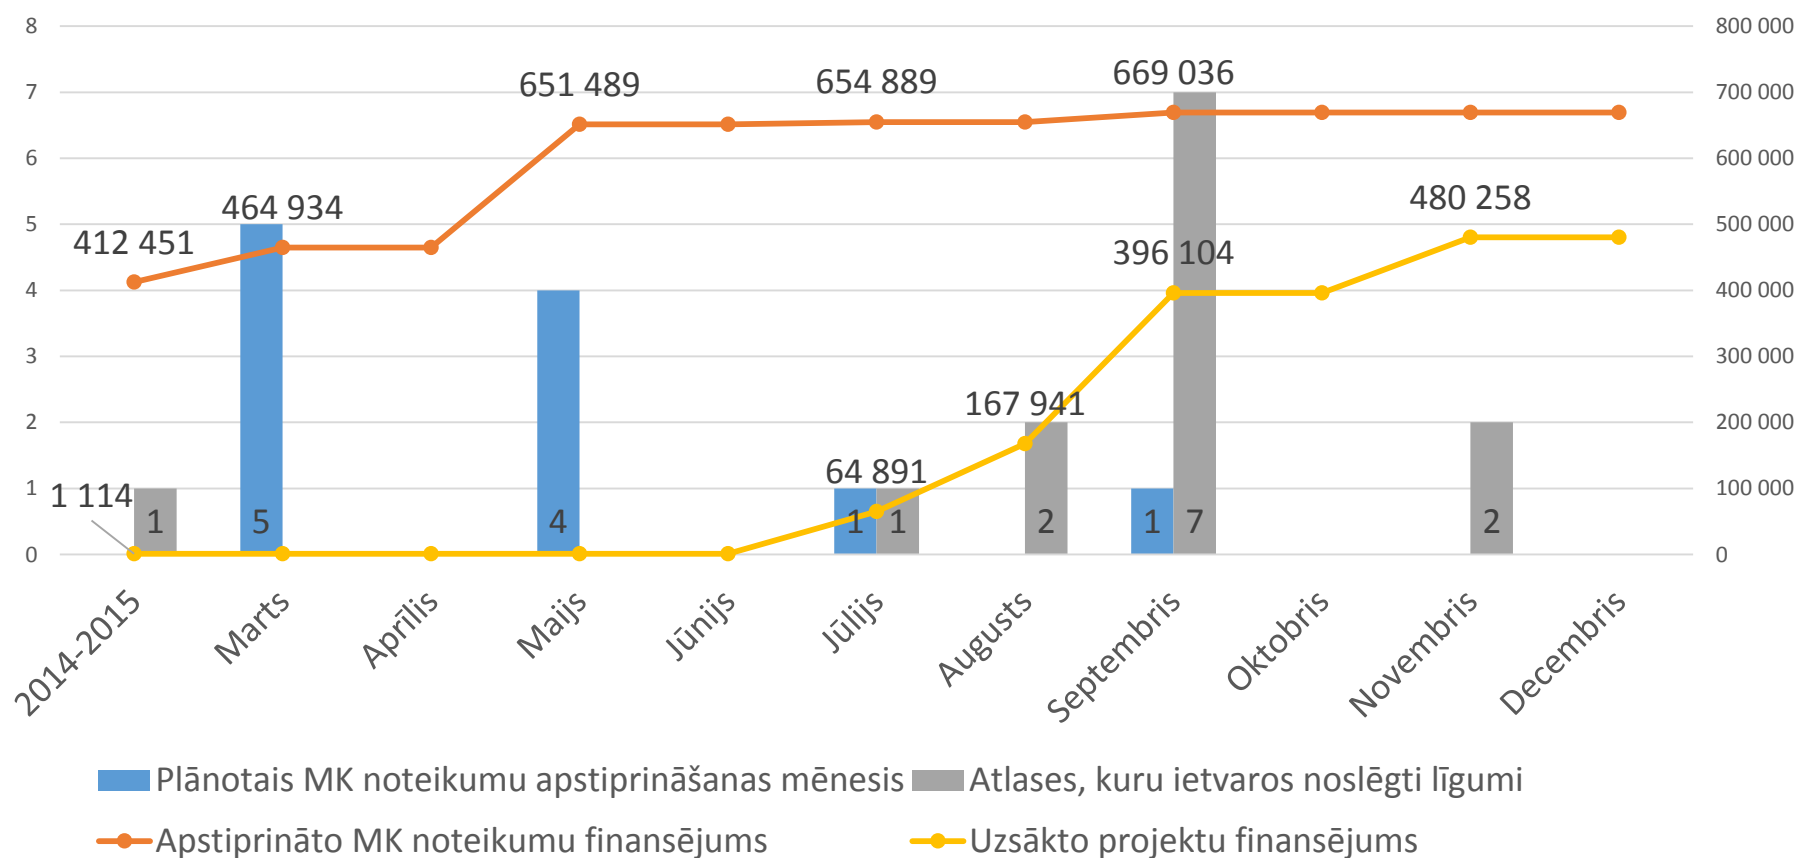




Valsts kancelejas veicamo uzdevumu laika grafiks

SAM/pasākumu kopējais skaits	1
SAM kopējais KP finansējums, euro	8 067 683
Projekts apstiprināts 2015. gada decembrī	



Veselības ministrijas veicamo uzdevumu laika grafiks

SAM/pasākumu kopējais skaits	6
SAM kopējais KP finansējums, euro	230 949 123

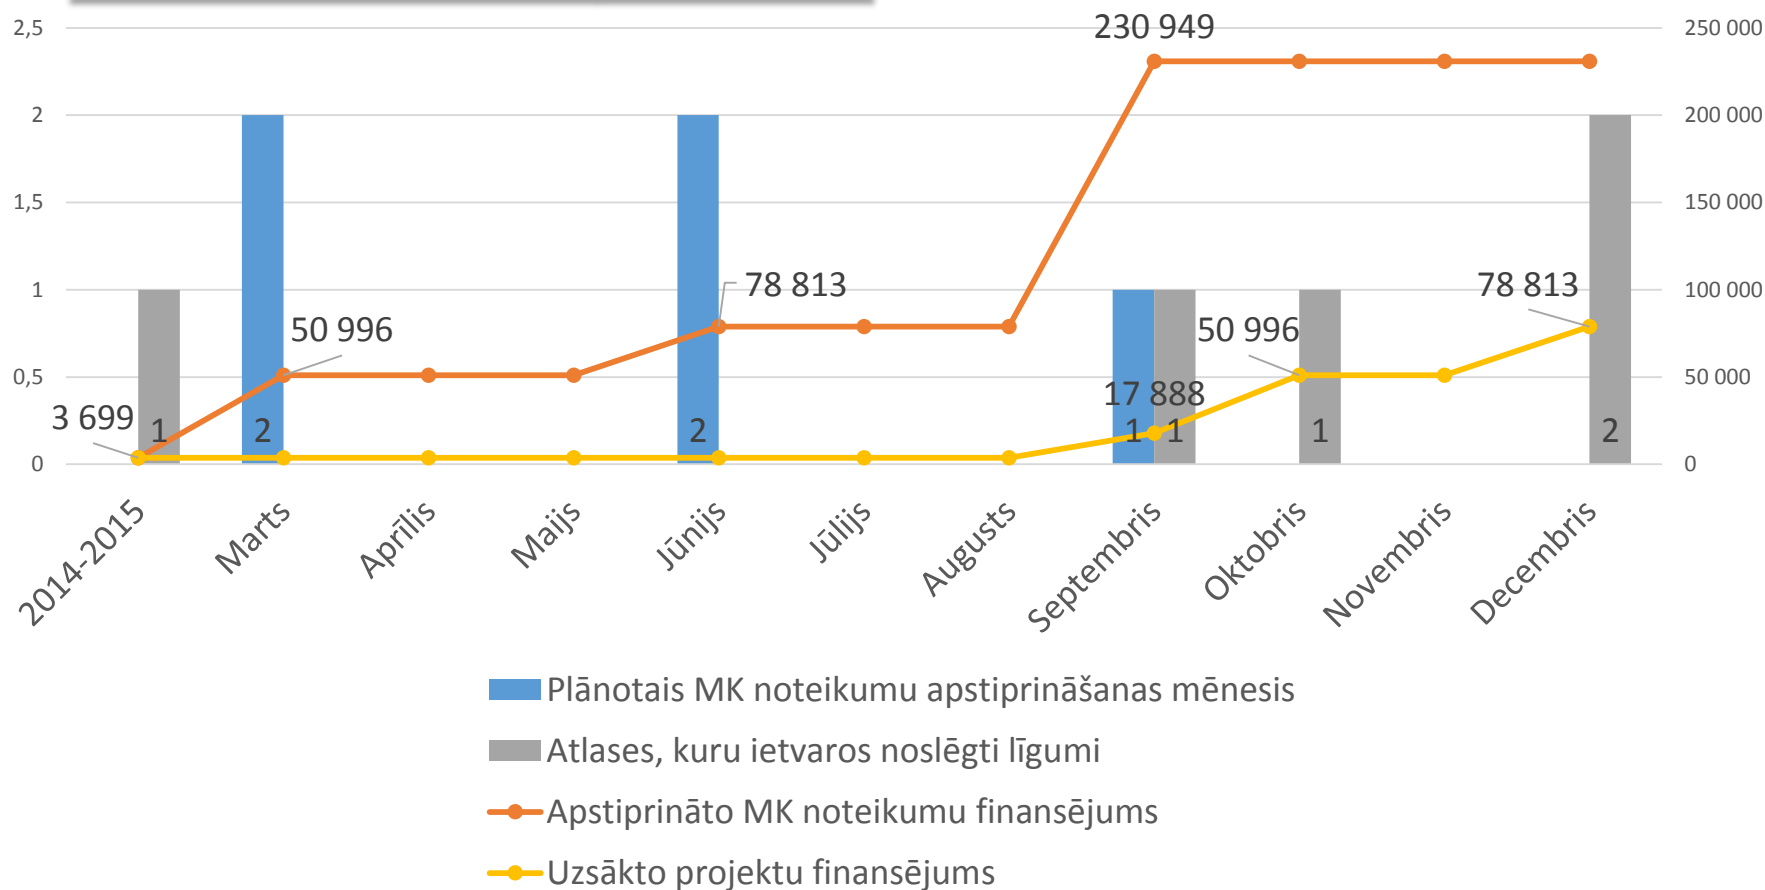



Zemkopības ministrijas veicamo uzdevumu laika grafiks

SAM/pasākumu kopējais skaits	1
SAM kopējais KP finansējums, euro	36 881 516

