



LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
strukturfondi un
Kohēzijas fonds


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU 2014.-2020.GADA
PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS
AKTUĀLAIS STATUSS
KĀRTĒJIE IKMĒNEŠA UN PUSGADA ZIŅOJUMI

Finanšu ministrija, 20.09.2016.




Latvijai 4.vieta, saņemot starpposma maksājumus (dati uz 12.09.2016.)

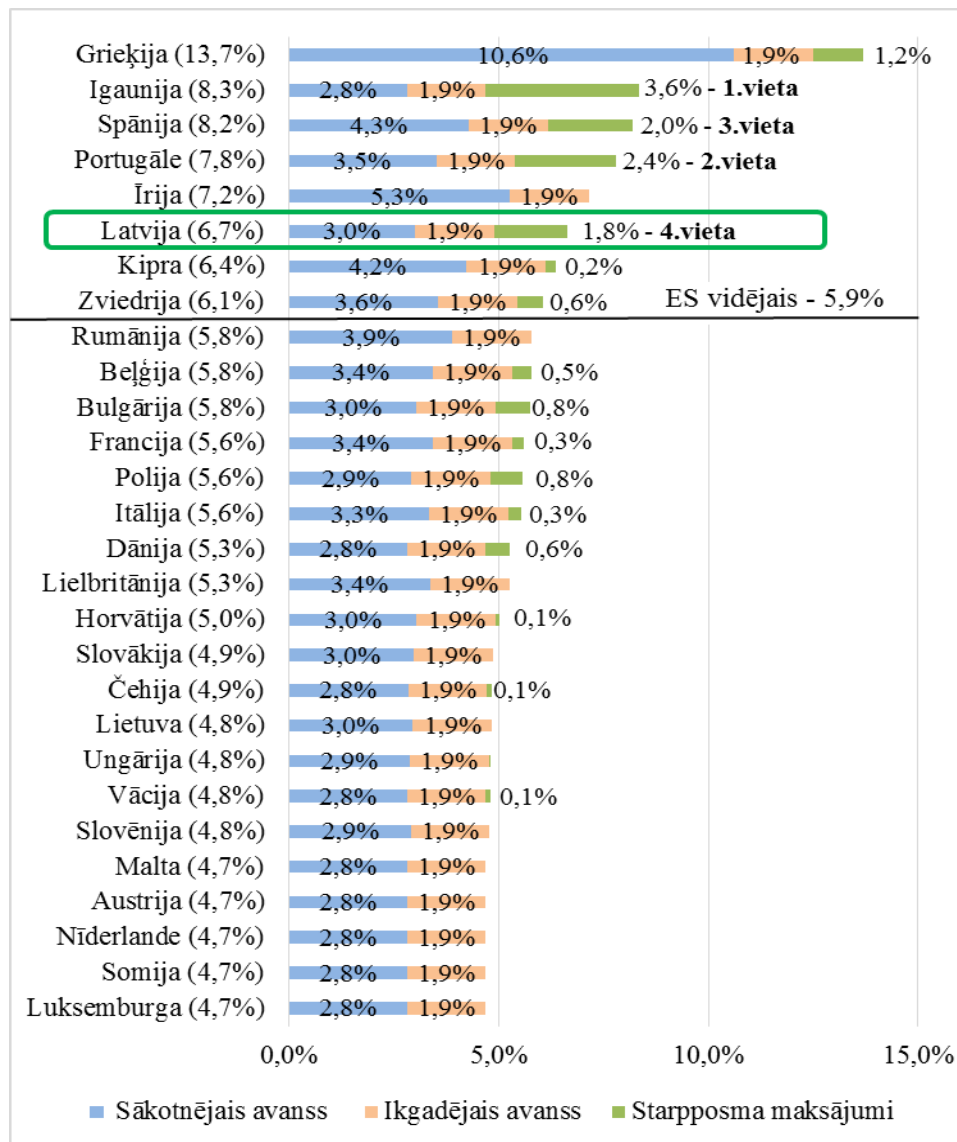



Arvien intensīvāks ir projektu atlasu un projektu ieviešanas posms!


Statuss līdz **01.09.2016.**, milj. *euro*, % no ES fondu finansējuma,
progress % pret **01.08.2016.**

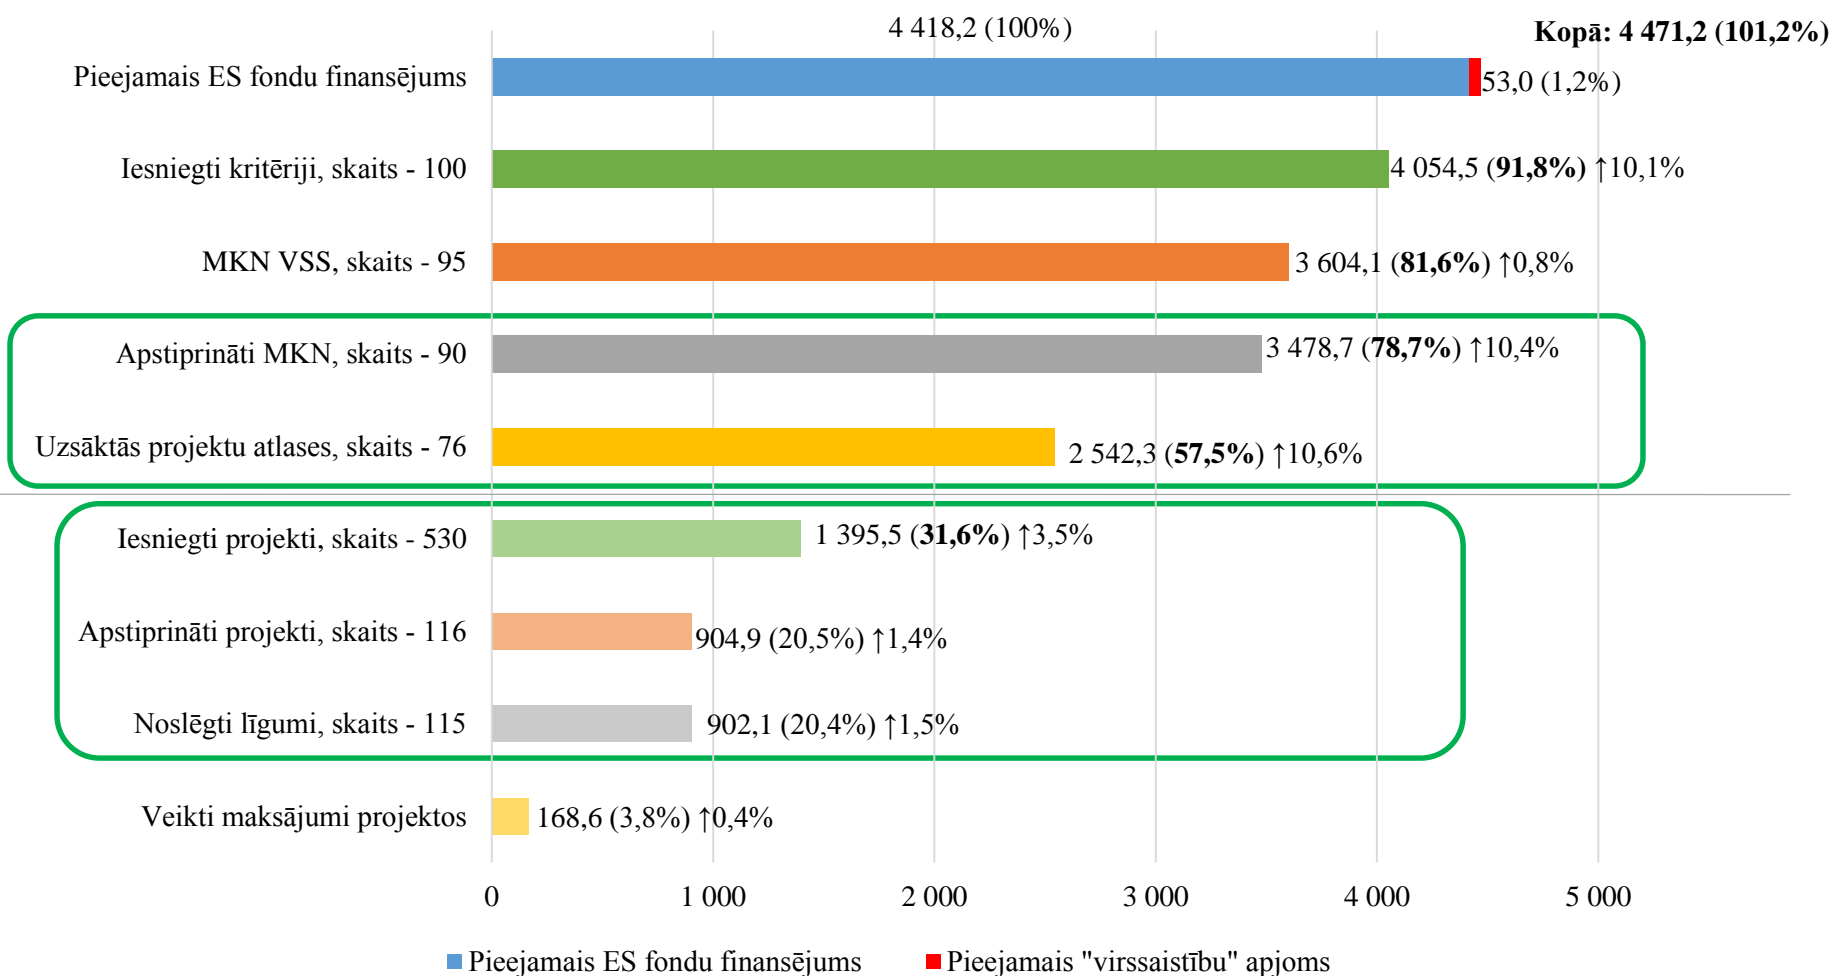




Līdz 2016 g. septembra beigām paredzama 90,5% plāna izpilde.
Joprojām iespējams sasniegt uzstādīto mērķi - līdz 2016 g. beigām valdībā apstiprināt investīciju noteikumus vismaz 90% no kopējās ES «aplaksnes»!

Prognozētā gada izpilde – lielākā nobīde uz 2017.g. veselības sektora MKN

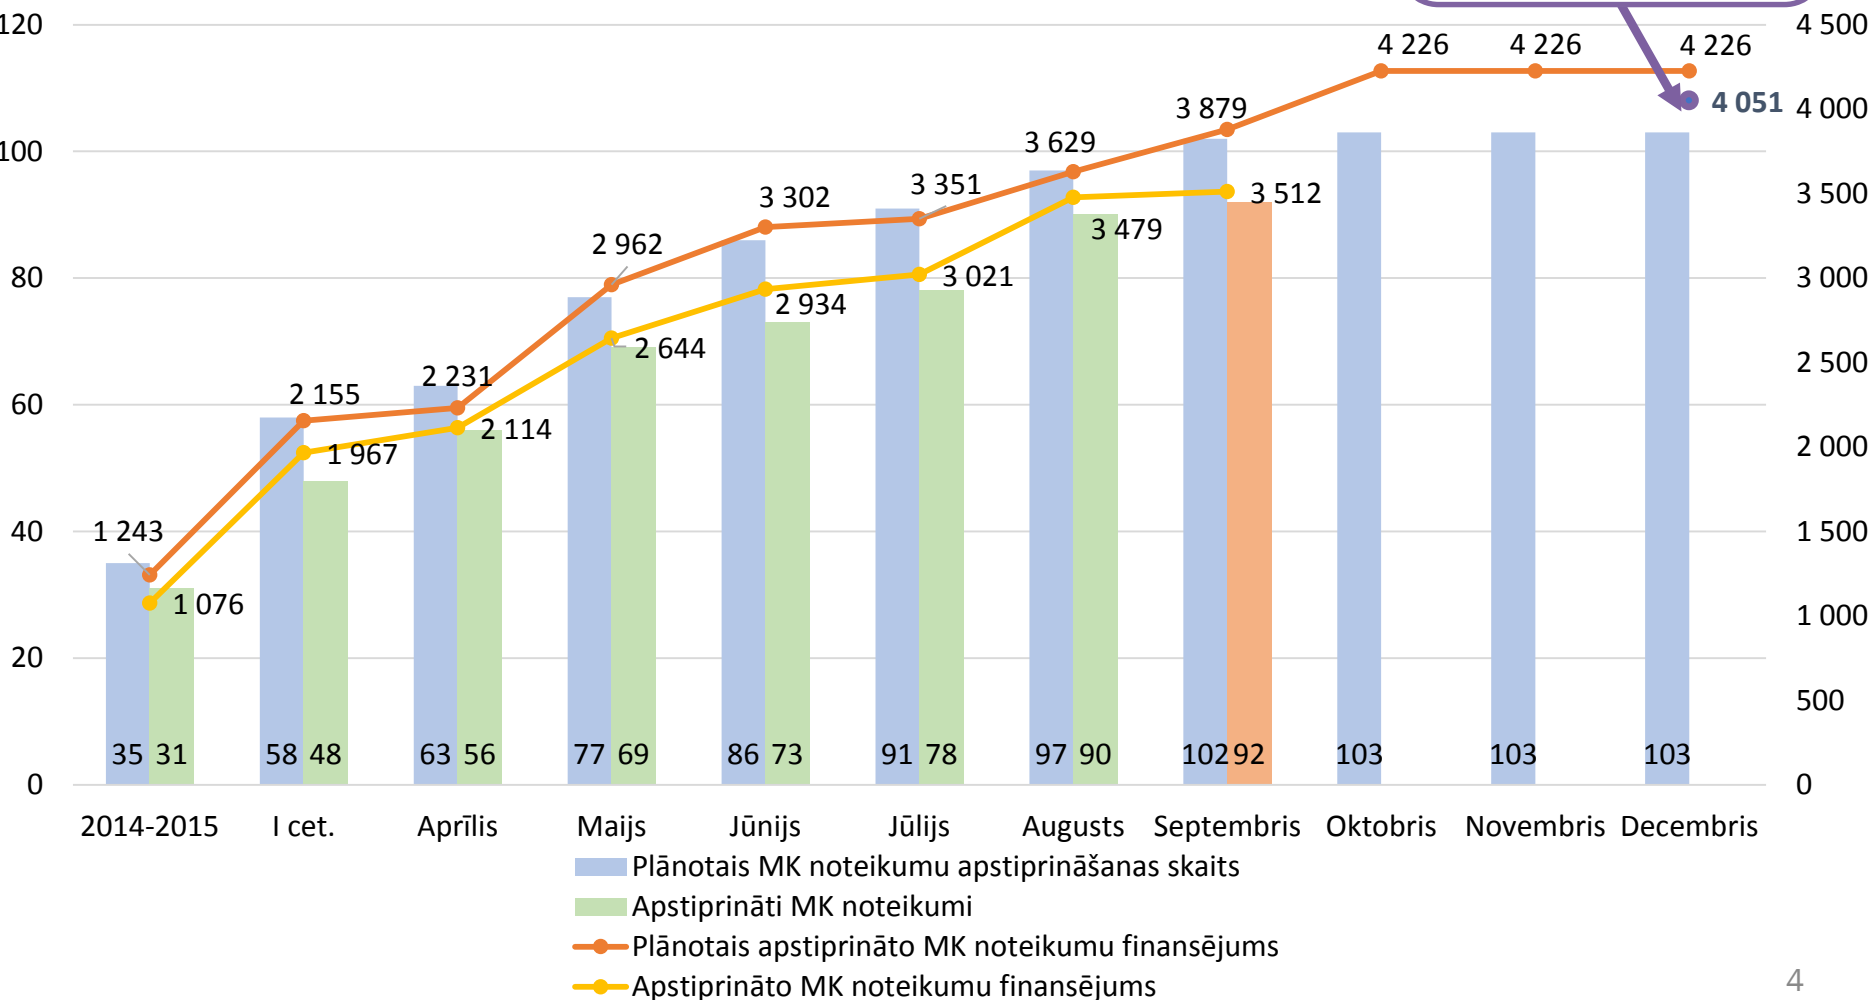



MK noteikumu apstiprināšana līdz 2016 g septembra beigām

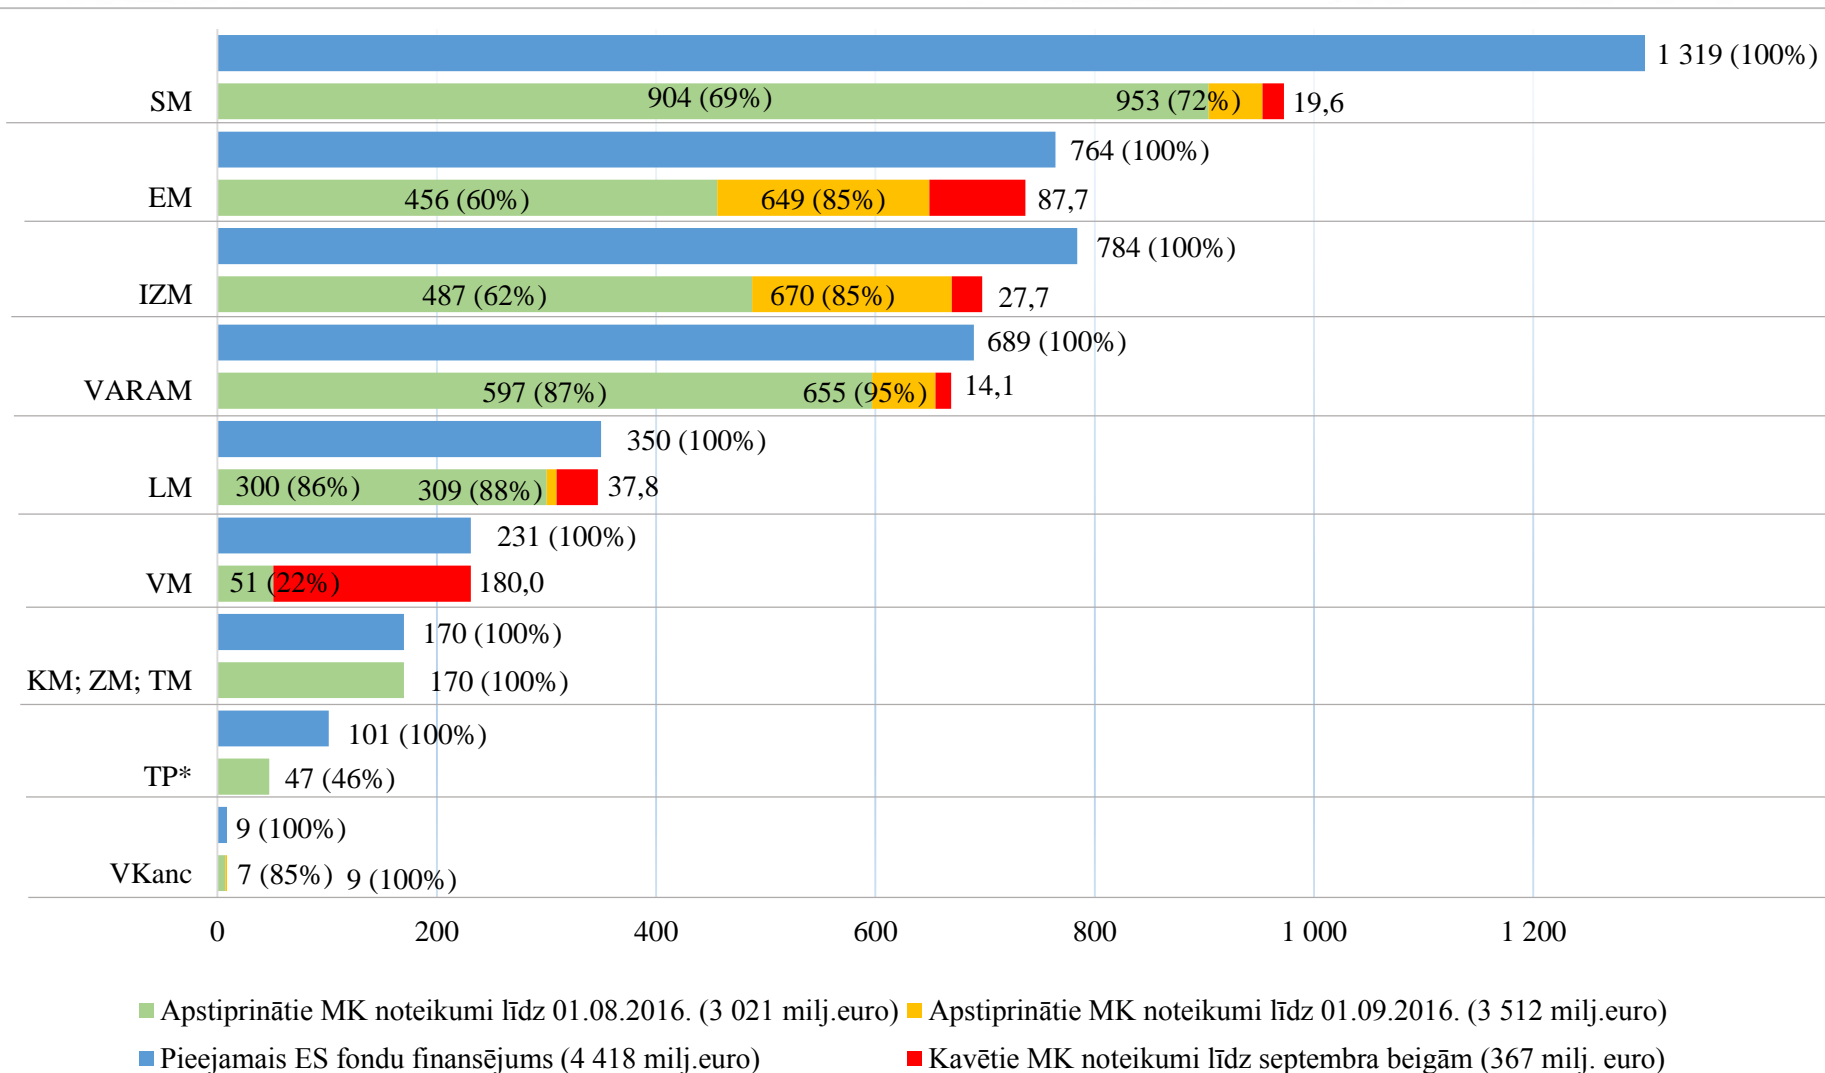


* Pārējos MK noteikumus par tehnisko palīdzību (TP) atbilstoši SAM laika grafikam apstiprinās 2018.gadā.



Aktuālākie atrisināmie jautājumi :


- 1) **Veselības infrastruktūra** (152 milj. euro, ERAF). – VM jāveic tādi pasākumi nacionālo politikas plānošanas dokumentu izstrādei un attiecīgiem Darbības programmas grozījumiem, lai ES fondu investīciju MK noteikumi tiktu apstiprināti līdz 2016.gada beigām (VM 12.09.2016. iesniegtais valdībā rīcības plāns paredz MK noteikumu apstiprināšanu tikai 2017.gada aprīlī) – ievērojams risks zaudēt ES finansējumu, kavējoties.
- 2) **Dzelzceļa elektrifikācijas projekts (346,6 milj. euro, KF)** – ievērojams risks zaudēt ES finansējumu, kavējoties, tādēļ vienošanās ar SM:
 - a) 2016.gada 25.oktobra valdības sēdē SM priekšlikums par Izmaksu ieguvumu analīzes rezultātā izvēlēto projekta maršrutu,
 - b) 2016.gada 29.novembra valdības sēdē ES fondu investīciju MK noteikumu apstiprināšana, lai 2016.gada novembrī varētu uzsākt projektu iesniegumu atlasī.
- 3) **Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas** (sanācijas) projekta pabeigšana – 07.06. EK apstiprinājusi dalīšanu posmos. VARAM līdz 31.12.2016 valdībai jāsniedz priekšlikums par finanšu avotiem (2.posmam indikatīvi 26,7 – 29,7 milj. euro), kas nerada negatīvu ietekmi uz valsts budžeta fiskālo telpu vidējā termiņā.
- 4) Novērst nākamo gadu investīciju «absorbcijas» kapacitātes un nozaru-ekonomikas «pārkaršanas» risku (t.sk. 2016.g. septembra Latvijas būvniecības nozares pārstāvju «Latvijas Būvuzņēmēju partnerība» vēstulē no EM, FM, VARAM, MP – **naudas plūsmas sabalansēšana vidējā termiņā.**



2016.g. «dabisks» prognozētais investīciju «kritums» periodu pārejas posmā.

IZAICINĀJUMI TURPMĀKIEM GADIEM - šī brīža plāns būtiskam investīciju

«pīķim 2017-2021 g virs līdzšinējās Latvijas «absorbcijas» spējas vidēji 650 milj EUR gadā rada **«pārkaršanas» risku** (īpaši, ja indik.70% ar būvniecību saistīts) – iespējama negatīva ietekme uz investīciju cenu un kvalitāti un spēju realizēt projektus plānotajā laikā un apjomā!

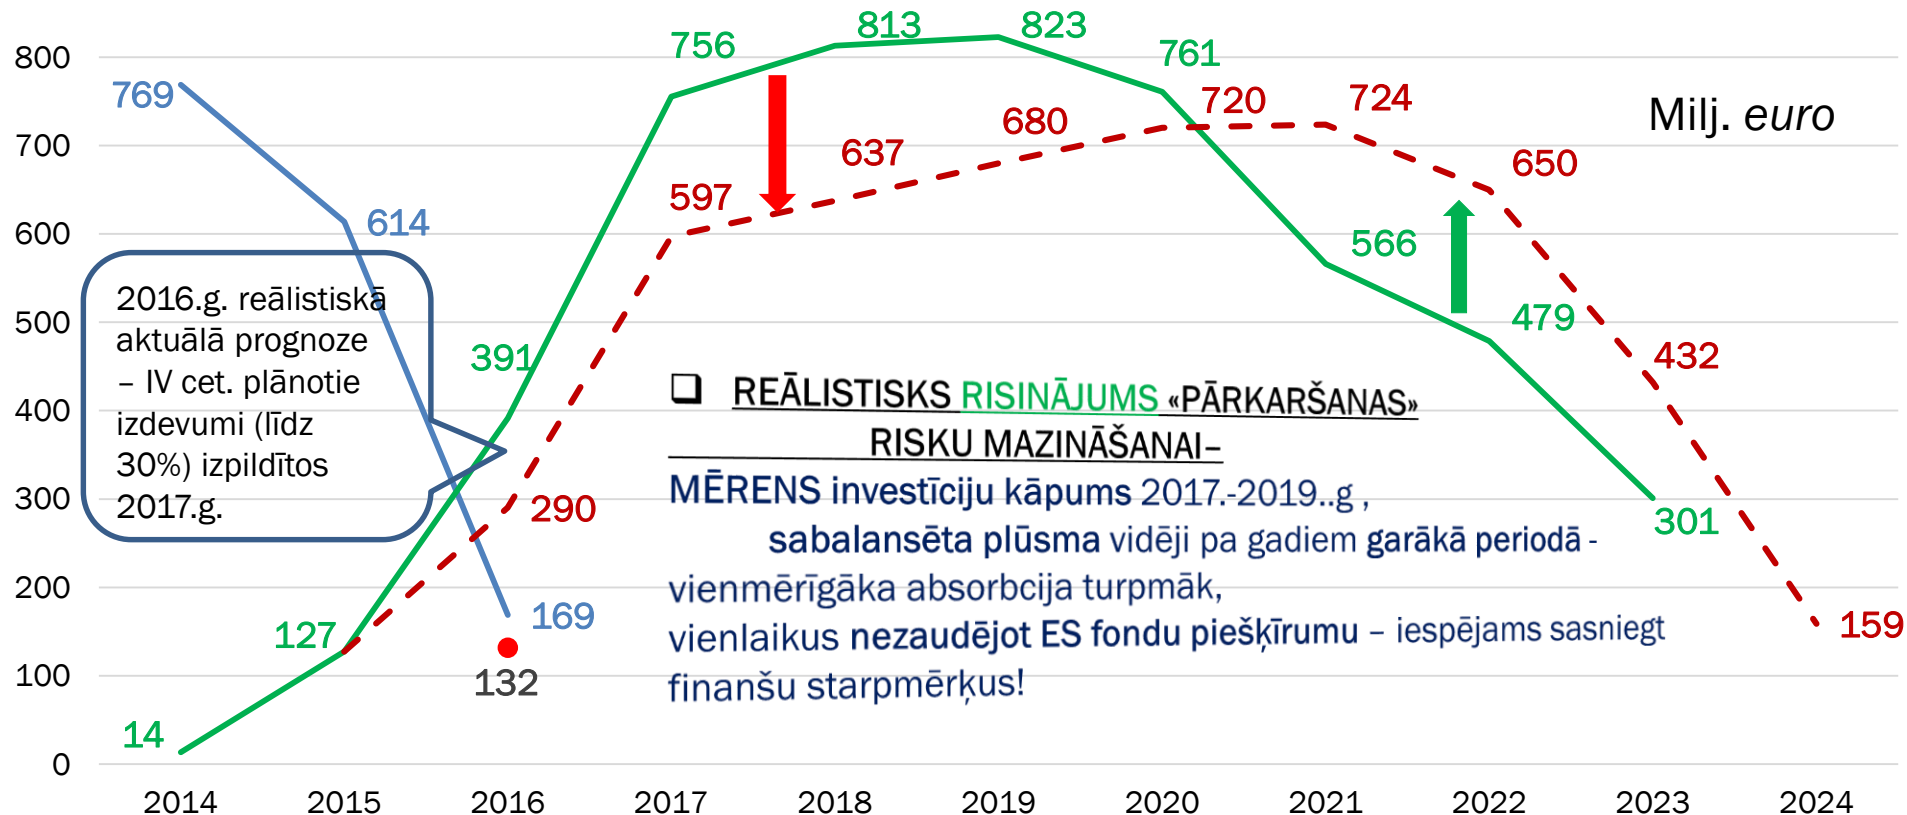

□ **REĀLISTISKS RISINĀJUMS «PĀRKARŠANAS»**

RISKU MAZINĀŠANAI-

MĒRENS investīciju kāpums 2017.-2019..g ,

sabalansēta plūsma vidēji pa gadiem garākā periodā -

vienmērīgāka absorbcija turpmāk,

vienlaikus nezaudējot ES fondu piešķirumu - iespējams sasniegt

finanšu starpmērķus!

— 08.07.2016. budžeta plūsma 2007.-2013. gada plānošanas periodam (kopā 5 198 milj. euro)

— 08.07.2016. budžeta plūsma 2014.-2020. gada plānošanas periodam (kopā 5 030 milj. euro)

● 01.09.2016. budžeta izpilde 2016.gadā 2014.-2020.gada plānošanas periodam, euro

- - 14.09.2016. budžeta projekcija optimālam investīciju līmenim, balstoties uz 2007.-2013. perioda ES fondu absorbcijas kapacitāti



**Nemot vērā iepriekš minēto –
ierosinām lemt MK sēdes laikā par papildinājumu MK
protokollēmumam :**

Nemot vērā turpmākos gados sagaidāmo ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanas pieaugošo intensitāti un nepieciešamību sabalansēt investīciju faktoru pieprasījumu – piedāvājumu, tai skaitā darba spēka pieejamību un kapacitāti, nozaru griezumā (īpaši būvniecībā),

uzdot Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar iesaistītām nozaru ministrijām un nozaru speciālistiem **veikt analīzi** par kopumā valstī sagaidāmām publiskām un privātām investīcijām un nepieciešamo resursu pieejamību un ietekmi uz tirgus cenu un kvalitāti, analizējot ekonomikas pārkaršanas riskus. **Ekonomikas ministrijai, balstoties uz veikto analīzi, līdz 2016.gada 31.decembrim informēt valdību par secinājumiem un konkrētiem priekšlikumiem nepieciešamai rīcībai, lai novērstu vai mazinātu ekonomikas pārkaršanas riskus un sabalansētu Kohēzijas politikas ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda optimālu investīciju plūsmu.**



LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

The screenshot shows the homepage of the website www.esfondi.lv. The header includes the Latvian National Development Plan 2020 logo, the European Union flag, and the text "EIROPAS SAVIENĪBA" (European Union). The main navigation bar contains links for "Jaunumi", "Īsteno projektu!", "ES fondi 2014 - 2020", "Iepriekšējie periodi", "Kohēzijas politika", "Materiāli", "Kontakti", and "Citas programmas". The main content area features a large banner with the European Union flag and the text "Est sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!". Below the banner, there are three main sections: "Jaunumi" (News), "Īsteno projektu!" (Implementing projects!), and "Informatīvie pasākumi" (Informational events). The "Jaunumi" section lists several news items from May 2016, including a meeting on ES funds projects, a seminar on energy efficiency, and a seminar on integrated transport systems. The "Īsteno projektu!" section provides information on the implementation of EU funds projects, including a list of project atlases and a call to action to submit projects. The "Informatīvie pasākumi" section features a calendar for May 2016, highlighting a seminar on the ERAF project selection process on May 10th.
