


INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU (IKMĒNEŠA ZIŅOJUMS)

Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) informē par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu ikmēneša aktualitātēm 2019. gada novembrī - decembrī¹.





1,8 mljrd. *euro* ES fondu līdzfinansējums jau ir izmaksāts 1 674 investīciju projektu īstenošanas atbalstam, kas ir gandrīz 40 % no 4,4 mljrd. *euro* 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmā paredzētā finansējuma. Pozitīva dinamika turpinās projektu ieviešanas attīstības pakāpē – noslēgtie iepirkumu līgumi ir vairāk kā par trešo daļu no paredzētās summas. Nākamais Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) maksājums Latvijas valsts budžetā par veiktiem projektu izdevumiem sagaidāms 2019. gada beigās – 2020. gada sākumā. Skatīt ilustrāciju Nr. 1 un Nr. 2.

Ilustrācija Nr. 1 “ES fondu investīcijas līdz 2019. gada 1. decembrim, milj. euro, % no ES finansējuma, pret datiem līdz 2019. gada 1. novembrim”

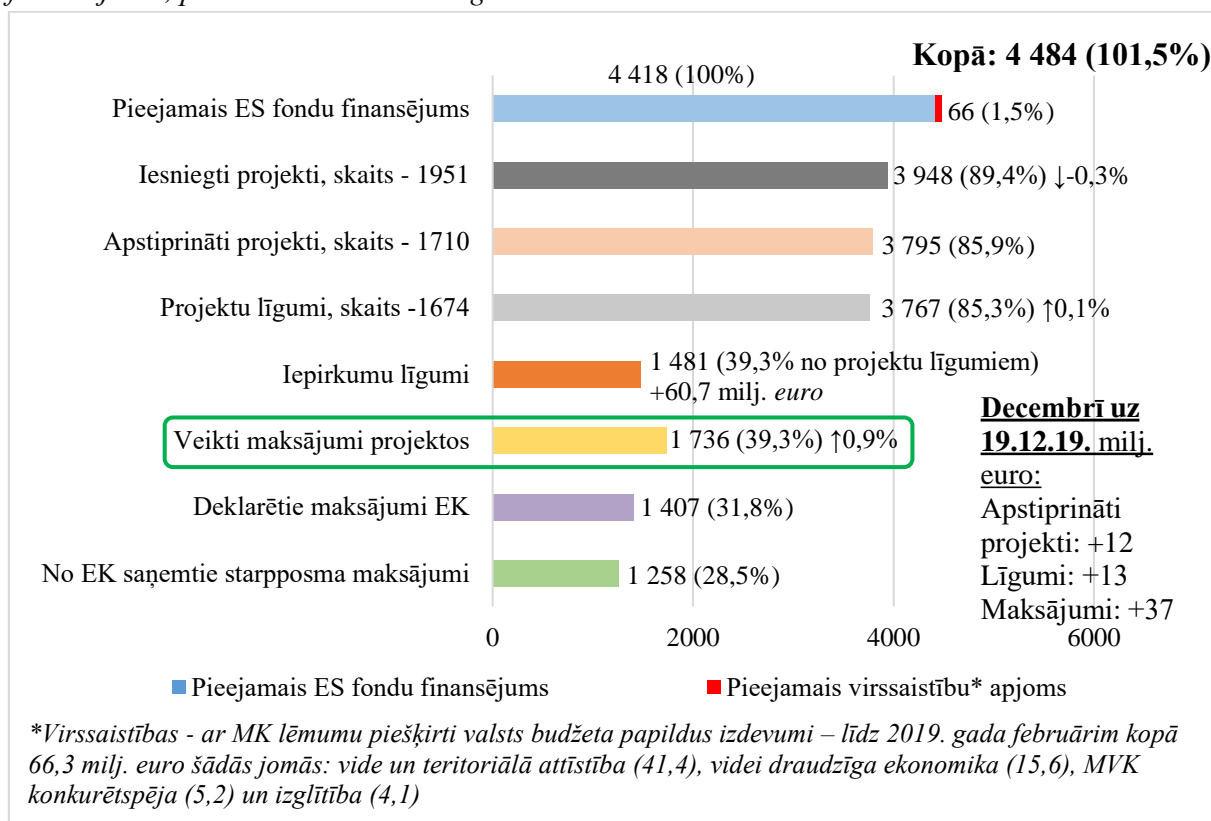

¹ FM līdz katrai nākamajai mēneša beigām jāiesniedz MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums tiek publiskots arī ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv> sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/ziņojumi-Ministru-kabinetam>. Detāla investīciju progresa un plānu izpildes informācija, t.sk. projektu līmenī pieejama sadaļās ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress / Ieviešanas plāni un to izpilde: <https://www.esfondi.lv/2019.gads>

Ilustrācija Nr. 2 "Tendences līdz 2019. gada 1. decembrim, milj. euro, ES fondu finansējums"

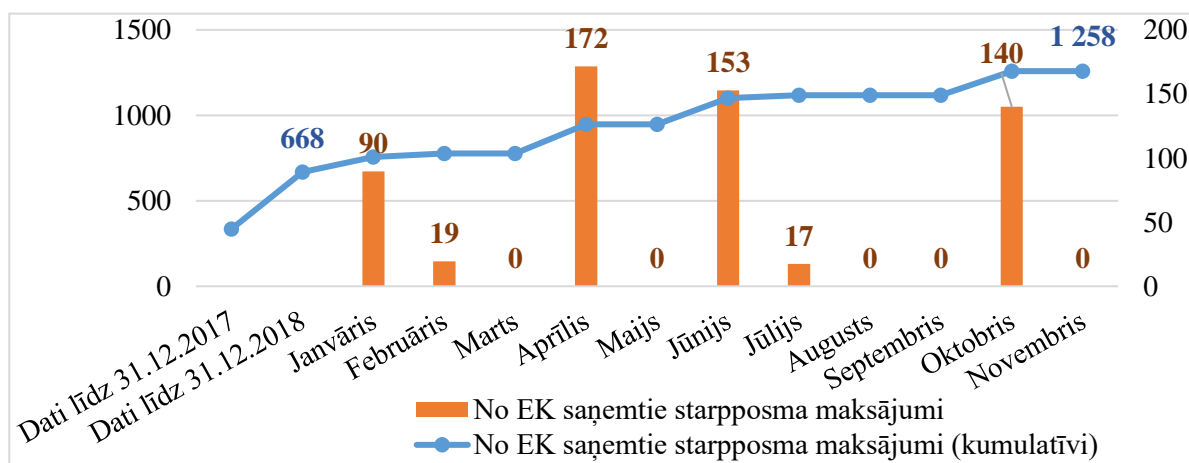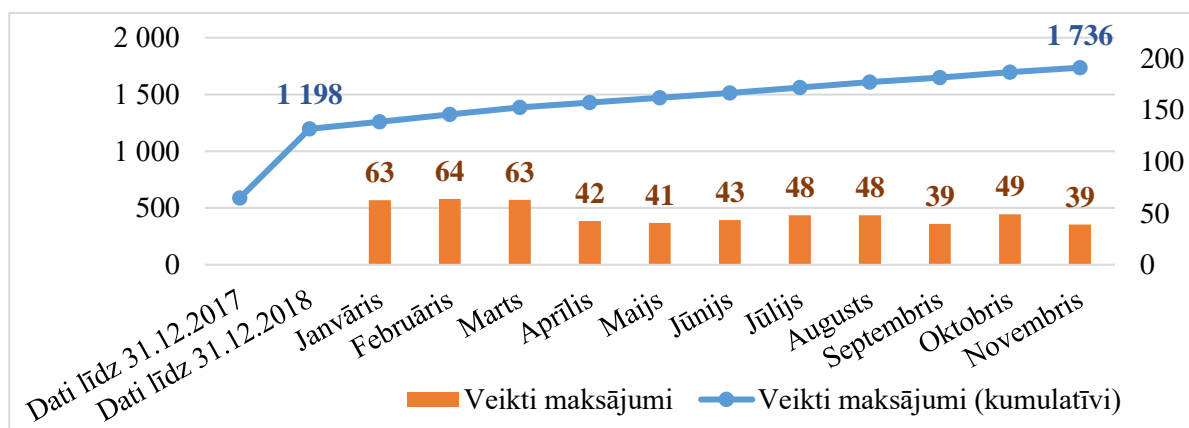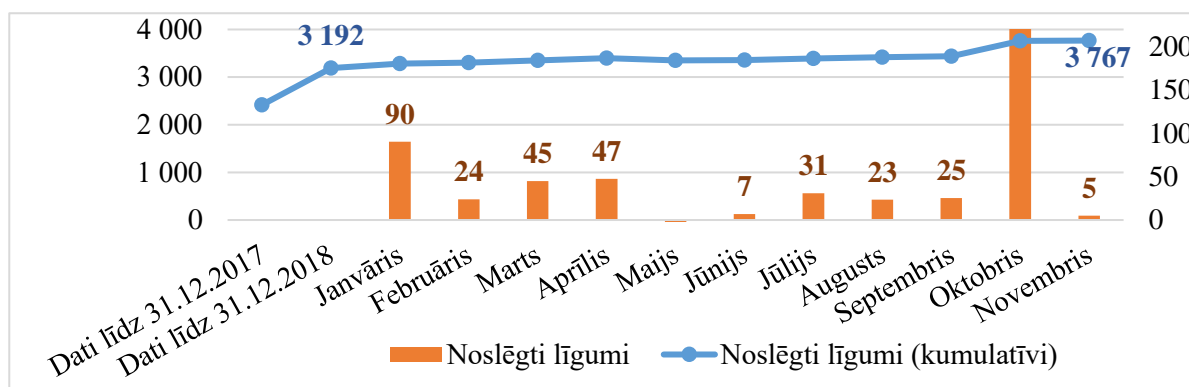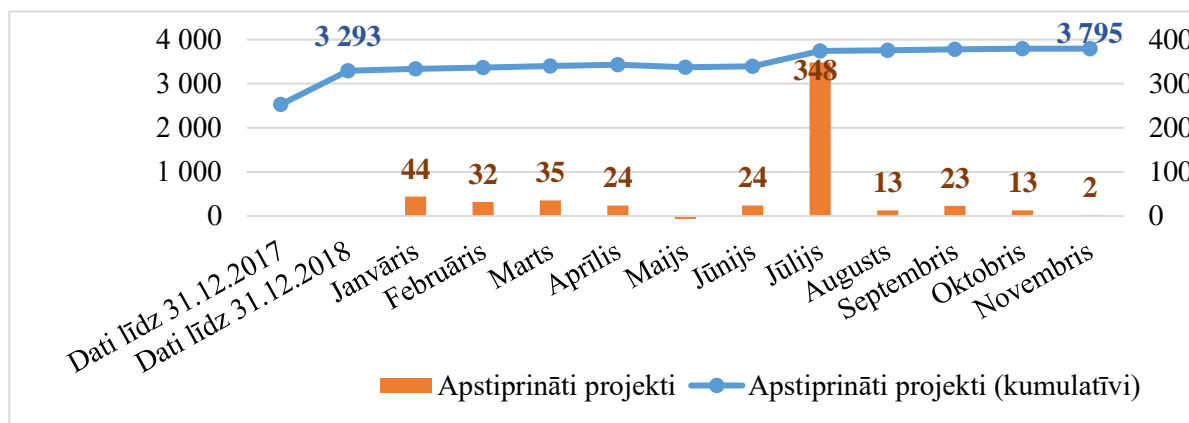


ES fondu maksājumu projektu īstenotājiem kopējā prognozes izpilde līdz 2019. gada novembra beigām ir 109 % (saglabājas iepriekšējā mēneša līmenī). Operatīvā informācija uz 2019. gada 18. decembri liecina, ka jau ir pārsniegta arī 2019. gada kopējā prognoze 565 milj. *euro* (izpilde 574 milj. *euro*).

Ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs 2019. gada plānā noteiktajā termiņā nav iesniegti trīs projekti² kopā par ES fondu atbalstu 3,6 milj. *euro*. Talsu novada dome un Bauskas novada pašvaldība ir informējušas Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA), ka, izvērtējot aktuālās finanšu iespējas un prioritātes, sākotnēji plānotie projekti degradēto teritoriju atjaunošanas un publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības jomās netiks īstenoti (kopā 1 milj. *euro*). Atbildīgās iestādes Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē ir izlemt par “atbrīvotā” ES fondu finansējuma efektīvāko izmantošanu darbības programmā noteiktiem investīciju mērķiem.


Līdz 2019. gada novembra beigām maksājumu pieprasījumu plānu izpilde kopā visos projektos ir 92,4 %. Vienlaikus projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2019. gada plāna izpildē saglabājas negatīva tendence 293 projektos (22,8 % no 1 286 projektiem kopā), kuros plāna neizpilde lielāka par 25 %. Kopējā šo projektu plānu neizpilde ir 154 milj. *euro* (par 5 milj. *euro* vairāk nekā iepriekšējā mēnesī), t.sk. pusei projektu vairāk kā četrus mēnešus pēc kārtas (153 projekti kavē maksājumu pieprasījumu iesniegšanu par 85 milj. *euro*). Skatīt ilustrāciju Nr. 3 un Nr. 4.

Ilustrācija Nr. 3 “2019. gada maksājumu pieprasījumu kumulatīvās plāna neizpildes lielākas par 25 % kavēto mēnešu skaita dalījumā līdz 2019. gada 1. decembrim, ES fondu un valsts budžeta līdzekļi; milj. euro (projektu skaits)”

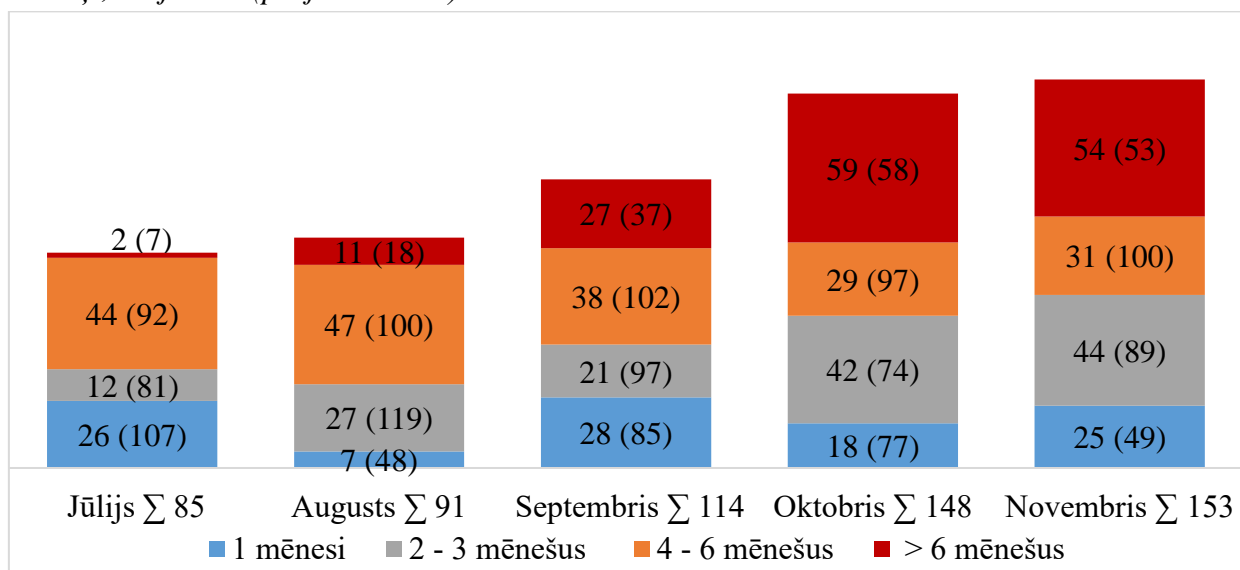

² Zemkopības ministrijas projekts “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 2.kārta” (2,55 milj. *euro*), Talsu novada pašvaldības projekts “Talsu pilsētas tirgus pārbūve” (980 868 *euro*) un Bauskas novada pašvaldības projekts “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana Bauskā” (30 835 *euro*).

Ilustrācija Nr. 4 “2019. gada maksājumu pieprasījumu plāns un to aktualizācija/izpilde līdz 2019. gada 1. decembrim, ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums, milj. euro”

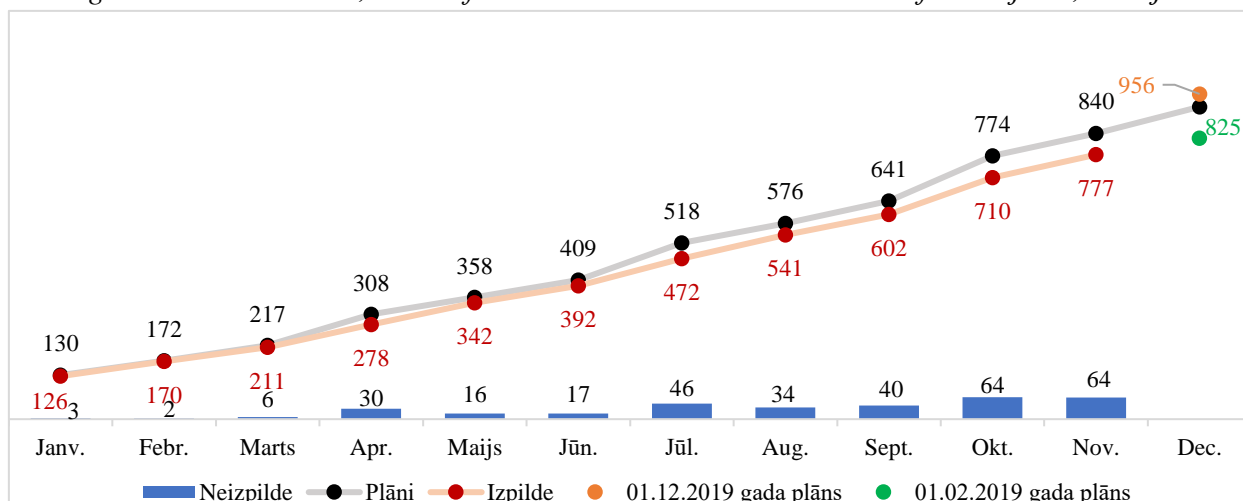

Projektu īstenotāju atjaunotais/aktualizētais maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2019. gada plāns kopā ir 955 milj. *euro* (43 milj. *euro* samazinājums pret oktobri). No gada sākuma plāns palielinājies par 130 milj. *euro* jaunu projektu (116 milj. *euro*) un plānu aktualizācijas rezultātā. Vienlaikus vairāki projektu īstenotāji informējuši CFLA par samazinājumu maksājumu pieprasījumu gada plānos kopā par 89 milj. *euro*, t.sk. 83 projektos par 62 milj. *euro* tas pārsniedz finanšu disciplīnas pieļaujamo novirzi 25 %. 26 projektos negatīvās novirzes ir objektīvi pamatotas un nav jāpieņem tālāki lēmumi par finanšu disciplīnas nosacījumu neievērošanu³. 2020. gada janvārī CFLA vērtēs projektu maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2019. gada plānu izpildes rezultātus un sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām sniegs priekšlikumus rīcībai⁴ iekļaušanai FM pusgada ziņojumā⁵, ja nepieciešams. Projektu ieviešanas uzraudzības laikā CFLA proaktīvi sadarbojas ar projektu īstenotājiem pēc principa “konsultē vispirms”, kā arī atbildīgajām iestādēm, lai iespēju robežās mazinātu vai novērstu risku iestāšanos projektu īstenošanā, tai skaitā attiecībā uz finanšu disciplīnas nosacījumiem.

ES fondu investīciju drošas finanšu pārvaldības ietvaros ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas operatīvi reaģē uz risku signāliem, veicot attiecīgas koordinētas darbības.

³ MK 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.784) 51. ⁴ apakšpunktā definētie gadījumi

⁴ MK noteikumu Nr.784 51.³p. paredz: *konstatējot iepriekšējā kalendāra gadā faktiski veikto izdevumu un sadarbības iestādē iesniegto maksājumu pieprasījumu apjomā samazinājumu vairāk nekā par 25 % no aktualizētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā, CFLA samazina ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā.*

⁵ Informatīvais ziņojums par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2019. gada decembrim (pusgada ziņojums).

2019. gada 5.-6. decembrī notika oficiālās ikgadējās tikšanās ar EK pārstāvjiem⁶ par Eiropas strukturālo un investīciju fondu Partnerības līguma ieviešanu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā sanāksmes⁷, kuras vadīja EK Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta direktore teritoriālās sadarbības, makroreģionu un Ziemeļrietumeiropas jautājumos *Lena Andersson-Pench*. 5. decembrī pārrunājot Kohēzijas politikas ES fondu investīciju ieviešanas progresu, EK pārstāvji izteicās atzinīgi par Latvijas pozitīvo sniegumu kopumā ES fondu investīciju projektu ieviešanā, jo īpaši par spēju sasniegt ambiciozos vidus posma finanšu un iznākuma rādītāju mērķus. 6. decembrī notika kopēja sanāksme par Kohēzijas politikas un Zemkopības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu stratēģisko mērķu sasniegšanas progressa novērtējumu. FM izmantoja iespēju atkārtoti akcentēt un skaidrot EK pārstāvjiem Latvijai kritiski svarīgos jautājumus attiecībā uz 2021.-2027. gada plānošanas perioda ES fondu finansējumu, īpaši par nepieņemamo piešķiruma samazinājumu Latvijai, tematiskās koncentrācijas prasībām klimata mērķiem un nacionālo līdzfinansējuma likmju paaugstināšanu.

Papildus sarunām par 2014.-2020. gada plānošanas perioda ieviešanu FM sadarbībā ar nozaru ministrijām ir uzsākusi sarunas ar EK par plānošanas dokumentu izstrādi 2021.-2027. gada periodam, tai skaitā pārrunāts potenciālais plānošanas dokumentu izstrādes laika grafiks, lai nodrošinātu ātru dokumentu saskaņošanu ar EK un laicīgu nākošā plānošanas perioda uzsākšanu. Sarunu ietvaros tiek diskutēti jautājumi par Latvijas ieguldījumu stratēģiju un nepieciešamajiem investīciju projektiem atbilstoši Kohēzijas politikas regulējumā noteiktajiem politikas mērķiem. Kā ziņots iepriekš, Latvijas Kohēzijas politikas ieguldījumu stratēģija balstīsies uz Nacionālajā attīstības plānā noteiktajām prioritātēm, vienlaikus ņemot vērā ES Padomes rekomendācijas un ES Semestra procesā publicētās pamatnostādnes 2021.-2027. gada plānošanas periodam.

Finanšu ministra vietā –
Ārlietu ministrs

E.Rinkēvičs

Rūdolfā 67083925
Astra.Rudolfa@fm.gov.lv

⁶ <https://www.esfondi.lv/jaunumi/eiropas-komisija-noverte-latvijas-sasniegto-es-fondu-strategiskaja-ieviesana>

⁷ Informācija pieejama: <https://www.esfondi.lv/jaunumi/eiropas-komisija-noverte-latvijas-sasniegto-es-fondu-strategiskaja-ieviesana>. Ikgadējās tikšanās materiāli ir pieejami: <https://komitejas.esfondi.lv/SitePages/Home.aspx> → Ikgadējā tikšanās ar EK (ARM) – materiāli sanāksmes dalībniekiem angļu valodā → 2019:
