

# PĀRSKATS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA 2014. - 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2018. GADA 30. SEPTEMBRIM<sup>1</sup>

Pārskatā iekļauta informācija atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2015. gada 4. novembra vēstulē Nr. 142.9/12-130-12/15 par atskaišu iesniegšanu norādītajiem jautājumiem: (1) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondu) 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita; (2) Specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita; (3) SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums; (4) ES fondu vadības riski un to pārvaldība.

## **I ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita**

Galveno vadības pasākumu izpildes progress apkopots 1. pielikumā<sup>2</sup>. 2018. gada 1. septembrī stājas spēkā stingrāki finanšu disciplīnas nosacījumi<sup>3</sup>. Attiecīgi līdz 2018. gada 31. augustam finansējuma saņēmēju aktualizētie maksājumu pieprasījumu 2018. gada plāni kopumā samazināti par 30%<sup>4</sup>. Tā kā finanšu disciplīnas atbildības nosacījumi piemērojami tikai projektu līgumiem, tad uz 2018. gada 1. oktobri aktualizētais 2018. gada plāns, uz kuru attiecas šie nosacījumi, ir 748 milj. *euro*. Investīciju progresa un risku pārvaldības ietvaros, Finanšu ministrija (turpmāk – FM) turpinās katru mēnesi apkopot plānu izpildes statusu un sniegs operatīvo informāciju Saeimai un Ministru kabinetam.

## **II SAM/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita**

Pārskata periodā Ministru kabinetā (turpmāk – MK) apstiprināti jauni Veselības ministrijas investīciju nosacījumi veselības aprūpes ieviešanas jomā (3,8 milj. *euro*) un FM investīciju nosacījumi par atbalstu ES fondu vadības funkciju nodrošināšanai (50,3 milj. *euro*). Izglītības un zinātnes ministrija kavēto uzdevumu investīciju nosacījumu digitālo un metodisko līdzekļu izstrādē (3,6 milj. *euro*) plāno paveikt 2018. gada oktobrī. Ekonomikas ministrija atbalstu Energoservisa pakalpojumu uzņēmumu (ESKO) finansēšanai plāno īstenot citas

---

<sup>1</sup> Pārskatā tiek sniegta aktuālākā pieejamā informācija, neatkārtojot ikmēneša ziņojumos sniegto, kas tiek nosūtīta arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai, t.sk. ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>. Aktuālā informācija par ES fondu investīciju progresu, t.sk. maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildi, tiek apkopota reizi mēnesī un ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā – ES fondi 2014 – 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde> un sadaļā - ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni → 2018. gads <http://www.esfondi.lv/2018.gads>. Ar izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) tīmekļa vietnē – sadaļā – ES fondi 2014 – 2020 → izsludinātās atlases: <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases> un projektu informācija pieejama sadaļā – ES fondu projektu meklētājs: <http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs>.

<sup>2</sup> Pastāvīgi tiek veikti dažādi operatīvi pasākumi, procesi un uzdevumi efektīvai investīciju un risku pārvaldībai.

<sup>3</sup> Skat. iepriekšējā ziņojumā sniegto.


<sup>4</sup> Ieskaitot aktualizētos līgumu plānus un vēl plānoto projektu iesniegumu 2017. gada beigās prognozēto.

atbalsta programmas ietvaros, tad par pieejamo ES fondu finansējumu (8,5 milj. *euro*) ministrija plāno līdz 2018. gada beigām piedāvāt risinājumu turpmākajiem iespējamajiem ieguldījumiem. Aktuālā informācija pieejama FM ikmēneša ziņojumos valdībai<sup>5</sup>.

### III SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums.

Līdz 2018. gada 30. septembrim kopā noslēgti 1075 investīciju projektu līgumi, paredzot ES fondu atbalstu 3,0 mljrd. *euro*, jeb 67,0 % no plānošanas periodā pieejamā ES finansējuma. Intensīvu projektu atlasu rezultātā ik ceturksni ievērojami pieaug jaunu projektu skaits ar nozīmīgu investīciju apjomu. Projektu ieviešana kļūst arvien dinamiskāka, ko rāda veikto ES fondu maksājumu par paveiktiem darbiem projektos pieaugums, sasniedzot jau gandrīz 1 mljrd. *euro*. Tas valsts budžeta ieņēmumos nodrošinājis no Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) 574,6 milj. *euro* par reāli veiktām investīcijām. Skatīt grafikā Nr.1.


*Grafiks Nr.1. ES fondu 2014. – 2020. gada perioda investīciju progress līdz 2018. gada 30. septembrim, ES fondu finansējums, milj. euro; pret datiem līdz 2018. gada 30. jūnijū*

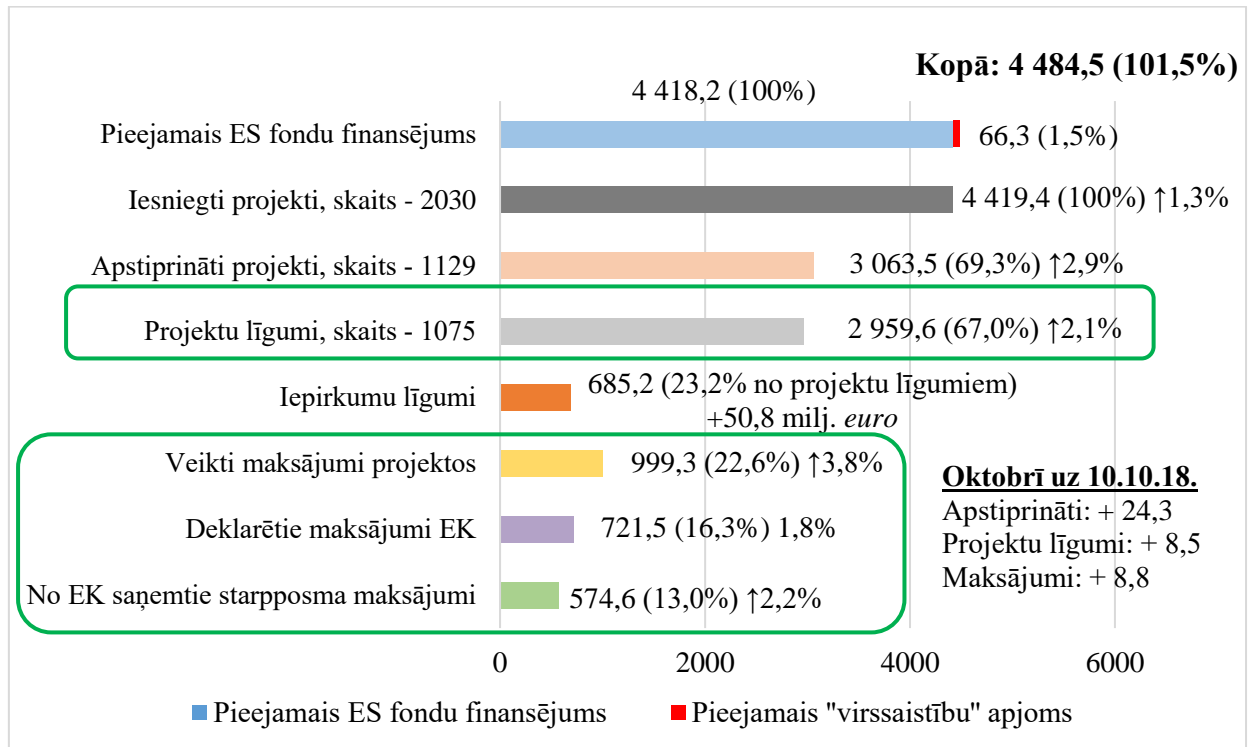

2018. gada trijos ceturkšņos kopējā maksājumu prognozes izpilde 86% vērtējama kā apmierinoša. Pēdējā ceturksnī jāveic ES fondu maksājumi 256 milj. *euro*, lai izpildītu gada prognozi (666,5 milj. *euro*). Skatīt grafikā Nr. 2.

<sup>5</sup> Vēl kopumā jāapstiprina 3 investīciju nosacījumi par 19,9 milj. *euro*. Informācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē sadaļā ES fondi 2014 – 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni → 2018. gads - **Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafiks 2018. un 2019.gadam (līdz 18.09.2018.)** <http://www.esfondi.lv/2018.gads>  
 FMzin\_121018\_SPIRK

Grafiks Nr.2. ES fondu 2014. – 2020. gada perioda maksājumu prognožu izpilde 2018. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro

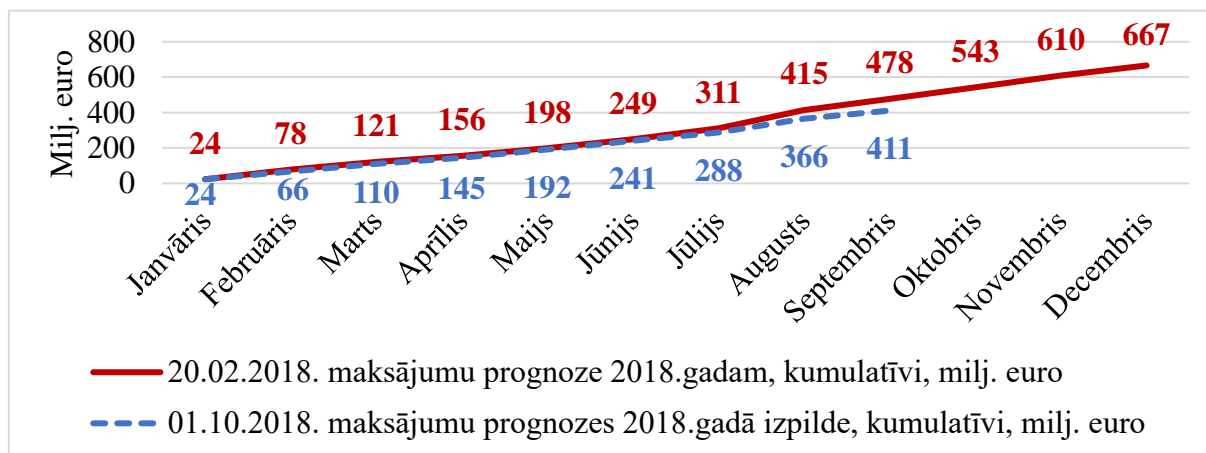

Vienlaikus 2018. gada 28. septembrī ar kārtējā maksājuma pieteikuma iesniegšanu EK ir izpildīts ES fondu maksājumu pieteikumu mērķis 2018. gadam - Latvija ir deklarējusi EK izdevumus par investīcijām ar ES fondu atbalstu 746 milj. euro, kas par 16% pārsniedz darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteikto sertificēto izdevumu 2018. gada mērķi, tādējādi garantējot ES saistību saglabāšanu “n+3” nosacījuma izpildes rezultātā. Līdz ar mērķa izpildi, Latvijai 2018. gadā nepastāv risks zaudēt daļu ES fondu piešķiruma par ikgadējā mērķa nesasniedzšanas apjomu. Arī turpmākajos gados pēc aktuālajām prognozēm FM šādu risku nekonstatē. Aicinām iepazīties ar kopsavilkuma informāciju par ES fondu investīciju aktualitātēm prezentācijā, ko FM sniedza Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē 2018. gada 3. oktobrī<sup>6</sup>.

#### IV ES fondu vadības riski un to pārvaldība<sup>7</sup>

2018. gada 7. augustā ES fondu vadošās iestādes risku vadības darba grupa rakstiskajā procedūrā apstiprināja izvērtēto risku novērtējumus un to mazināšanas pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu ES fondu investīciju ieguldīšanu tautsaimniecībā, vienlaikus aizsargājot valsts un ES budžeta finanšu intereses. Pārskata 2. pielikumā ir galveno ES fondu vadības risku pārvaldības pasākumu īstenošanas aktuālais statuss. Ikdienas darbā rīcība notiek operatīvi un atkarībā no riska nozīmības attiecīgā ekspertu vai vadības līmenī.

<sup>6</sup> Prezentācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā – Materiāli un ziņojumi → Publikācijas un prezentācijas → Prezentācijas: <http://www.esfondi.lv/prezentacijas>

<sup>7</sup> Vadošā iestāde saskaņā ar iekšējām procedūrām veic augstākā līmeņa ES fondu vadības risku pārvaldību, kas pamatā aptver plānošanas dokumentu līmeni un vadības un kontroles sistēmas darbību, nepieciešamības gadījumā ņemot vērā arī zemāka līmeņa (ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes) risku pārvaldības procesā apzinātos draudus kopīgo ES fondu mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu risku pārvaldību, ar Finanšu ministrijas rīkojumu ir izveidota risku pārvaldības darba grupa. Šīs darba grupas sanāksmes tiek organizētas ne retāk kā reizi gadā. Viens no risku darba grupas uzdevumiem ir izvērtēt un saskaņot vispārējos ES fondu vadībā identificētos risku vadības pasākumus un analizēt to izpildes efektivitāti.

FM turpina operatīvu risku pārvaldību, kā arī turpinās regulāri informēt Saeimu, valdību un sabiedrību par aktuālo ES fondu ieviešanas progresu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus rīcībai ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās investīciju iespējas.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Zālīte-Supe, 67083808  
[Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv](mailto:Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv)

Rancāne, 67095485  
[Diana.Rancane@fm.gov.lv](mailto:Diana.Rancane@fm.gov.lv)
