



LATVIJAS REPUBLIKAS
FINANŠU MINISTRIJA

NACIONĀLAIS
ATTĪSTĪBAS
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


KOHĒZIJAS POLITIKAS ES FONDU 2014.-2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSS UZ 2016.GADA JŪLIJU

Ministru kabinets, 15.07.2016.

Finanšu ministrija




Visos investīciju uzsākšanas rādītājos ir stabils progress ar pieaugošu tempu, statuss līdz 01.07.2016., milj. euro, % no ES fondu finansējuma, progress pret datiem uz 01.06.2016.

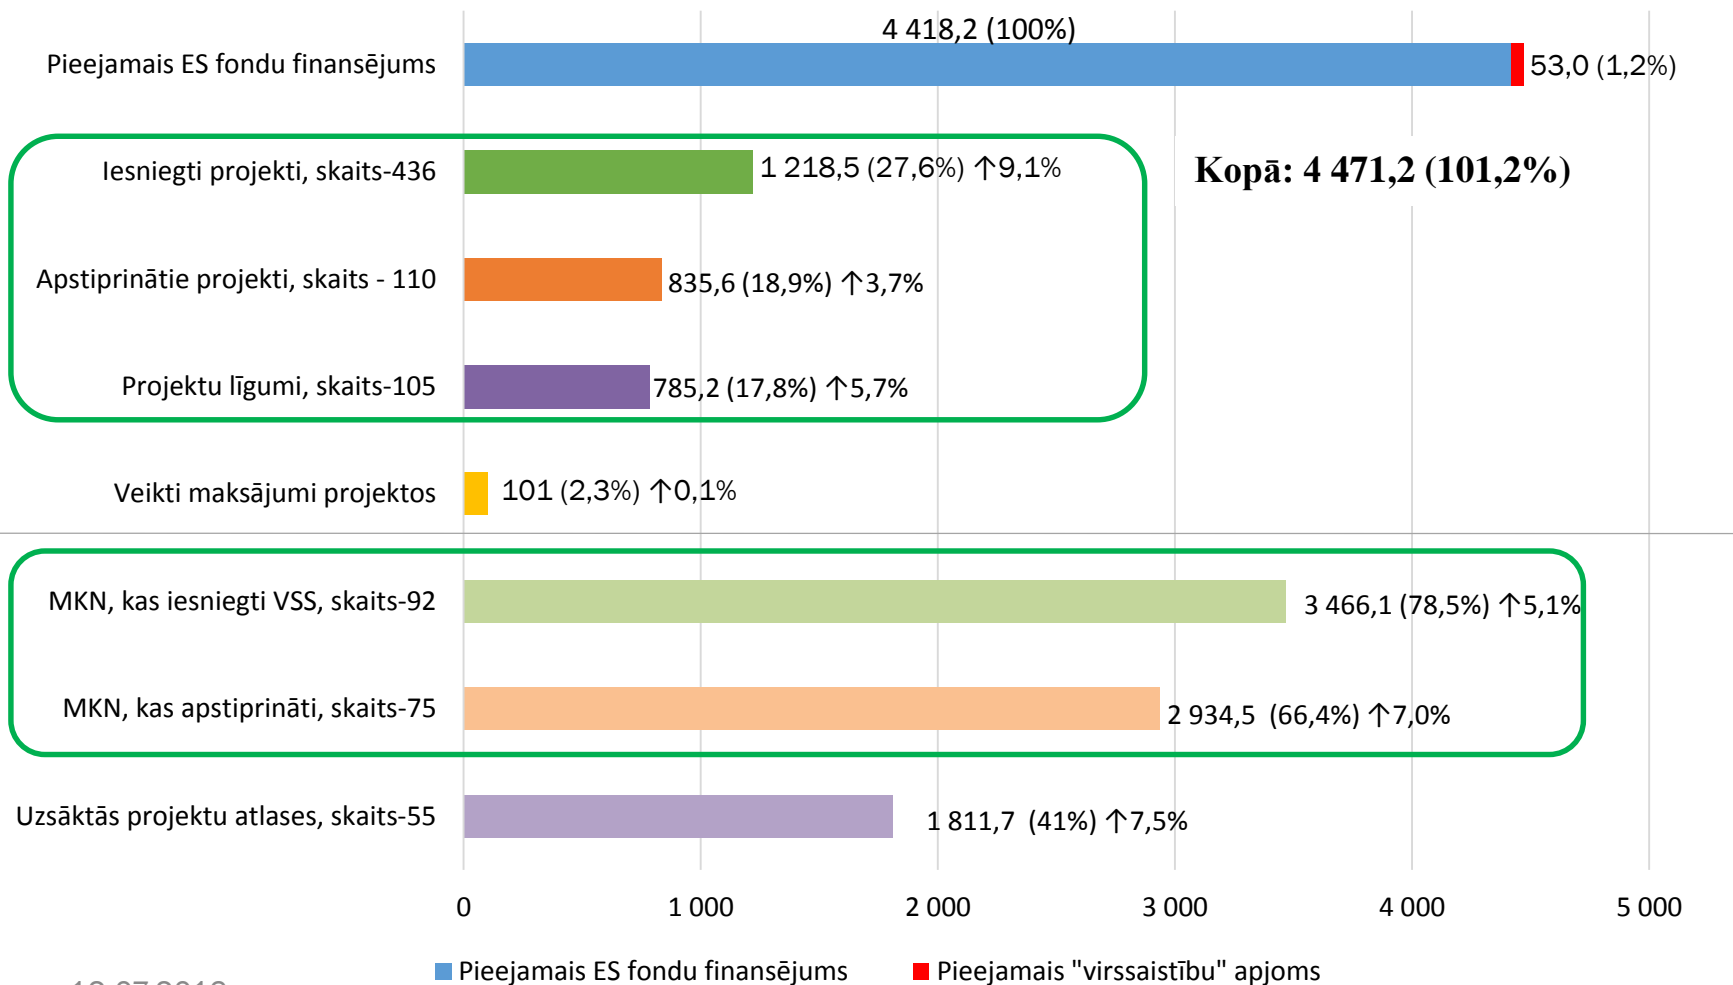

12.07.2016.



ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība uz 01.07.2016.; milj. euro, % pret pieejamo ES fondu finansējumu

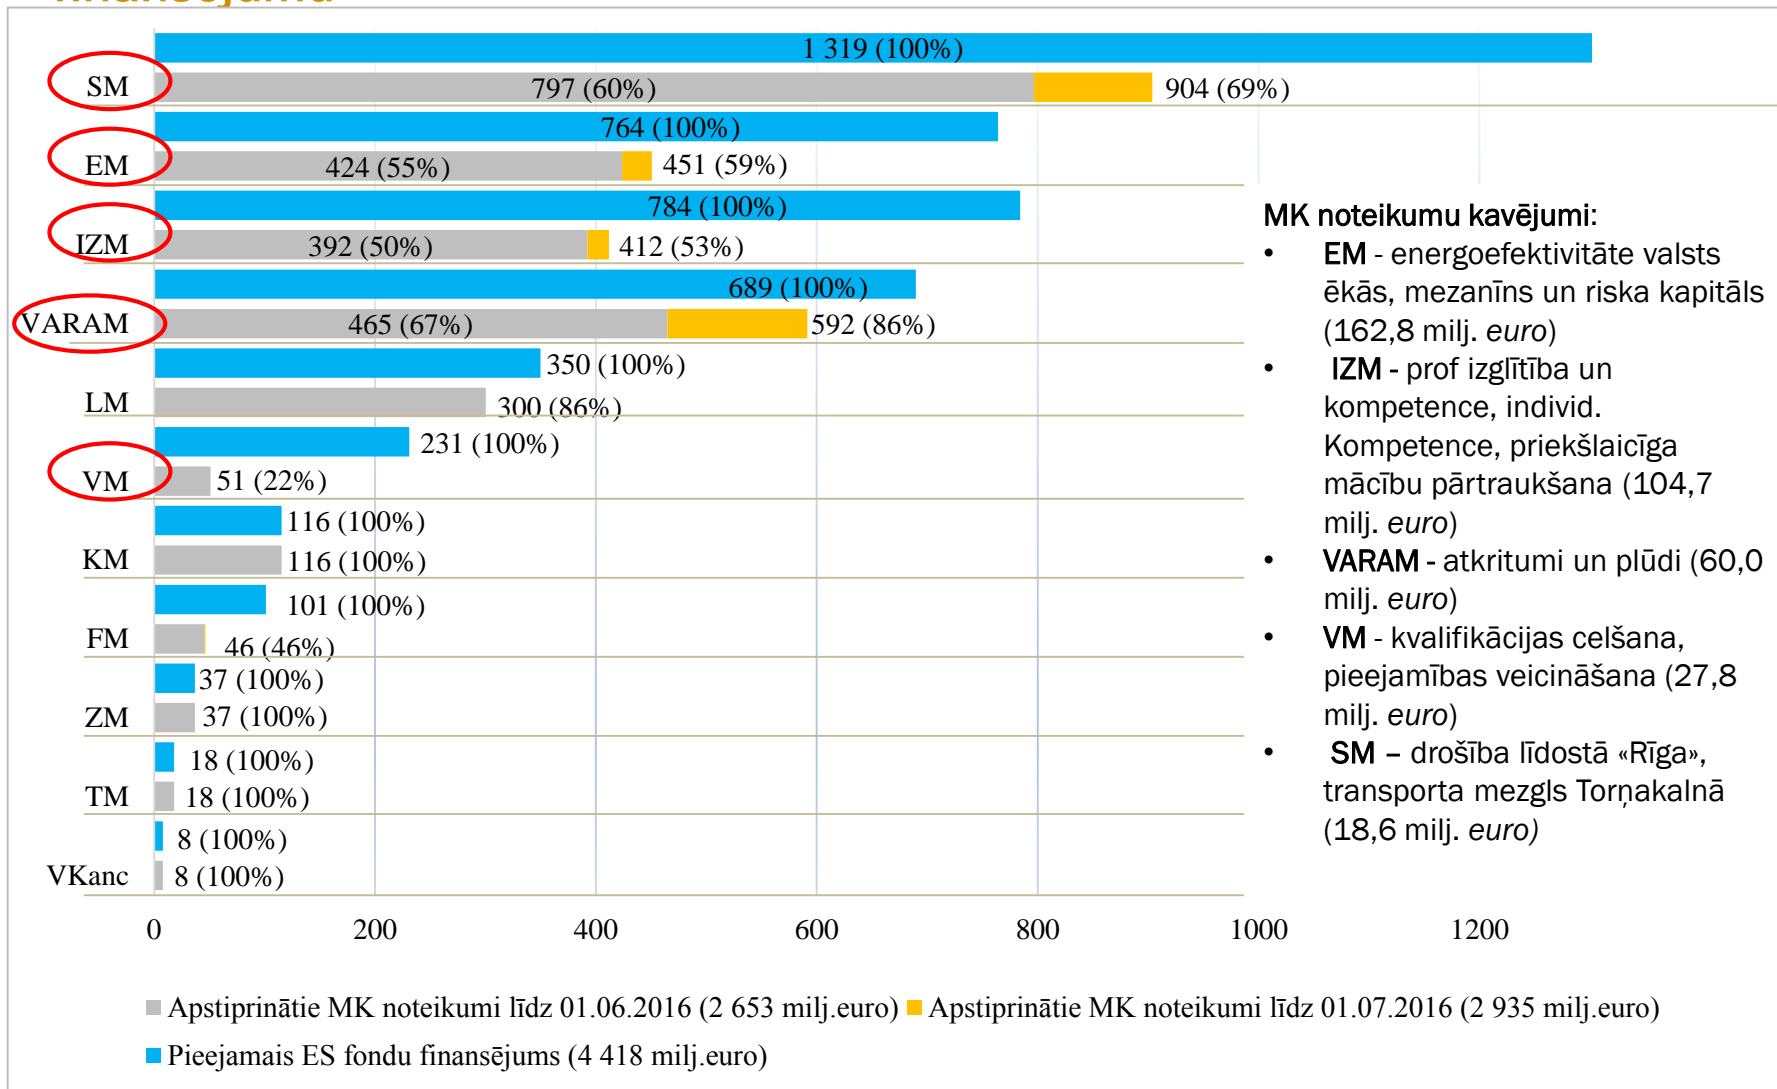


MK noteikumu kavējumi:

- **EM** - energoefektivitāte valsts ēkās, mezanīns un riska kapitāls (162,8 milj. euro)
- **IZM** - prof izglītība un kompetence, individ. Kompetence, priekšlaicīga mācību pārtraukšana (104,7 milj. euro)
- **VARAM** - atkritumi un plūdi (60,0 milj. euro)
- **VM** - kvalifikācijas celšana, pieejamības veicināšana (27,8 milj. euro)
- **SM** - drošība līdostā «Rīga», transporta mezgls Torņakalnā (18,6 milj. euro)




ES fondu investīciju uzsākšanas gatavība – MK noteikumi 2016.gads. (faktiskie dati līdz 01.07.2016. milj. euro)

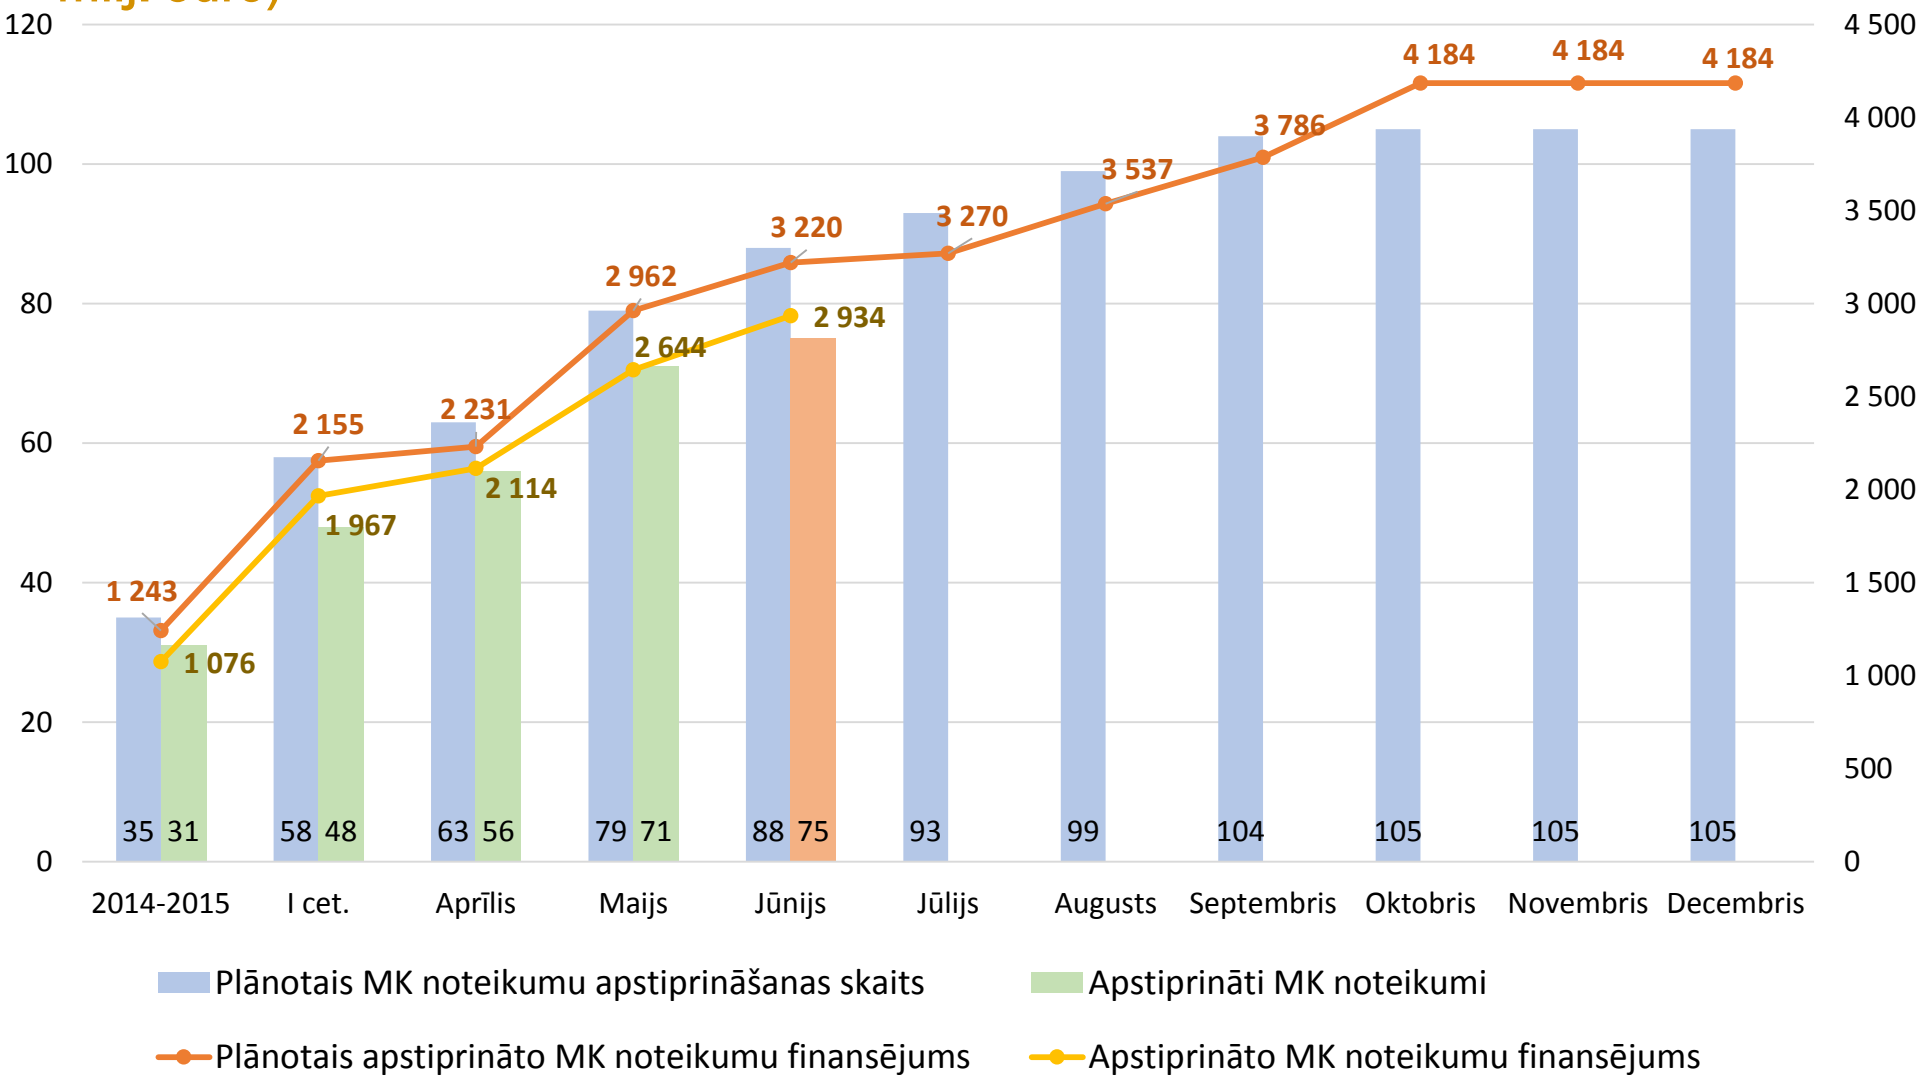

12.07.2016.



ES fondu ieviešanas uzsākšanas posms (pēc MK noteikumu saskaņošanas)

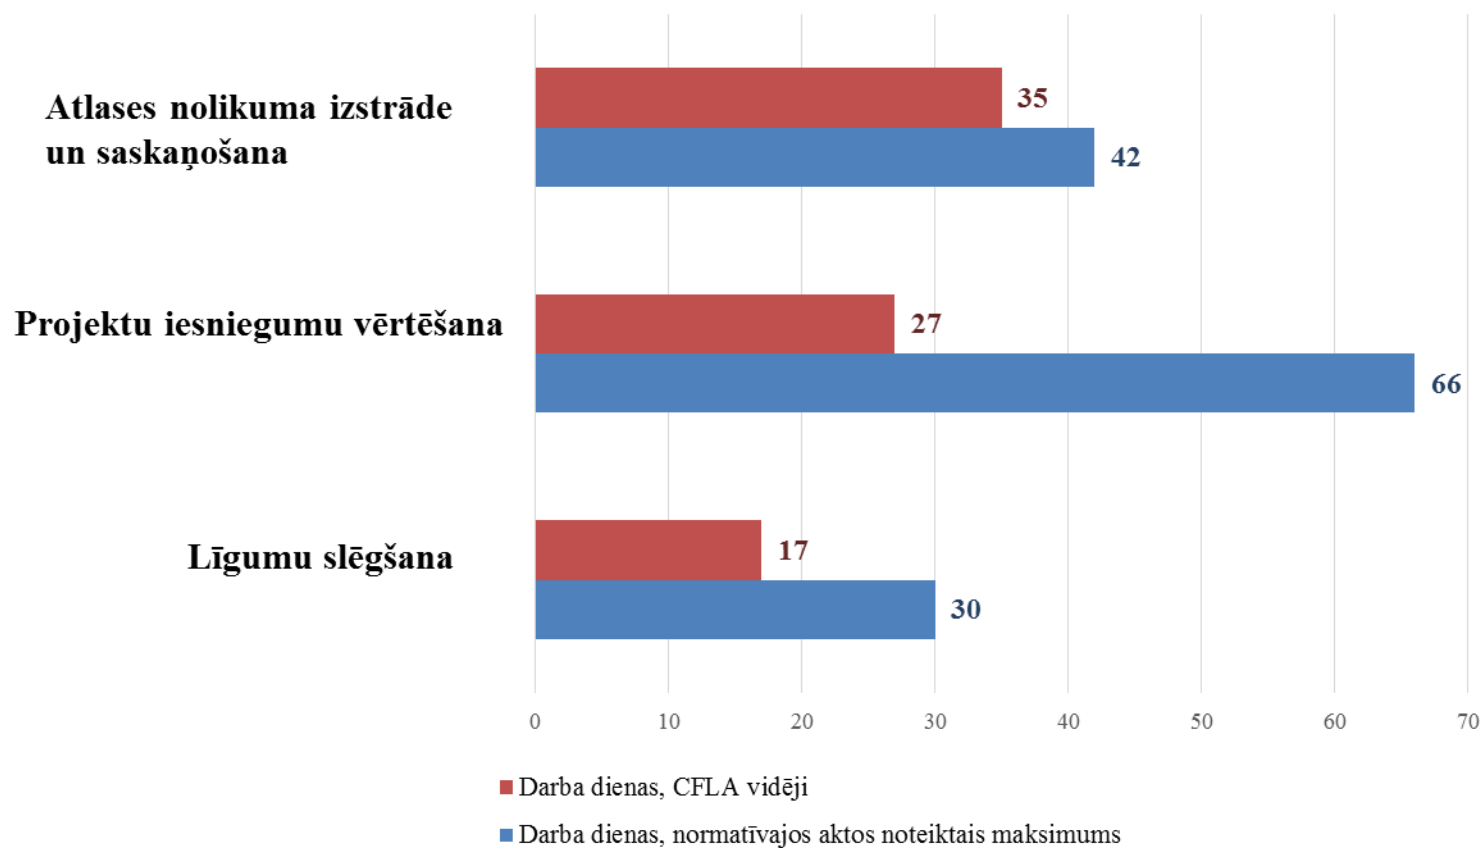

Vidējie CFLA ievērotie termiņi **īsāki** kā **normatīvos aktos noteiktie**



Secinājumi

- **Negatīvi** - salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi uz 01.07.2016. ir **palielinājies kavēto MK noteikumu skaits un palielinājusies negatīvā finanšu ietekme -14 kavēto MK noteikumu finanšu nobīde – 11,4% (jūnijā 5,3%);**
- **Pozitīvi –**
 - 1) **iepriekš kavētie MK noteikumi izpildīti** (izņemot IZM 8.4.1 Nodarbināto personu profesionālā kompetence)
 - 2) Šobrīd aktuālās laika grafika nobīdes plānots izpildīt tuvākajā laikā (jūlijā)
 - 3) reālas **iespējas sasniegt plānoto 90% MK noteikumu apstiprināšanu 2016.gadā**

Uzdevumi:

- Atbildīgajam iestādēm jāturpina aktīvs darbs pie MK noteikumu izstrādes un jāsekmē to apstiprināšana ievērojot 2 mēnešu termiņu VSS.



Izaicinājumi

1. Veselības infrastruktūra (būtiski kavēts Pasaules Bankas pētījums, kartējums etc) (152 milj. euro, ERAF)
2. Dzelzceļa elektrifikācijas projekts (346,6 milj. euro, KF) – EK nostāja - nepieciešams pieņemt lēmumu š.g. vasarā.
3. Inčukalna gudrona dīķu attīrīšanas (sanācijas) projekta pabeigšana (kopā apm. 53 milj. euro, 2.posmam apm. 25 milj. euro)
4. Kultūras degradēto teritoriju revitalizācijas stratēģijas (80 milj. euro, ERAF):
 - Skaņošanā esošās stratēģijas:
 - Brasas un centra stratēģija: 9,45 milj. euro;
 - Imantas stratēģija: 4,9 milj. euro
 - Šķirotavas stratēģija: 4,9 milj. euro.
 - Saskaņošanā ir ziņojums Koncertzāles projekta īstenošanai (15 milj. euro)
 - MK apstiprinātās stratēģijas
 - Grīziņkalna stratēģija (Daugavas stadions): 40,2 milj. euro;
 - Teikas un Čiekurkalna stratēģija (VEF kultūras pils): 4,25 milj. euro.



LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

The screenshot shows the homepage of the website www.esfondi.lv. The header includes the Latvian national emblem and the text "NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020" and "ETROPAS SAVIENĪBA". Below the header is a navigation menu with items like "Jaunumi", "Īsteno projektu!", "ES fondi 2014 - 2020", "Iepriekšējie periodi", "Kohēzijas politika", "Materiāli", "Kontakti", and "Citas programmas". The main content area features a large graphic of the European Union flag and a text box titled "Esi sveicināts Eiropas Savienības fondu mājaslapā!". Below this, there are three columns of content: "Jaunumi" (News) with a date of 2016. gada 5. maijs, "Īsteno projektu!" (Implementing projects) with a date of 2016. gada 28. aprīlis, and "Informatīvie pasākumi" (Informational events) with a date of 2016. gada 27. aprīlis. A calendar for May 2016 is also visible, showing the 10th of May as a seminar date.
