


## INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA INVESTĪCIJU IEVIEŠANAS STATUSU (IKMĒNEŠA ZIŅOJUMS)

Atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) informē par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu ikmēneša aktualitātēm 2019. gada oktobrī–novembrī<sup>1</sup>.





Latvijas investīciju projektiem jau novirzīti 3,8 mljrd. *euro* ES fondu līdzfinansējuma, kas ir 85,1 % no 4,4 mljrd. *euro* 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmā paredzētā finansējuma. Turpinās pozitīva ieviešanas dinamika. Palielinās arī valsts budžeta ieņēmumi no EK līdzfinansējuma atmaksām par projektos veiktiem atbilstīgiem izdevumiem. Skatīt ilustrāciju Nr. 1 un Nr. 2.

*Ilustrācija Nr. 1 “ES fondu investīcijas līdz 2019. gada 1. novembrim, milj. euro, % no ES finansējuma, pret datiem līdz 2019. gada 1. oktobrim”*

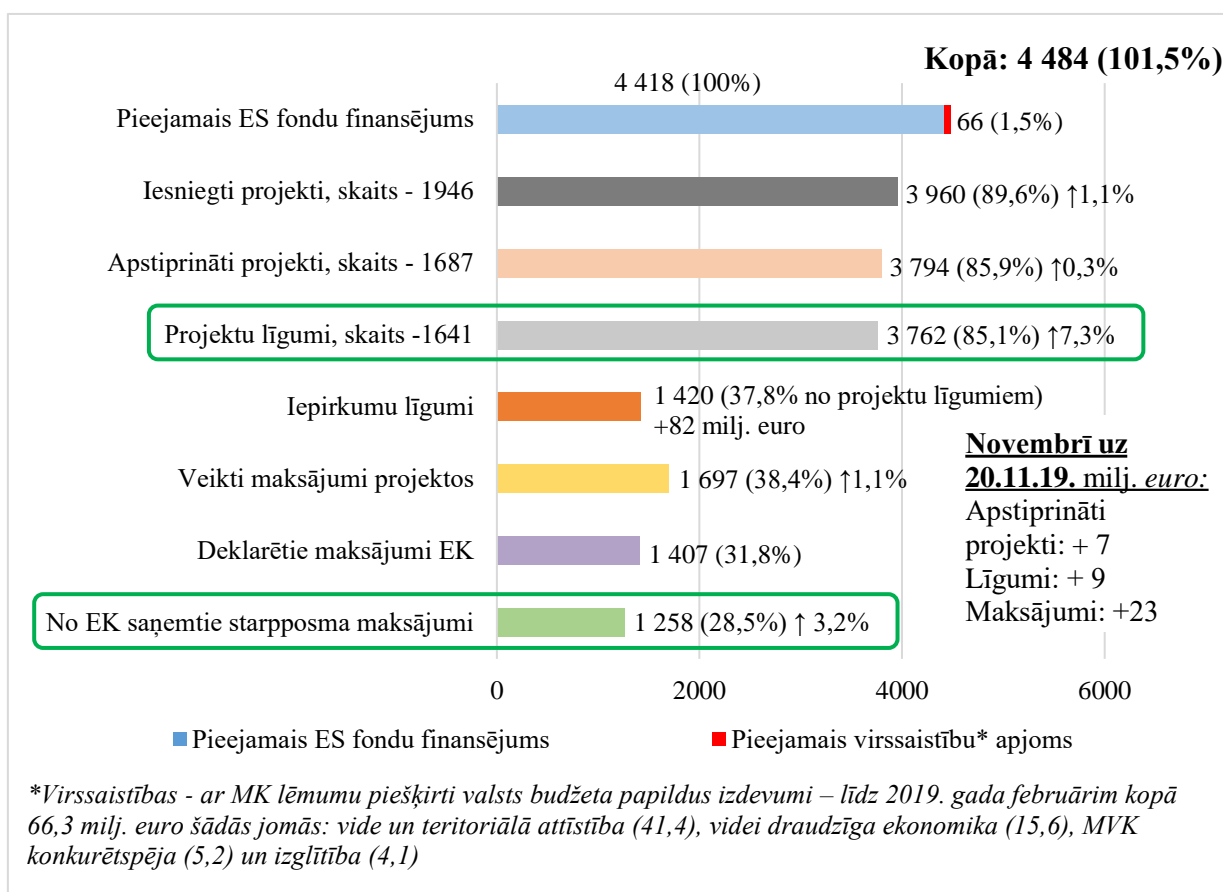

<sup>1</sup> FM līdz katra nākamā mēneša beigām jāiesniedz MK bez saskaņošanas ar citām iestādēm operatīvo informāciju par ES fondu ieviešanas plānu izpildi. Ziņojums tiek publiskots arī ES fondu tīmekļa vietnē <http://www.esfondi.lv> sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>. Detāla investīciju progressa un plānu izpildes informācija, t.sk. projektu līmenī pieejama sadaļās **ES fondi 2014 - 2020** → Ieviešana → Ieviešanas progress / Ieviešanas plāni un to izpilde: <https://www.esfondi.lv/2019.gads>

Ilustrācija Nr. 2 "Tendences līdz 2019. gada 1. novembrim, milj. euro, ES fondu finansējums"

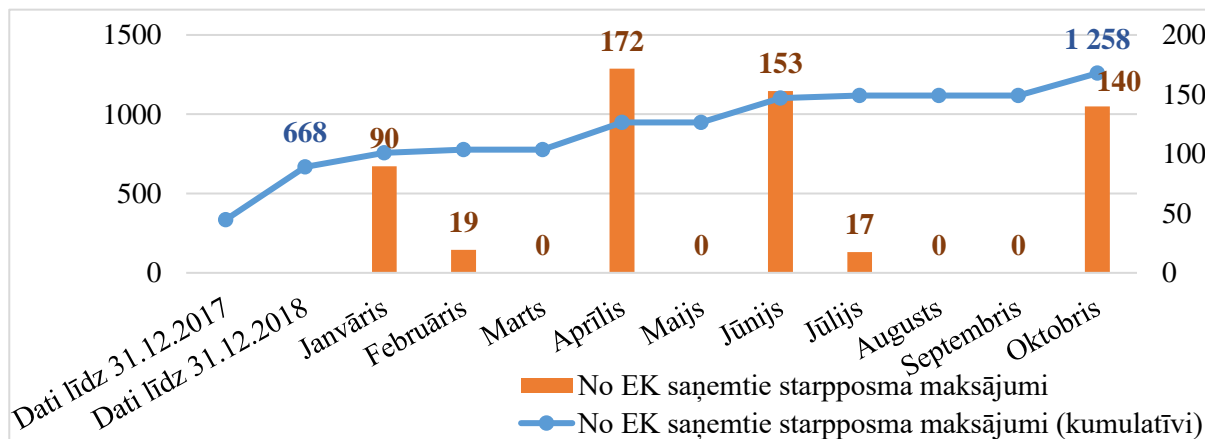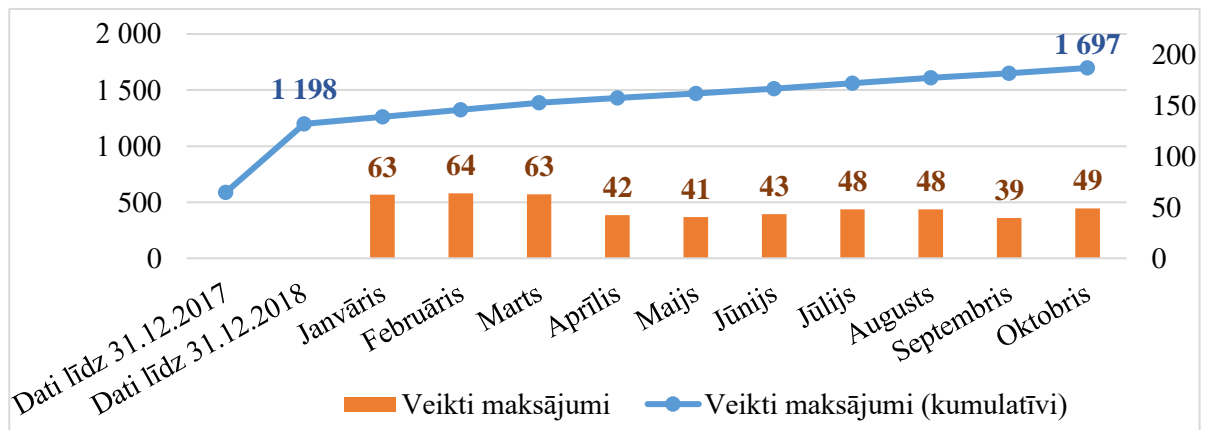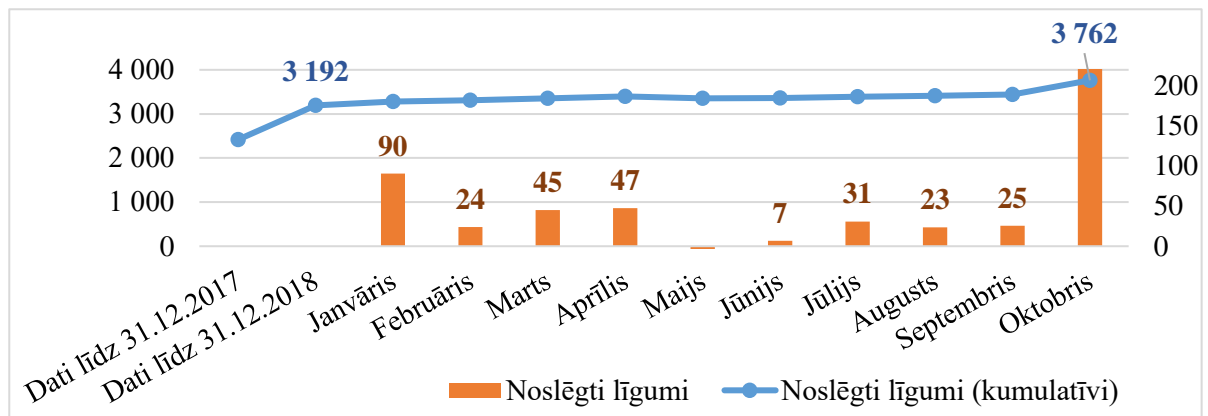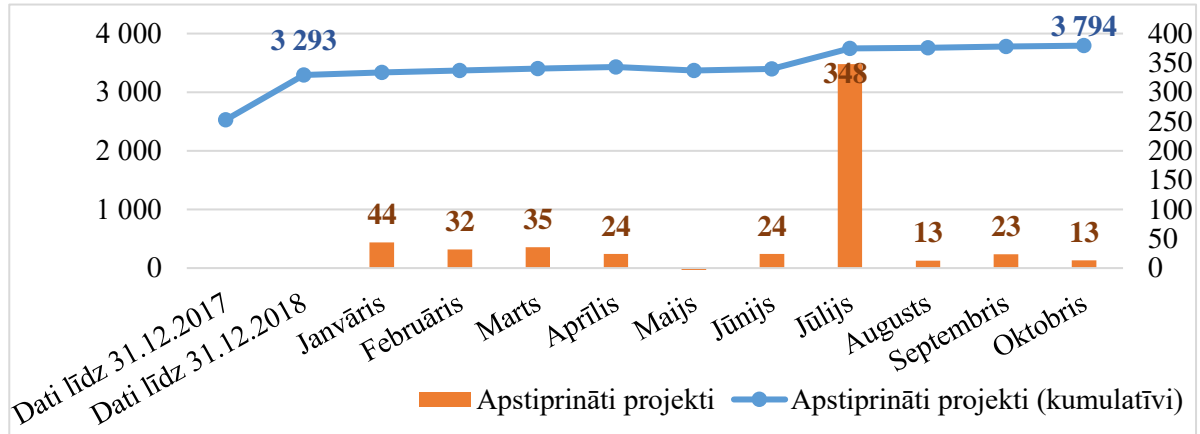


ES fondu maksājumu projektu īstenotājiem kopējā prognoze līdz 2019. gada oktobra beigām ir izpildīta par 109 % (septembrī – 110 %). Lai izpildītu 2019. gada kopējo prognozi (565 milj. *euro*), pēdējos divos mēnešos jāapstiprina maksājumu pieprasījumi par ES fondu izdevumiem vismaz 66 milj. *euro*. Tas ir reālistiski, ņemot vērā līdzšinējo dinamiku (vidēji 50 milj. *euro* mēnesī).

Ierobežotās projektu iesniegumu atlasēs 2019. gada plānā noteiktajā termiņā nav iesniegti divi<sup>2</sup> projekti kopā par ES fondu atbalstu 3 milj. *euro* IKT un publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbības jomā. Projektu īstenotāju atjaunotais/aktualizētais maksājumu pieprasījumu 2019. gada plāns kopā projektu līgumos ir 998 milj. *euro* - palielinājies no gada sākuma par 173 milj. *euro* gan jaunu projektu (115 milj. *euro*), gan esošo plānu aktualizācijas rezultātā.


Maksājumu pieprasījumu plānu izpilde vidēji kopā visos projektos ir 92 %. Individuālos projektos negatīva ikmēneša tendence turpinās – palielinās kopējās plāna neizpildes un ilgstoši kavējumi. Skatīt ilustrācijas Nr. 3 un Nr. 4.

*Ilustrācija Nr. 3 “2019. gada maksājumu pieprasījumu plāns un to aktualizācija/izpilde līdz 2019. gada 1. novembrim, ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums, milj. euro.”*

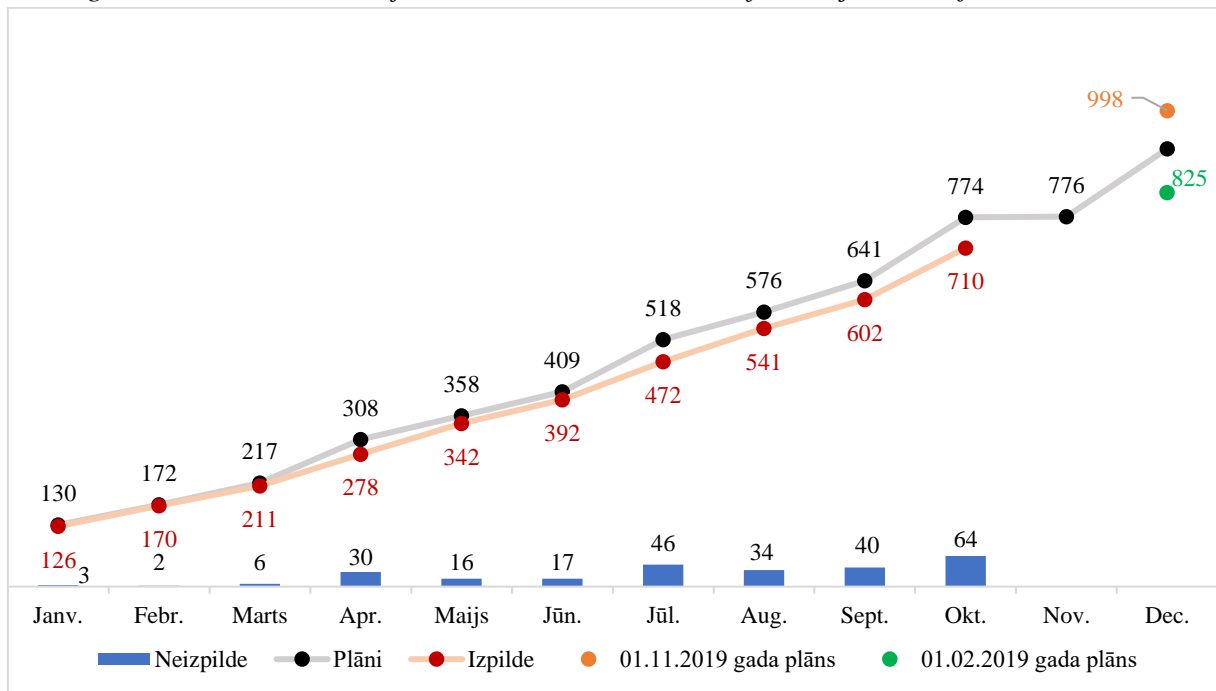

<sup>2</sup> Zemkopības ministrijas projekts “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība. 2.kārta” un Cēsu novada pašvaldības publiskās infrastruktūras uzņēmējdarbībai projekts.

Ilustrācija Nr. 4 “2019. gada maksājumu pieprasījumu kumulatīvās plāna neizpildes vairāk kā 25 % kavēto mēnešu skaita dalījumā līdz 2019. gada 1. novembrim, ES fondu un valsts budžeta līdzekļi; milj. euro (projektu skaits)”

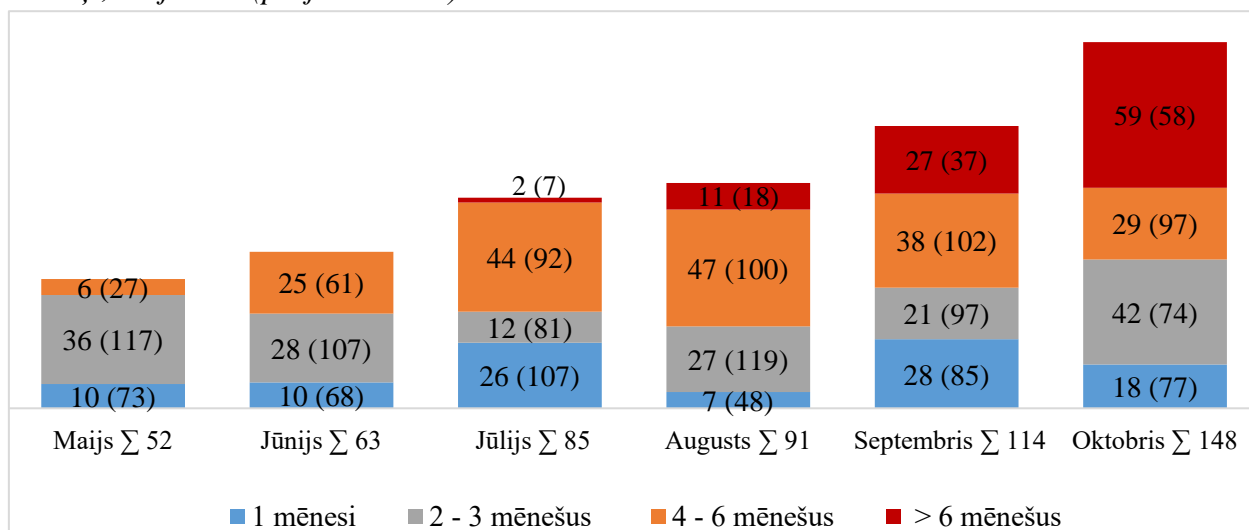

306 projektos ir negatīvas plāna novirzes, kas lielākas par 25 %, t.i. 148 milj. euro (par 34 milj. euro vairāk nekā iepriekšējā mēnesī). Lielākās novirzes (kopā 61,6 % no kavējumiem) ir transporta, kā arī vides un teritoriālās attīstības nozaru projektos. Īstenotāju dalījumā – komersantu projektos (33 %), galvenokārt, (16,2 %) vides un teritoriālās attīstības jomā. Vienlaikus vairākos projektos kopā par 53 milj. euro samazinātas gada izpildes prognozes, t.sk. 71 projektā prognoze pārsniedz finanšu disciplīnas pieļaujamo novirzi 25 % (kopā 33 milj. euro). No kopējiem kavējumiem pusei projektu tie ir vairāk kā četrus mēnešus pēc kārtas. 155 projekti kavē maksājumu pieprasījumu iesniegšanu par 88 milj. euro).

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) turpina proaktīvu sadarbību ar projektu īstenotājiem un atbildīgajām iestādēm, lai iespēju robežās mazinātu vai novērstu risku iestāšanos projektu īstenošanā, tai skaitā attiecībā uz finanšu disciplīnas nosacījumiem<sup>3</sup>. 2019. gada oktobra beigās – novembrī visos Latvijas reģionos notiek ikgadējais semināru cikls “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā”<sup>4</sup>, ko organizē CFLA sadarbībā ar partneriem (t.sk. FM, Labklājības ministrija, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Finanšu nozares asociācija). Semināru norises laikā tiek apskatītas dažādas aktuālas tēmas

<sup>3</sup> MK 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.<sup>3</sup>p. paredz, ka, konstatējot iepriekšējā kalendāra gadā faktiski veikto izdevumu un sadarbības iestādē iesniegto maksājumu pieprasījumu apjomā samazinājumu vairāk nekā par 25 % no aktualizētā plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā, CFLA samazina ES fonda un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds projektā ir paredzēts, par starpību, kas pārsniedz 25 % no plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafikā paredzētā.

<sup>4</sup> CFLA semināru cikla “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” materiāli, t.sk. videoieraksti pieejami: <https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/pasakumi>

(iepirkumi, valsts atbalsts, finanšu pārvaldība, fokuss uz investīciju rezultātu sasniegšanu, zināmās nākotnes perspektīvas ES fondu jomā u.c.), kā arī projektu īstenotājiem un interesentiem ir iespēja gan dalīties pieredzē, gan nepastarpināti noskaidrot neskaidros vai risināmos jautājumus. Semināri uzskatāmi par “konsultē vispirms” platformu savstarpējam dialogam un projektu īstenotāju kapacitātes stiprināšanai.

Lai turpinātu efektīvas ES fondu investīcijas saskaņā ar noteiktām nozaru prioritātēm līdz plānošanas perioda beigām<sup>5</sup>, 2019. gada 26. novembrī FM ir iesniegusi MK apstiprināšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” grozījumu priekšlikumu, kas atbilstoši ES fondu atbildīgo iestāžu iesniegtajam noteiktā kārtībā saskaņoti ES fondu Uzraudzības komitejā<sup>6</sup>.

Finanšu ministrs

J. Reirs

[Astra.Rudolfa@fm.gov.lv](mailto:Astra.Rudolfa@fm.gov.lv)  
Rūdolfa 67083925

---

<sup>5</sup> Atbilstoši MK 2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr.47 3.§ “Informatīvais ziņojums “Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma rezerves finansējuma tālāku izmantošanu”” 9.3.apakšpunktā un 10.punktā uzdotajam.

<sup>6</sup> DP grozījumi apstiprināti ES fondu Uzraudzības komitejas rakstiskajā procedūrā 2019.gada 21. novembrī un materiāli pieejami e-portfelī: <https://komitejas.esfondi.lv/RP/Koplietojamie%20dokumenti/Forms/2019.aspx> → 06.11.2019. → 01\_Lemums\_VI\_DP\_groz\_5
