

PĀRSKATS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDU UN KOHĒZIJAS FONDA 2014. - 2020. GADA PLĀNOŠANAS PERIODA INVESTĪCIJU PROGRESU LĪDZ 2018. GADA 31. DECEMBRIM¹

Pārskatā iekļauta informācija atbilstoši Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2015. gada 4. novembra vēstulē Nr. 142.9/12-130-12/15 par atskaišu iesniegšanu norādītajiem jautājumiem: (1) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondu) 2014. - 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita; (2) Specifisko atbalsta mērķu (turpmāk – SAM)/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita; (3) SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums; (4) ES fondu vadības riski un to pārvaldība.

I ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā veicamo vadības pasākumu (uzdevumu) grafiks un tā izpildes gaita

Galveno vadības pasākumu izpildes progress apkopots 1. pielikumā².

II SAM/pasākumu ieviešanas grafiks un tā izpildes gaita

Pārskata periodā Ministru kabinetā (turpmāk – MK) apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) investīciju nosacījumi digitālo un metodisko līdzekļu izstrādē 1. kārtai (1,3 milj. *euro*), savukārt 2. kārtas (2,3 milj. *euro*) investīciju nosacījumus IZM plāno izsludināt valsts sekretāru sanāsmē 2019. gada 2. ceturksnī. Ekonomikas ministrija atbalstu Energoservisa pakalpojumu uzņēmumu (ESKO) finansēšanai plāno īstenot citas atbalsta programmas ietvaros un plāno līdz 2019. gada vidum sniegt priekšlikumu MK pārdalīt šim pasākumam paredzēto 8,5 milj. *euro* finansējumu 4.2.1.1. pasākumam “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”. Aktuālā informācija pieejama FM ikmēneša ziņojumos valdībai.

III SAM/pasākumu projekti un tiem izmaksātais finansējums.


Līdz 2018. gada 31. decembrim kopā noslēgti 1246 investīciju projektu līgumi, paredzot ES fondu atbalstu 3,1 mljrd. *euro*, jeb 72,2 % no plānošanas periodā pieejamā ES finansējuma. Intensīvu projektu atlasu rezultātā ik ceturksni ievērojami pieaug jaunu projektu skaits ar nozīmīgu investīciju apjomu. Projektu ieviešana kļūst arvien dinamiskāka, ko rāda veikto ES fondu maksājumu par paveiktiem darbiem projektos pieaugums, sasniedzot jau gandrīz 1,2 mljrd. *euro*.

¹ Pārskatā tiek sniegta aktuālākā pieejamā informācija, neatkārtojot ikmēneša ziņojumos sniegto, kas tiek nosūtīta arī Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai, t.sk. ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā - Materiāli un ziņojumi → Ziņojumi Ministru kabinetam: <http://www.esfondi.lv/ziņojumi-Ministru-kabinetam>. Aktuālā informācija par ES fondu investīciju progresu, t.sk. Specifisko atbalsta mērķu (SAM) ieviešanas laika grafika izpildi, maksājumu un projektu iesniegšanas plānu izpildi, tiek apkopota reizi mēnesī un ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē, sadaļā – ES fondi 2014 – 2020 → Ieviešana → Ieviešanas progress: <http://www.esfondi.lv/finansu-un-raditaju-plani-to-izpilde> un sadaļā - ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni → 2018. gads <http://www.esfondi.lv/2018.gads>. Ar izsludinātajām projektu iesniegumu atlasēm var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) tīmekļa vietnē – sadaļā – ES fondi 2014 – 2020 → izsludinātās atlases: <http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases> un projektu informācija pieejama sadaļā – ES fondu projektu meklētājs: <http://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs>.

² Pastāvīgi tiek veikti dažādi operatīvi pasākumi, procesi un uzdevumi efektīvai investīciju un risku pārvaldībai.


Valsts budžeta ieņēmumos no Eiropas Komisijas (turpmāk - EK) saņemti jau 667,5 milj. *euro* par reāli veiktām investīcijām. Skatīt grafikā Nr.1.

Grafiks Nr.1. ES fondu 2014. – 2020. gada perioda investīciju progress līdz 2018. gada 31. decembrim, ES fondu finansējums, milj. euro; pret datiem līdz 2018. gada 30. septembrim.

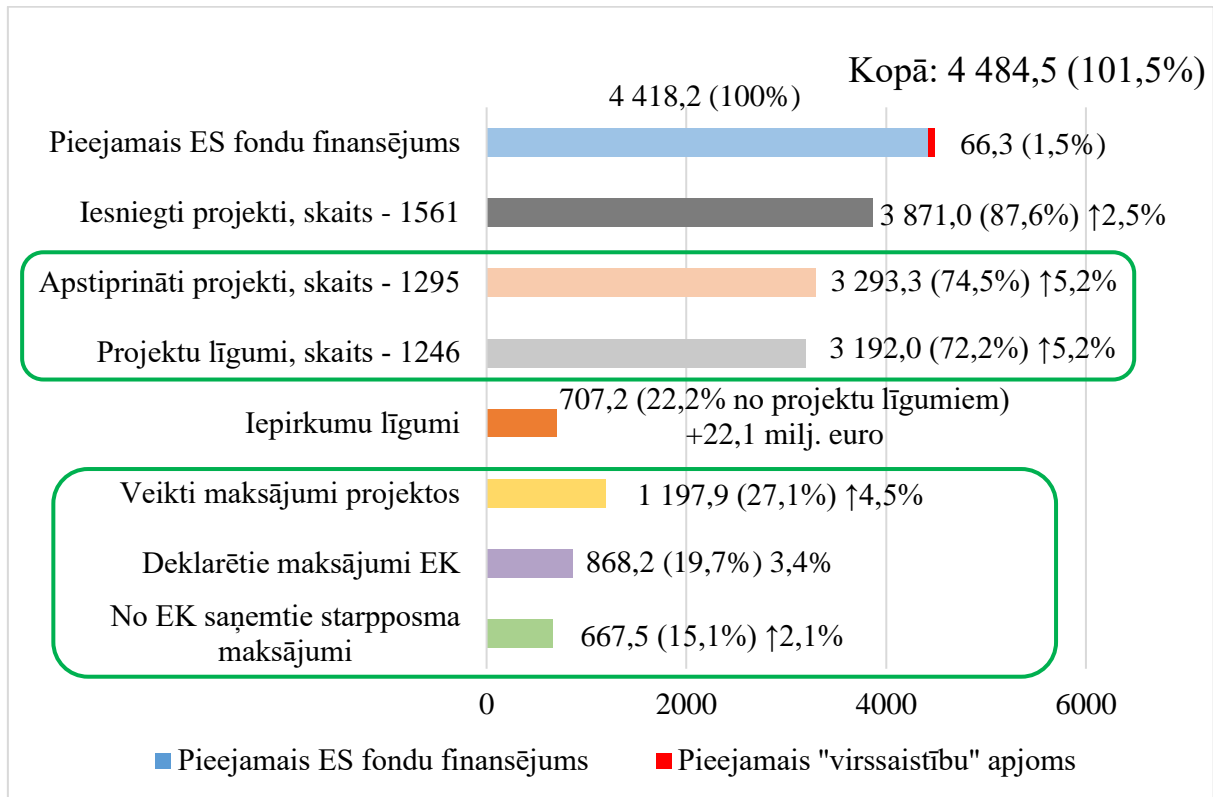

2018. gadā kopējie ES fondu maksājumi projektos ir 610 milj. *euro*, t.i. 92% no 2018. gada sākuma 666,5 milj. *euro* prognozes. Tieši 2018. gada pēdējā ceturksnī bijusi lielākā naudas plūsmas dinamika - veikti ES fondu maksājumi 199 milj. *euro* (33% no gada maksājumiem). Skatīt grafikā Nr. 2.

Grafiks Nr.2. ES fondu 2014. – 2020. gada perioda maksājumu prognožu izpilde 2018. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro

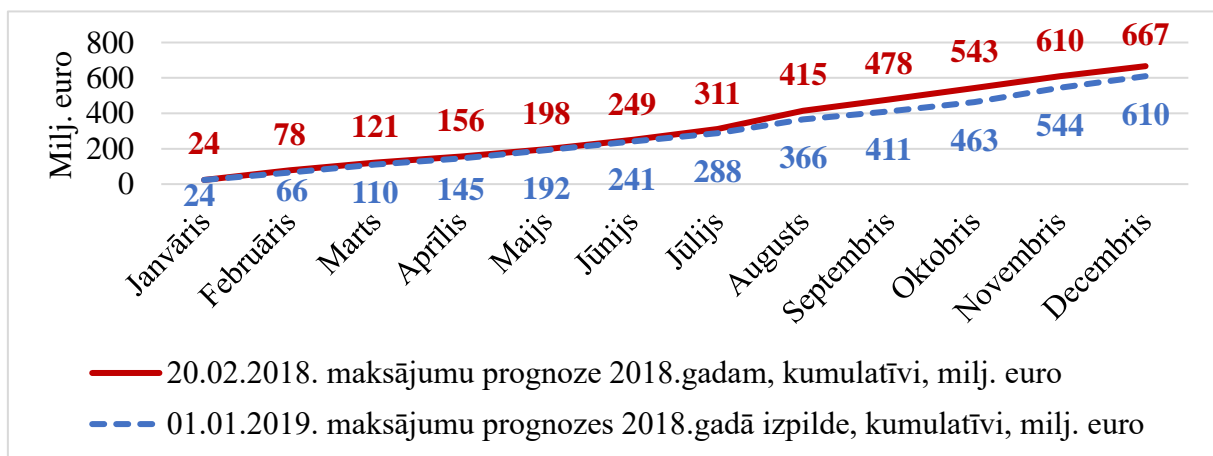

2018. gada 28. decembrī ar kārtējā maksājuma pieteikuma iesniegšanu EK Latvijai ir izdevies par 225 milj. *euro* pārsniegt ES fondu maksājumu pieteikumu mērķi 2018. gadam – Latvija ir deklarējusi EK izdevumus par investīcijām ar ES

fondu atbalstu 868 milj. *euro*. Tādējādi ir garantēta ne tikai “Izaugsme un nodarbinātība” ES saistību saglabāšana “n+3” nosacījuma izpildes rezultātā, bet arī izpildīti 80% no 2019. gada “n+3” mērķa – 1 090 milj. *euro*. Atbilstoši šī brīža investīciju tempiem un aktuālajām prognozēm turpmākajos gados FM nekonstatē risku zaudēt daļu ES fondu piešķiruma par ikgadējā mērķa nesasniegšanas apjomu.

Cita aktuāla informācija ir pieejama informatīvajā ziņojumā par ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu, kurš Saeimas Komisijām tika nosūtīts 2018. gada 19. decembrī. Nākamais ziņojums MK tiks iesniegts līdz 2018. gada 31. janvārim.

IV ES fondu vadības riski un to pārvaldība³

Pārskata 2. pielikumā ir apkopots galveno ES fondu vadības risku pārvaldības pasākumu īstenošanas aktuālais statuss. Ikdienas darbā tiek nodrošināta operatīva rīcība atkarībā no riska nozīmības attiecīgā ekspertu vai vadības līmenī.

2019. gada 11. janvārī Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē FM informēja par ES fondu vidusposma izvērtējumu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā un citām aktualitātēm ES fondu projektu ieviešanā⁴.

FM turpina operatīvu risku pārvaldību, kā arī turpinās regulāri informēt Saeimu, valdību un sabiedrību par aktuālo ES fondu ieviešanas progresu, sniedzot novērtējumu par riskiem un priekšlikumus rīcībai ar mērķi Latvijā pilnvērtīgi izmantot ES atbalsta finansējuma sniegtās investīciju iespējas.

Finanšu ministre

D.Reizniece-Ozola

Zālīte-Supe, 67083808
Zinta.Zalite-Supe@fm.gov.lv

Rancāne, 67095485
Diana.Rancane@fm.gov.lv

³ Vadošā iestāde saskaņā ar iekšējām procedūrām veic augstākā līmeņa ES fondu vadības risku pārvaldību, kas pamatā aptver plānošanas dokumentu līmeni un vadības un kontroles sistēmas darbību, nepieciešamības gadījumā ņemot vērā arī zemāka līmeņa (ES fondu atbildīgo iestāžu un sadarbības iestādes) risku pārvaldības procesā apzinātos draudus kopīgo ES fondu mērķu sasniegšanai. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu ES fondu risku pārvaldību, ar Finanšu ministrijas rīkojumu ir izveidota risku pārvaldības darba grupa. Šīs darba grupas sanāksmes tiek organizētas ne retāk kā reizi gadā. Viens no risku darba grupas uzdevumiem ir izvērtēt un saskaņot vispārējos ES fondu vadībā identificētos risku vadības pasākumus un analizēt to izpildes efektivitāti.

⁴ Prezentācija pieejama ES fondu tīmekļa vietnē → Materiāli un ziņojumi → Publikācijas un prezentācijas →

Prezentācijas: <https://www.esfondi.lv/prezentacijas>

FMzin_140119_SPIRK
