



Finanšu ministrija

Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas aktualitātes



regulārais divu mēnešu ziņojums

02.09.2025.



Finanšu ministrija

2025. gadā ES fondu un Atveseļošanas fonda (AF) investīciju apjoma kāpums – pozitīva tendence un prognozes 100% ES piešķiruma investēšanai

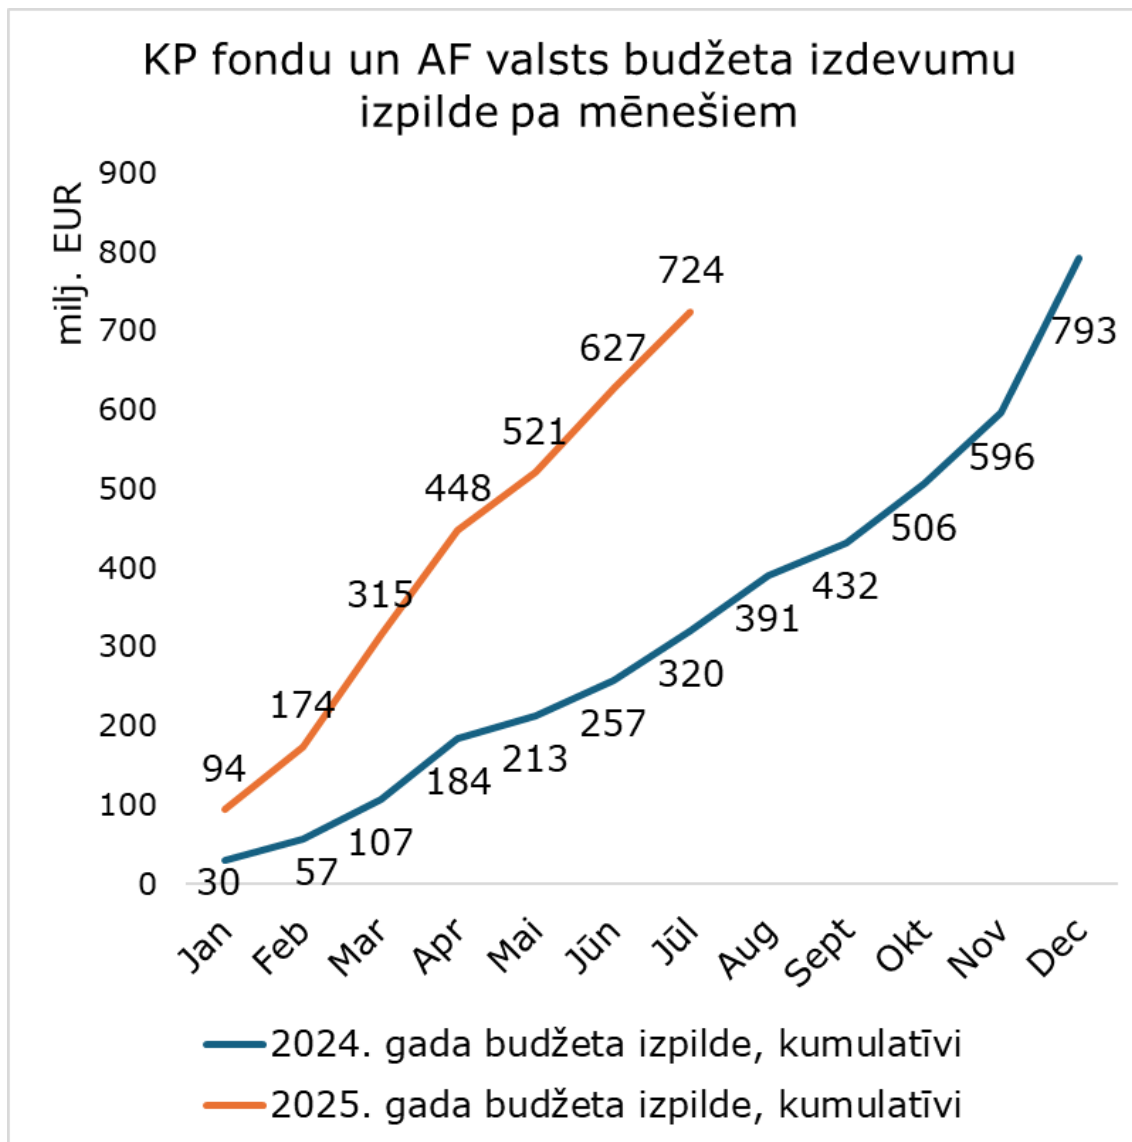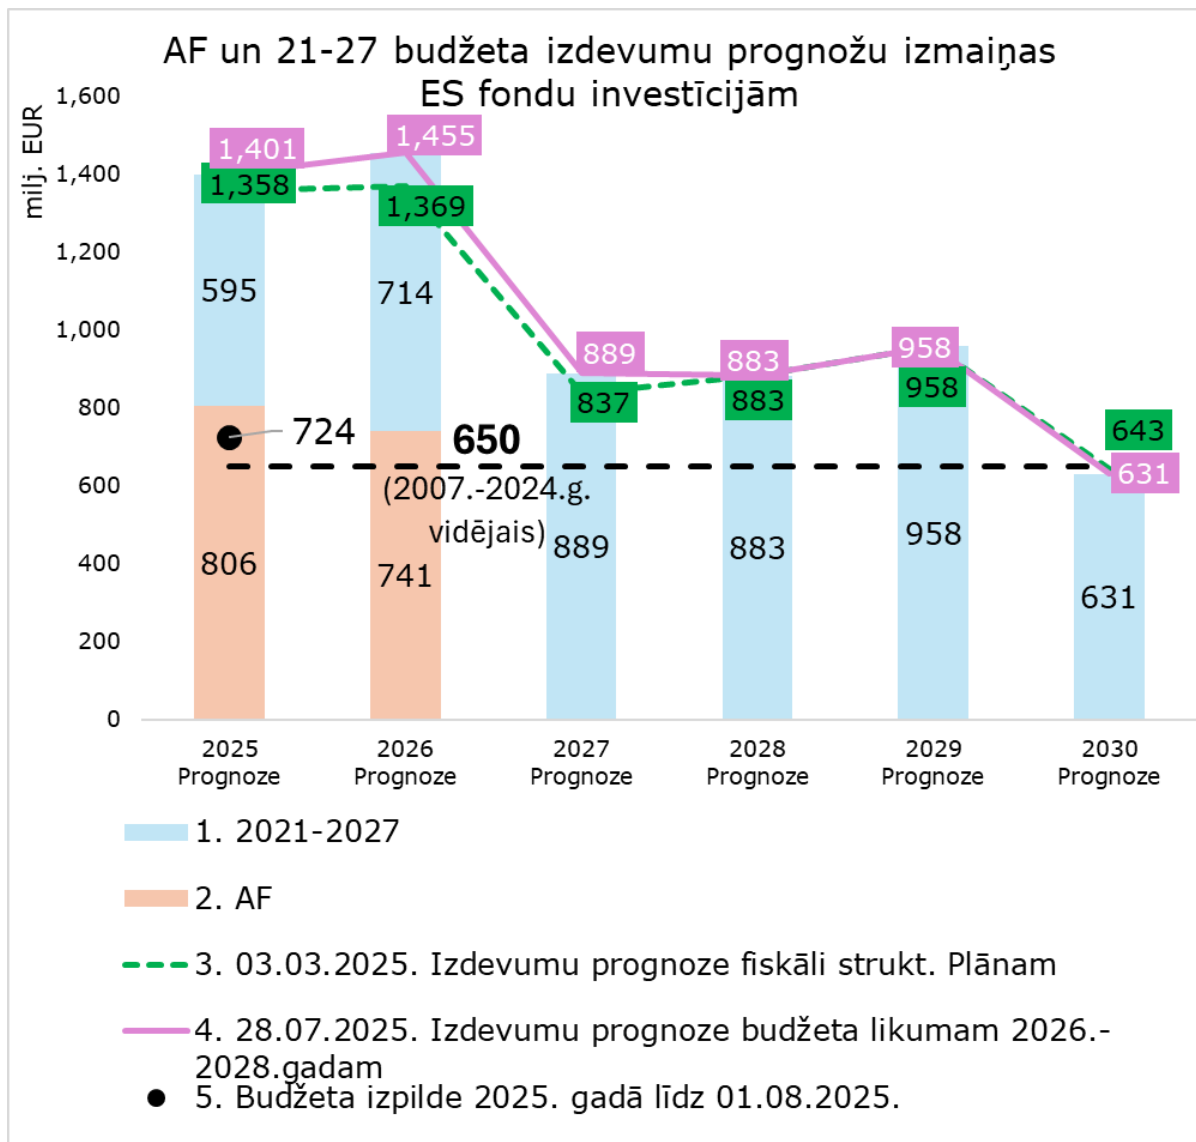



Finanšu ministrija

ES fondu investīciju ieviešanai vēl jāapstiprina MK noteikumi par 637 milj. € (lielākā daļa dzelzceļa infrastruktūra)

**Vienošānās 28.08.2025.
ES fondu tematiskajā
komitejā – DISCIPLĪNA:**

**1. SM un KEM steidzami
virzīs noteikumus TAP,**
t.sk. negaidot EK lēmumu
par programmas
grozījumiem, lai mazinātu
investīciju ieviešanas riskus.


**2. Tālāku kavējumu
(noteikumi, naudas plūsmas
u.c.) gadījumā nākamajās
komitejas sēdēs lems par
finansējuma pārdalēm.**

**3. Š.g. OKTOBRĪ komitejā
atkārtoti izskatīs
progresu,
iespējas/vajadzības
pārdalēm.**

**ES fondu
finansējums
investīcijām nozarēs**


4 231 milj. €

(+pieaugums no
01.04.2025. līdz 01.09.2025.)




**3 594 milj. €
(+221 milj. €)**

**Apstiprinātie
MK noteikumi**




**3 237 milj. €
(+441 milj. €)**

**Projektu
atlases**



**2 197 milj. €
(+432 milj. €)**

**Noslēgti
līgumi**



**458 milj. €
(+140 milj. €)**

Maksājumi
* prognoze

448

107

341

SM - BEMU,
pretdronu
risinājumi.
KAVĒTS
dzelzceļš, sausās
ostas

58

KEM -
Energodrošība.
KAVĒTS
dūņas

43

LM -
Nodarbinātība un
soc. pakalpojumi

34

EM - STEP

2

37

VARAM - 2025.g,
2026.g - JTF
(kūdra)

13

IZM

4

VK

MK noteikumu par ES fondu investīciju ieviešanu (SAM) izstrādes progress

- 2025.gada plāns (apstiprināšana plānota 2025.III un 2025 IV ceturksnī). ES fondu finansējums 221 milj. EUR
- Kavēts investīciju apstiprināšanas grafiks (apstiprināšanas termiņš 2025 II cet.). ES fondu finansējums 364 milj. EUR
- 2026.gada plāns, ES fondu finansējums 52 milj. EUR

2025. un 2026.gada plāns KOPĀ, ES fondu finansējums 637 milj. EUR

Dati: 19.08.2025



Finanšu ministrija

Vienoššanās 28.08.2025. ES fondu tematiskajā komitejā par ES fondu 2021-2027 programmas vidusposma grozījumiem pēc EK komentāriem

EK komentāri saņemti 17.07.2025. - par visiem **rasts risinājums**, t.sk. **vienoššanās komitejā**:

1. 10,6 milj. EUR pārdale no ostām **Latvijas onkoloģijas centra Operāciju blokam un intensīvās terapijas rekonstrukcijai (LOC).**

1. Lielāks atbalsts Latvijas Austrumu pierobežai - 5 milj. EUR pārdale uzņēmējdarbības un izglītības infrastruktūrai.

2. FM septembrī virzīs ES fondu Uzraudzības komitejai un MK programmas grozījumus, kas integrē aizsardzības un drošības ReArm* iniciatīvas investīcijas. **Iesniegšana EK indik. š.g. oktobrī.**

**ReArm Europe ir EK iniciatīva sniegt ES dalībvalstīm lielāku elastību veikt ES fondu ieguldījumus aizsardzības industrijā*

Energētiskās drošības un neatkarības stiprināšana

41,2 milj. €,

t.sk. ES fondi 35 milj. €

Investīcijas aizsardzībai (duālais pielietojums) un iekšējai drošībai

118 milj. €,

t.sk. ES fondi 101,1 milj. €

Sociālās drošības stiprināšana (finansējuma pārvedums pārtikas pakām)

30,4 milj. €,

t.sk. ES fondi 27,3 milj. €

Civilās drošības stiprināšana un Latvijas Austrumu pierobežas rīcības plāna 2025.-2027. g. pasākumiem

80,8 milj. €,

t.sk. ES fondi 68,7 milj. €

Dzelzceļa kā transporta infrastruktūras mugurkaula stiprināšana

505,9 milj. €,

t.sk. ES fondi 430 milj. €






Finanšu ministrija


Atveseļošanas fonda 1,97 mljrd. € ieviešana kopumā atbilstoši plānam. Tiek gatavoti plāna grozījumi, iesniedzami EK līdz 2025. g. beigām.

Rādītāju izpildes progress:

Saņemtie maksājumi no EK (milj. €)

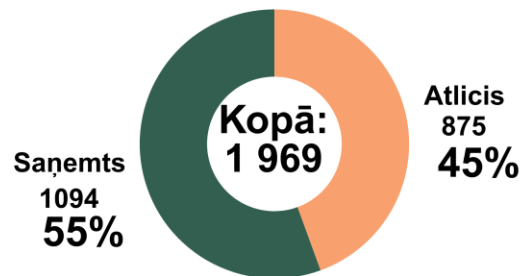

Maksājumu pieprasījumu grafiks un sasniedzamie rādītāji:

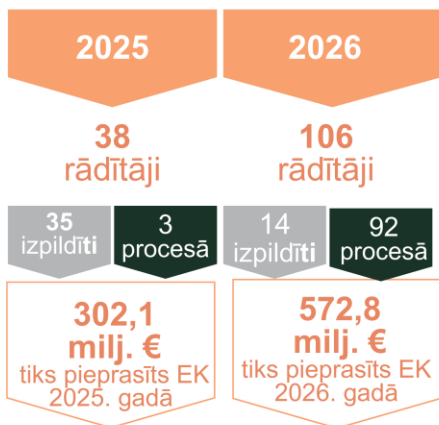


Dati līdz 01.09.2025.

Līgumi (milj. €)



Maksājumi (milj. €)



Līgumi (milj.)

	%	€
Klimata pārmaiņas	82	549
Digitālā transformācija	99	361
Nevienlīdzības mazināšana	97	371
Ekonomikas transformācija	96	189
Veselība	100	181
RePowerEU	100	135
Likuma vara	100	37
	100 Max %	

Maksājumi (milj.)

	%	€
Klimata pārmaiņas	50	335
Digitālā transformācija	29	107
Nevienlīdzības mazināšana	55	210
Ekonomikas transformācija	40	78
Veselība	37	67
RePowerEU	74	100
Likuma vara	44	16
	100 Max %	

- Plāna rādītāji **jāizpilda** ne vēlāk kā līdz **2026. g. augustam**. EK maksā, ja izpildīti visi rādītāji noteiktos termiņos.
- **Pēdējais Latvijas maksājuma pieprasījums EK**, pārvaldības deklarācija un revīzijas iestādes atzinums jāiesniedz EK līdz **30.09.2026. (nav pagarināms)**.



Finanšu ministrija

Rezumējums par ES fondu tematiskās komitejas 28.08.2025. vienošanos ES fondu un Atveseļošanas fonda investīciju portfeļa vadībai

- 1) Uzturēt **stingru ES fondu investīciju ieviešanas disciplīnu.**
- 2) Turpināt darbu, it īpaši ar ES fondu investīciju programmu **optimizāciju, - izskatīt iespējamās finansējuma pārdales š.g. oktobrī kā efektīvu risku vadības rīku, lai rastu risinājumu jaunu perspektīvu projektu finansēšanai.**
- 3) **Atbalstīt ES fondu programmas vidusposma grozījumus un Atveseļošanas fonda plāna grozījumus,** vienlaikus rodot finansējumu prioritārai veselības infrastruktūrai (LOC).
- 4) **Atbalstīt EEZ un Norvēģijas grantu jaunā perioda investīciju Saprašanās memorandu steidzamu virzību** apstiprināšanai MK un parakstīšanai ar donoriem (indik. š.g. oktobrī), lai uzsāktu programmu izstrādi.
- 5) Turpmāka **koordinēta rīcība** saistībā ar **jaunā ES fondu 2028.–2034.g. plānošanas perioda EK regulu priekšlikumiem,** t.sk. paredzot izvērstāku **Latvijas pozīciju kopā ar sadarbības partneriem definēt līdz š.g. beigām.**
- 6) Konkrēti pasākumi uzlabot IKT projektu izmaksu efektivitāti, paātrināt ieviešanu.



Finanšu ministrija

Administratīvā sloga mazināšanai ES fondu pasākumi sekmē valdības noteiktā mērķa sasniegšanu – līdz 2026. gadam par 25% mazināt birokrātiju

~**400** priekšlikumi - tiek īstenots **rīcības plāns** 8 prioritārās jomās – **izpilde 95%** (2025.g. augusta beigas).

Stratēģiski svarīgs centrālais pasākums - **CFLA kultūras maiņa no kontrolējošas institūcijas uz klientorientētu sadarbības partneri**, rezultatīvi īstenojot projektus.

Turpināsim izskatīt/īstenot procesu optimizāciju

Birokrātijas mazināšana valsts pārvaldē

[Skatīt vairāk →](#)

Publiskie iepirkumi

[Skatīt vairāk →](#)

ES fondi

[Skatīt vairāk →](#)



Aktualitātes par birokrātijas mazināšanu Finanšu ministrijas politikas jomās

[Skatīt vairāk →](#)

[Sniedz priekšlikumu birokrātijas mazināšanai](#)

Atgriezeniskās saites iegūšanai:

- FM **2026.gada I ceturksnī plāno strukturētas intervijas** ar projektu ieviesējiem;
- **CFLA dažādo atgriezeniskās saites** iespējas, t.sk. individualizētas sarunas ar sociāliem un sadarbības partneriem, uzņēmumu organizācijām, pašvaldībām u.c.



Finanšu ministrija

Paldies

Aktuālais investīciju **progress un priekšlikumi valdības lēmumiem** tiks ietverti kārtējā **FM pusgada informatīvajā ziņojumā**, kas iesniedzams Valsts kancelejai **līdz 2025. gada oktobrim**



Finansē
Eiropas Savienība
NextGenerationEU



Nacionālais
attīstības plāns



Finanšu ministrija

Rīcības plāns administratīvā sloga mazināšanai (I)

Līdzšinējie soļi	Ietekme
(●) Projektu atlasu vienkāršošana: • Ātrāka un vienkāršāka projektu atlase «A» reitinga saņēmējiem (VID nodokļu nomaksas reitingu sistēma). • Paredzēta iespēja SAM pasākumu MK noteikumos celt minimālo pieļaujamo (150 EUR) nodokļu parāda sliekšni - atbildīgo iestāžu izvēle. • Atklātā projektu iesniegumu atlasē nevērtēt kvalitātes kritērijus, kas nav izslēdzoši (ja pietiekošs finansējums). • Atteikšanās no atlases nolikumu un to tehnisko grozījumu skaņošanas (starp iestādēm).	«A» reitinga saņēmējam nepārbauda nodokļu kritēriju → CFLA ātrāk nonāk pie lēmuma. Pārējiem – pārbauda; ja parāds, pieļauj nomaksu. Vērtējamo kritēriju skaita samazinājums vismaz par 20 % → CFLA ātrāk nonāk pie lēmuma. Uzsākot projektu atlasī, ietaupītas vismaz 10 darbdienas. Salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada plānošanas periodu, jau šobrīd 2021.–2027. periodā projektu atlasēs CFLA līdz gala lēmumam nonāk par vismaz 25 % ātrāk.
(●)SAM MK noteikumu pārskatīšana, atsakoties no pārlietu augstām prasībām, nacionālajiem rādītājiem, t. sk. no obligātas prasības par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma (SAPI) piemērošanu.	~1 mēneša laika ietaupījums, izstrādājot SAPI prasības un turpmākus uzraudzības mehānismus un līdz 20 % finanšu ietaupījumu iepirkumu ietvaros saņemtajiem piedāvājumiem. 7 SAM pasākumos izslēgti 17 nacionālie rādītāji.
(●)CFLA novērstas sarežģītas vai dublējošas projekta pamatojošo dokumentu iesniegšanas prasības un pārbaudes, veicot iekšējo procesu revīziju; novienādotā prakse ar IUB.	Saīsināti projektu ieviešanas dokumentācijas izvērtēšanas termiņi (līgumu slēgšana, grozījumi, maksājumi, iepirkumi) par 5 % - 2025. gadā un 15 % - 2026. gadā.
(●) Turpināta diskusija par MK noteikumu Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" pārskatīšanu publisko iepirkumu strukturālo reformu ietvaros.	Vienkāršoti iepirkumu nosacījumi arī privāto tiesību subjektiem, ņemot vērā plānotās radikālās sistēmas izmaiņas publisko iepirkumu jomā, par kurām vienojusies FM izveidotā darba grupa.



Finanšu ministrija

Rīcības plāns administratīvā sloga mazināšanai (II)

Līdzšinējie soļi	Ietekme
(●) Atteikšanās no PVN pārskatu iesniegšanas projektos zem 5 milj. EUR.	Nav jāiesniedz pārskats.
(●) Finanšu korekciju piemērošanas nosacījumu pārskatīšana, atsakoties no nacionāli noteiktām finanšu korekcijām.	Neatbilstību veidu samazinājumu par 20 % .
(●) « Konsultē vispirms » principa plašāka piemērošana CFLA darbā (atlases + projektu īstenošana) - kultūras maiņa no kontrolējošas institūcijas uz uzticama un klientorientēta sadarbības partnera lomu veiksmīga projekta ieviešanā, t. sk. KPVIS funkcionalitātes uzlabojumi.	Pilnveidota komunikācija, plaši pieejami semināri/konsultācijas, atbalsts un sadarbība virzoties uz rezultātu → ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā rezultatīvi īstenojot projektus vismaz 95 % apmērā . Mazināta datu manuāla dublēšana dažādās IT sistēmās.
(●) Plašāka pašdeklarēšanās principa ieviešana 4 valsts atbalsta blokos: 1) papildinošā saimnieciskā darbība, 2) 50% ieņēmumu kontrole kultūras infrastruktūrai, 3) nesaimnieciskie projekti (vai nemainās), 4) VTNP un sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus: infrastruktūras proporcijas uzraudzība, pārkompensācijas kontrole, grūtības nonākuša uzņēmuma (GNU) statusa nevērtēšana.	Pašdeklarēšanās princips → lielāka CFLA pašāvība un lielāka finansējuma saņēmēja atbildība . Tiek saglabātas tikai <i>ex-post</i> riskos balstītas izlases veida pārbaudes 5-10% apmērā. Vismaz par 5 % ātrāka projektu atlases un ieviešanas dokumentācijas izvērtēšana.

Rīcības plāns izpildīts - 95 % (*līdz š.g. augusta beigām*), tostarp apstiprināti horizontālie MK noteikumu grozījumi (3 pabeigti, 1 procesā), izmaiņas vadlīnijās (visi 4 pabeigti).



Finanšu ministrija

ES fondu maksājumu prognozes līdz 2030.gadam nozaru dalījumā - pozitīva turpmāko gadu tendence 100% ES piešķiruma investēšanai

